


Voortgangsrapportage Oostelijke vechtplassen 2023



Inhoudsopgave



Voorwoord



De wil, energie én flexibiliteit is er om samen zaken op te pakken

In 2023 waren we halverwege het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen (OVP). Met nog vijf - inmiddels is dat vier - jaar te gaan, voel ik de druk bij enkele partners toenemen om zichtbare resultaten te boeken. Dat begrijp ik heel goed. Voortgang is nodig om de energie vast te houden; bij de betrokken medewerkers, partners én bewoners. Al gaat het soms minder hard dan we zouden willen, we gaan echt wel vooruit.

Een programma waarin 21 partijen samenwerken aan circa 25 projecten om de natuur te versterken, de

waterkwaliteit te verbeteren en de recreatiesector te moderniseren vraagt zorgvuldige afstemming. Met de partijen onderling, én met de omgeving. De plassen vormen immers de achter- of voortuin van vele mensen. En vooral in de zomer een aantrekkelijke recreatieomgeving voor de wijde omgeving. Daarnaast hoort ook het uitvoeren van (haalbaarheids-)onderzoeken en verkenningen bij de voorbereiding. Niet alles kan en zeker niet overal; een nauwkeurige én transparante afweging is nodig voordat 'de eerste schep de grond in kan'. Daarbij blijft het een uitdaging om de gevolgen van wisselingen en vooral ook uitval op personeelsgebied te beperken zodat projecten hun voortgang behouden en kennis niet verloren gaat.

In 2023 kregen de maatregelen uit het OVP een plek in de provinciale programma's landelijk gebied van Noord-Holland (PPLG) en Utrecht (UPLG) waarin de aanpak van stikstofdepositie, waterkwaliteit, bodemdaling en natuur staat beschreven. In het najaar 2023 leverden de provincies de eerste versies hiervan in bij het rijk; een aangepaste versie volgt in het najaar van 2024. Ondertussen gaan we met de projecten uit het OVP door. Het is goed dat iedereen zich realiseert dat de opgave voor dit gebied niet stopt na 2027. Daarover denken we nu al na en maken we afspraken voor de langere termijn, passend bij de doelstellingen voor dit gebied. Een aantrekkelijk en toegankelijk landschap waar natuur en recreatie elkaar versterken en waar mensen graag wonen, werken en recreëren vraagt continu onze aandacht.

In dit Natura 2000-gebied met zoveel water gaat er - uiteraard - veel aandacht naar het verbeteren van de waterkwaliteit. Een goede waterkwaliteit draagt bij aan de diversiteit aan planten en dieren én maakt het gebied aantrekkelijk om te recreëren

Veel maatregelen uit de Kader Richtlijn Water (KRW)-uitvoeringsperiode 2022-2027 van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht vinden daarom plaats in het Vechtplassen-gebied.

Baggeren blijft een van de grootste opgaven uit het programma. Na bijna een jaar baggeren op de Loosdrechtse Plassen zitten we op ruim 60 procent van de opgave. Na het baggeren van de plassen 1 t/m 5 willen we samen met de recreatieondernemers aan de slag met het baggeren van de havens. Positief is dat de watersportsector eind 2023 hiervoor zelf een aanzet deed voor een plan, dat nu samen met de overheden wordt uitgewerkt. Ik heb er vertrouwen in dat het bestuur in april 2024 hierover een besluit kan nemen.

Ondertussen bleven we ook in 2023 zoeken naar mogelijkheden om het recreatief aanbod te verbeteren in het plassengebied. Helaas moest de verkenning naar het Rondje om de Zuid worden stopgezet. Alhoewel een upgrade van de route een mooie aanvulling zou zijn op het bestaande vaarnetwerk en het gebied aantrekkelijker maken voor een grotere groep watersporters, waren er technisch, juridisch en financieel te veel knelpunten om hiermee door te gaan.

Mooi natuurnieuws was er ook; op een locatie in Kortenhoef werd een otter gespot. Dit betekent dat er genoeg voedsel, rust en ruimte is voor de otter. De otter werd gevonden vlakbij een faunapassage waarvan het dier wellicht gebruik heeft gemaakt. Streven is om in het plassengebied een tiental nieuwe faunapassages aan te leggen zodat dieren zich gemakkelijker kunnen verplaatsen binnen het gebied. De realisatie laat nog op zich wachten. De eerste ontwerpen worden verwacht in het najaar van 2024.

In natuurgebied Het Hol troffen we eveneens voorbereidingen voor maatregelen die de natuur versterken. We gaan onder andere baggeren en het watersysteem aanpassen zodat het kalkrijke kwelwater beter wordt benut. Dieren en (water)planten profiteren van deze aanpassingen. De uitvoering start in februari 2024 met het aanleggen van een toegangsweg waarover vrachtwagens de bagger kunnen afvoeren.

Ook de ontwerpen voor maatregelen waarmee de omstandigheden voor moerasvogels verbeteren liggen klaar voor realisatie. Op basis van uitvoerbaarheid, beheerbaarheid en risico's is besloten te starten met de gebieden Hollands Ankeveen, Kortenhoef West en de Loosdrechtse Plassen. We verwachten daarmee na het broedseizoen 2024 te kunnen beginnen.

Terugkijkend op bovenstaande tekst en mijn eerste maanden als voorzitter van de stuurgroep programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen zie ik vooral de wil én energie om zaken op te pakken; én de flexibiliteit om bij te kunnen stellen wanneer omstandigheden dat vragen. Zolang we de gemeenschappelijke belangen voorop blijven stellen en projecten bijdragen aan de drie pijlers - vrijetijdslandschap, natuur en recreatie - levert dit uiteindelijk voor alle partners iets op. Samen maken we dit prachtige plassengebied mooier, voor onszelf en toekomstige generaties.

Rosan Kocken
voorzitter stuurgroep OVP

Voortgang in vogelvlucht

2023




Overzicht budget en uitgaven

De uitgaven van de afgelopen jaren (tot 31 dec 2023) zijn als volgt verdeeld:

Uitgaven per programma onderdeel in procenten ten opzichte van herzien budget (inclusief absoluut restant)


Budget (herijkt)

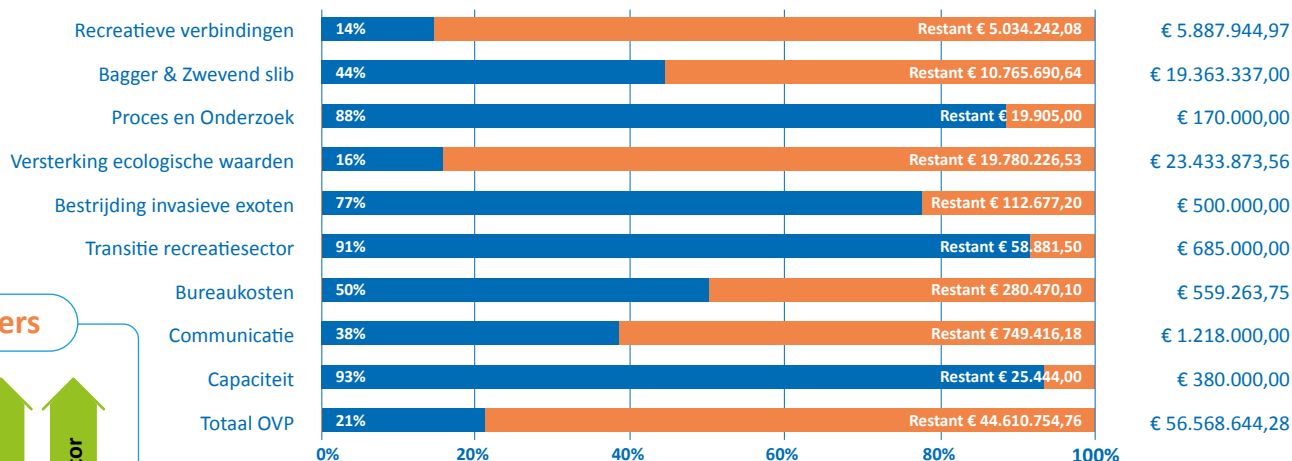


3 pijlers



Budget en uitgaven (in mln.)

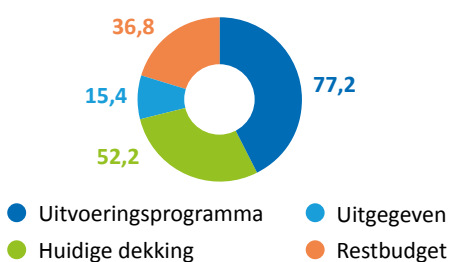

Status projecten

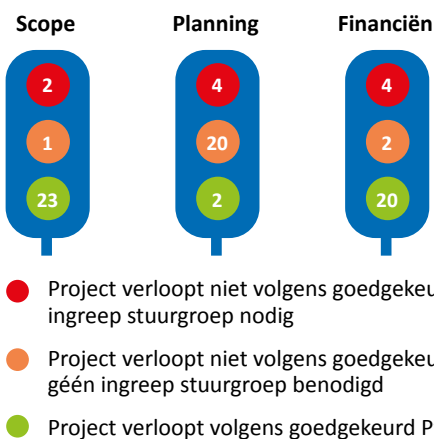

Communicatie (in aantallen)

200 bezoekers informatiemarkt 12 oktober 2023

828 abonnees nieuwsbrief

6200 bezoekers website

4 nieuwsbrieven baggeren


49 nieuwsberichten website

320 abonnees nieuwsbrief baggeren

6 nieuwsbrieven OVP

50 volgers Twitter

Fasering lopende (deel)projecten



1

Organisatie en draagvlak



De uitvoering van het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen (OVP) loopt van 2017 tot en met 2027. De organisatie bestaat primair uit de stuurgroep, de regiegroep, het kernteam, het programmateam en de projectleiders.

Taken en verantwoordelijkheden

In de stuurgroep zitten bestuurders van de betrokken partijen: samen dragen zij de verantwoordelijkheid voor het behalen van de programmadoelstellingen. De stuurgroep fungeert daarnaast ook als opdrachtgever voor de programmanager. De programmanager is verantwoordelijk voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma, geeft leiding aan het programmabureau en zit de regiegroep voor. De projectleiders rapporteren via de regiegroep aan de stuurgroep. In het projectleidersoverleg bespreken de projectleiders en andere betrokken deskundigen de voortgang van projecten en wisselen zij informatie en ervaringen uit.

Capaciteit en middelen

Het hoger management van de vijf betrokken overheidspartijen bespreekt in het opdrachtgeversoverleg de inzet aan capaciteit en middelen, waarbij met name de knelpunten aan de orde komen. De beperkte capaciteit bij de diverse partijen in combinatie met verschillende belangen blijft een belangrijk aandachtspunt. Net zoals de gevolgen die dit heeft voor de werkdruk bij de medewerkers die werkzaamheden voor het programma uitvoeren. Vrijwel alle betrokken overheden hadden in 2023 te maken met wijzigingen en uitval van medewerkers. Enerzijds heeft dit consequenties voor de voortgang van projecten, anderzijds gaat hierdoor kostbare kennis verloren. Het inwerken van nieuwe mensen vraagt aandacht en tijd, zeker in een complexe omgeving met vele én diverse belangen waarin de projecten van het OVP zich afspelen. Nieuwe medewerkers zorgen daarnaast ook voor nieuwe energie en soms verfrissende inzichten.

Het programma

In 2023 ging veel aandacht naar de voorbereidingen van projecten die in 2024 mogelijk tot uitvoering komen, zoals de natuurverbetering in Het Hol, maatregelen ter bescherming van moerasvogels en de aanleg van faunapassages. Nieuwe procesmanagers zijn aangesteld om de gebiedsprocessen te begeleiden die moeten leiden tot afspraken met particulieren en organisaties om nieuwe natuur (Natuur netwerk Nederland) aan te leggen. Aan de noordzijde van de N201 gaat het om Kortenhoef Oost, Ankeveen en Kortenhoef West. Aan de zuidzijde van de N201 om Weersloot, Ster van Loosdrecht, Vuntus en Het Hol. Elk gebied doorloopt een eigen proces in afstemming met grondeigenaren, bewoners en ondernemers. Als mogelijke aanvulling op het bestaande vaarnetwerk vond een verkenning plaats naar het Rondje om de Zuid. Deze verkenning werd stopgezet vanwege de financiële, technische en juridische uitdagingen die realisatie van dit vaarrondje met zich meebrengt.

Na de start in november 2022 ging het baggeren op de Loosdrechtse Plassen 1 tot en met 5 vrijwel het gehele jaar 2023 gestaag door. De baggerwerkzaamheden zorgen voor een betere bevaarbaarheid, natuur en waterkwaliteit. Aan het eind van het jaar was circa 60% van de baggeropgave gereed. Het bestuur adviseerde positief over het baggeren van de werkhaven van het Plassenschap en het verwijderen van de (zand)drempels in het riviertje de Oostelijke Drecht voor een betere bevaarbaarheid. Aan het eind van het jaar deden de eigenaren van de havens een eerste aanzet voor een plan voor het baggeren van de havens en het herverdelen van enkele budgetten. Een brede projectgroep met partners van het programma werkt het plan samen uit zodat de stuurgroep hierover in april 2024 kan beslissen.

Wettelijke kaders

Het Oostelijk Vechtplassengebied strekt zich uit over de provincies Noord-Holland en Utrecht en valt in zijn geheel in het beheergebied van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Beide provincies leverden in 2023 de eerste versie op van hun Provinciale Programma landelijk gebied (PPLG en UPLG). Beide programma's zijn opgesteld in lijn met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) waarin een integrale aanpak voor het verbeteren van natuur, water en klimaat voorop staat. De provinciale plannen bepalen voor een groot deel de NNN-projecten binnen het plassengebied, waarbij de vogel- en habitatrichtlijnen vanuit het Europees netwerk Natura 2000 leidend en bepalend zijn, naast de Kaderrichtlijn Water (KRW)-maatregelen en klimaatdoelstellingen van Parijs. De provincie Noord-Holland hanteert voor de uitwerking van het PPLG vijf regio's, waarvan Gooi en Vechtstreek er een is. Het OVP valt binnen deze regio. De provincie Utrecht heeft voor de uitwerking van het UPLG negen werkgebieden gedefinieerd op basis van de daar spelende problematiek, natuurlijke grenzen en gebiedsprocessen. De Oostelijke Vechtplassen is een van deze gebieden. De provincies leveren in het najaar van 2024 een aangepaste versie van hun plan in bij het Rijk.

Het algemeen bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht werkt aan de uitvoering van het volledige KRW-maatregelenpakket voor de laatste KRW-uitvoeringsperiode 2022-2027. De waterkwaliteits-maatregelen in het Vechtplassengebied maken daarvan onderdeel uit. Zowel de lopende natuur-ontwikkelingsprojecten als de KRW-maatregelen dragen bij aan de doelstellingen die de provincies moeten halen.

Mutual Gains Approach

Binnen het programma werken we met de Mutual Gains Approach (MGA-methode), waarbij de partners vanuit belangen aan oplossingen werken en niet vanuit meningen. De aanpak richt zich op het verkrijgen van consensus over bestuursvoorstellen én meer draagvlak voor gemaakte keuzes. De afspraken uit het gebiedsakkoord vragen een coöperatieve houding en het vermogen om eigen standpunten ondergeschikt te maken aan gezamenlijke programma-doelen. Om het gedachtegoed levend te houden, vinden regelmatig trainingsdagen over deze aanpak plaats. Vanwege de vele wisselingen en het uitvallen van medewerkers op cruciale functies vond in 2023 geen MGA- training plaats. In 2024 staat deze weer op de planning.

Governance

Alhoewel de partners de MGA-methode als een groot goed ervaren, vinden zij het niet wenselijk dat één partij de voortgang van een project kan tegenhouden. De stuurgroep besloot daarom in 2022 een aangepaste geschillenregeling in te voeren. De aanpassing is in 2023 via een wijzigingsovereenkomst meegenomen bij de actualisatie van het gebiedsakkoord.

Voortgang in de projecten

Hoofdstuk 4 bevat een gedetailleerde beschrijving van de voortgang van projecten. Voor een aantal lopende projecten heeft de stuurgroep in 2023 belangrijke besluiten genomen: zo werd € 50.000 beschikbaar gesteld voor het baggeren van de werkhaven van het Plassenschap – de Rimboe – aan de Veendijk. Havens in de Loosdrechtse plassen, die nog uitgebaggerd moeten worden, kunnen leren van deze ervaringen. Daarnaast werd circa € 56.000 beschikbaar gesteld om de (zand)drempels in het riviertje de Oostelijke Drecht weg te laten halen voor het verbeteren van de bevaarbaarheid. De verkenning van het Rondje om de Zuid werd stopgezet, waardoor er geen uitbreiding van het vaarnetwerk komt. De stuurgroep stemde in met de vervolgaanpak van natuurgebied Het Hol. Na de eerste fase, die bestaat uit baggeren en het aanpassen van het watersysteem, gaat het in fase twee over het herstellen en aanleggen van nieuwe natuur in het Hol. Ook besloot het bestuur de rente van de bedragen in het Groenfonds te bestemmen voor onverwachte tegenvallers.

Capaciteit en middelen

Net als vorig jaar blijft de capaciteit bij veel partijen een uitdaging. De veelheid en complexiteit van projecten vragen een forse personele inzet van partijen. Het gaat om projectleiding, opdrachtgeverschap, afstemming tussen projecten en het inhoudelijk bijdragen in de projectgroepen en gebiedsprocessen. Niet alleen de overheden kampen met capaciteitstekorten, ook andere partijen binnen het gebiedsakkoord lopen hier tegenaan. Vertegenwoordigers van bewoners- en/of belangengroepen verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis, vaak naast een reguliere baan. De beperkte capaciteit binnen het gebiedsakkoord en complexiteit van projecten en processen heeft vooral effect op de voortgang.

Binnen het gebiedsakkoord staat voor een aantal projecten enkel een verkenning of onderzoek geraamd. Een volgende stap zoals bijvoorbeeld het realiseren van het project, moeten de betrokken partijen zelf oppakken, buiten de scope van het akkoord. Dit vraagt naast inzet van mensen ook eigen middelen. Als die er niet zijn, zorgt dit voor teleurstelling bij partners en externe partijen. Ook met beheer (en de financiering daarvan) is veelal geen rekening gehouden bij de totstandkoming van het akkoord, terwijl het belangrijk is om daarover bij de realisatie van projecten afspraken te maken.





2.1 Werkwijze

In de communicatiewerkgroep zitten de communicatiemanager van het OVP en communicatieadviseurs van de provincie Noord-Holland, de gemeente Stichtse Vecht, Waternet/AGV en Natuurmonumenten. De communicatieadviseurs verzorgen de communicatie over de projecten van hun organisatie. De communicatiemanager OVP is verantwoordelijk voor het beleid, regie en afstemming van communicatie binnen het programma en adviseert daarnaast de gemeente Wijdmeren over communicatie over projecten uit het OVP. De communicatiewerkgroep kwam in 2023 vijf keer bijeen, afgestemd op het ritme van de vergaderingen van de regie- en stuurgroep.

De manier van werken die de communicatiewerkgroep in 2021 heeft ingezet, zorgt voor herkenbaar communicatiebeleid, waarop bewoners en belanghebbenden kunnen bouwen en vertrouwen. We kunnen hierop worden aangesproken bij het communiceren over individuele OVP-projecten.

Vorbereiden besluiten

Het onderwerp communicatie bij besluitvorming wordt inhoudelijk besproken aan de hand van de communicatieparagrafen in de oplegnotities. De inhoud van eventuele nieuwsberichten wordt afgestemd in de communicatiewerkgroep zodat geen van de partners (lees: bestuurders) overvallen wordt door perspublicaties.

Berichtgeving

Na elke vergadering van de stuurgroep worden nieuwsberichten op www.vechtplassen.nl geplaatst over de belangrijkste besluiten. Daarnaast worden via de nieuwsbrief deze besluiten en andere relevante informatie onder de aandacht gebracht bij de abonnees van de nieuwsbrief OVP.



2.2 Programmacommunicatie

Middelen

De website www.vechtplassen.nl fungeert als het centrale communicatiemiddel. De drie pijlers worden stevig neergezet, alle projecten hebben een eigen pagina (met verwijzing naar de betrokken projectleider voor meer informatie) en de nieuwsrubriek wordt goed bezocht door zowel publiek als pers. In 2023 bezochten 6200 mensen de site, waarbij we een toename in het aantal bezoekers zien na het verzenden van de digitale OVP-nieuwsbrief aan de abonnees.

In totaal werden in 2023 49 nieuwsberichten online geplaatst (en indien relevant doorgeplaatst op sociale media van partners) en werden 6 digitale nieuwsbrieven verstuurd met daarin veel aandacht voor de voortgang van de individuele projecten. Het mailbestand telde op 31 december 2023 totaal 828 ontvangers. De belangrijkste nieuwsberichten publiceren we ook op de gemeentelijke pagina's van de gemeente Wijdemeren en/of Stichtse Vecht. Daarnaast worden nieuwsberichten regelmatig doorgeplaatst in de projectniewsbrief Oostelijke Vechtplassen van de gemeente Stichtse Vecht of op social media van de betrokken gemeenten en provincie Noord-Holland.

Voor communicatie met bewoners en andere belangenpartijen maken we gebruik van OVP-communicatiemiddelen, zoals bijvoorbeeld briefpapier, presentaties en informatieposters (vooral gebruikt tijdens de informatiemarkt). Het consequent toepassen van de OVP-huisstijl in de communicatiemiddelen draagt bij aan de herkenbaarheid van het programma én onderstreept de samenwerking tussen de partners.

De stuurgroep stemde in 2023 in met het voorstel om de voortgang van projecten uit het programma primair via www.vechtplassen.nl en de jaarlijkse voortgangsrapportage te laten zien. Er worden hiervoor geen andere (nieuwe) communicatiemiddelen ontwikkeld. Dat betekent overigens wel dat de website actuele informatie moet verschaffen én de voortgangsrapportage jaarlijks tijdig moet verschijnen.

Persbeleid

Regionale en lokale media

De relatie met de regionale krant Gooi en Eemlander is goed. Er is regelmatig contact en in het merendeel van de situaties vindt voor plaatsing van artikelen overleg plaats. De regie ligt bij de communicatiemanager OVP die als centraal aanspreekpunt fungeert. Er zijn in 2023 diverse artikelen over onderwerpen en projecten van het OVP verschenen, in de meeste gevallen neutraal/kritisch van aard. Positieve berichtgeving was er onder andere over de otter die werd gespot op een locatie in Kortenhoef en andere natuurontwikkelingen.

Sociale media

Het opbouwen en onderhouden van een achterban op social media vraagt veel aandacht, en daarmee ook budget. In het najaar van 2023 is daarom besloten alleen X (Twitter) voort te zetten voor het OVP; vooral vanwege de aanwezigheid van bestuurders, beleidsmakers en journalisten op dit platform. Eind 2023 hadden we circa 50 volgers. Daarnaast maken we gebruik van de sociale media van onze partners, waarmee we een grotere groep mensen bereiken én de betrokkenheid en rol van de partners onderstrepen.

Bijeenkomsten

12 oktober: algemene informatiemarkt

De jaarlijkse algemene informatiemarkt vond ook in 2023 plaats in Lichtbaken, de voormalige NH-kerk aan de Oud Loosdrechtse dijk in Loosdrecht. Net zoals de twee voorgaande jaren stond informatie over de verschillende projecten uit het programma centraal. Ieder project presenteert zich aan de hand van enkele posters. De informatie over de baggerwerkzaamheden was te vinden in een aparte tent op de parkeerplaats. Daarnaast vonden twee goedbezochte plenaire presentaties plaats over het programma, waarbij de programmamanager vooral inging op de doelstellingen, ambities en werkwijze.

Vooraf was breed gecommuniceerd over de markt via de eigen communicatiekanalen en die van partners. Daarbij benadrukken we de interactie: het voeren van een persoonlijk gesprek, suggesties ophalen en (duurzame) relaties aangaan of verstevigen. Circa 200 belangstellenden bezochten de informatiemarkt. De sfeer was goed en bezoekers waren positief over de opzet en informatievoorziening. Zij waarden vooral het persoonlijke gesprek dat met projectleiders en -medewerkers kan worden gevoerd. Deze laagdrempelige vorm van communicatie blijkt goed te werken. De interne evaluatie onder de aanwezige partners tijdens de informatiemarkt leverde een aantal aandachtspunten op voor een volgende editie.

Film Nederland onder Water op herhaling

Belangstellenden die de film 'Nederland onder water' in 2022 hadden gemist, kregen op zaterdag 12 augustus opnieuw een kans. Deze keer werd de film getoond op een groot scherm bij strandpaviljoen De Strook in Breukeleveen. Bezoekers konden de film zowel vanaf de wal als vanaf het water gratis bekijken. De film kwam tot stand door onder andere een financiële bijdrage van Waternet/AGV. In ruil daarvoor konden wij bewoners uit het Loosdrechts Plassengebied twee keer trakteren op een bijzondere film in de buitenlucht.

2.3 Projectcommunicatie

Het vergroten van de betrokkenheid van partners, stakeholders en de omgeving (lees: bewoners, grondeigenaren, ondernemers, gebruikers en andere belanghebbenden) bij de diverse projecten was ook in 2023 de belangrijkste doelstelling. Dat gaat vooral over meedenken, meepraten en meedoen. We ondersteunen dit zoveel mogelijk met transparante en regelmatige communicatie over de voortgang van projecten via verschillende kanalen.

Baggeren

Het Baggerplatform kwam in 2023 twee keer bij elkaar. Tijdens de bijeenkomsten zijn deelnemers bijgepraat over de voortgang van de verschillende projecten en issues die daarbij spelen. Onderwerpen waren onder andere resultaten fase 1 (baggeren 1e t/m 5e Loosdrechtse Plas), vorderingen fase 2 (baggeren havens), onderzoeken naar luwtestructuren en plan van aanpak preventie. Het gezelschap is nagenoeg ongewijzigd gebleven.

In 2023 is het baggeren van de 1e tot en met de 5e Loosdrechtse Plas van start gegaan. De omgeving is vooraf hierbij betrokken en direct betrokkenen zijn hierover geïnformeerd via een zogenaamd BLVC-plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie), dat ieder kwartaal in het BLVC-overleg wordt besproken. Informatie over het project en de bijbehorende planning staat op www.vechtplassen.nl/baggeren. Elk kwartaal is een poster (A3-formaat) verspreid onder de jachthavens, zodat hun klanten op de hoogte zijn van de werkzaamheden. Belangstellenden kunnen zich abonneren op de digitale Baggernieuwsbrief en ontvangen deze daarna ieder kwartaal in hun postvak. De nieuwsbrief kent 320 ontvangers. Actuele nieuwtjes worden gedeeld via de bouwapp. Ook de regionale facebookpagina van de provincie en regionale media worden ingezet om de werkzaamheden onder de aandacht te brengen.

Bij de start van de baggerwerkzaamheden is een inloopspreekuur op dinsdagmiddag ingesteld. Dit overleg kreeg vanaf het najaar 2023 een lagere frequentie en is aan het eind van het jaar afgeschaft, omdat hiervan weinig gebruik werd gemaakt. Omwonenden hebben weinig vragen en ervaren weinig overlast. Vragen kunnen per telefoon of e-mail worden gesteld aan de betrokken omgevingsmanagers.

Er is een checklist gemaakt met aandachtspunten voor haveneigenaren die willen baggeren. Deze checklist staat op de website www.vechtplassen.nl.

Natuurontwikkeling

Kortenhoef Oost

Ter afronding van de ecologische visie Kortenhoef Oost vond in 2021 aanvullend veldonderzoek plaats. De rapportage hiervan is in de tweede helft van 2023 gedeeld met de projectgroep. De uitkomsten dienen als input voor het actualiseren van de huidige natuurambitiekaart, dat de provincie samen met de projectgroep oppakt. Naast de ecologische ambities worden ook aspecten zoals woongenot voor omwonenden, de natuurbeleving voor bezoekers van het gebied en de toekomst van de agrarische ondernemers afgewogen bij het opstellen van een inrichtingsplan. Over de aanpak van de voormalige vuilstort Groenewoud moet de provincie nog een besluit nemen. Dit besluit bepaalt grotendeels de aanpak voor het hele gebied Kortenhoef Oost.

Ankeveen

Halverwege 2023 is het aangepaste plan van aanpak voor de verkenningsfase in de Hollands Ankeveense Plassen (HAP) en Stichts Ankeveense Plassen (SAP) inclusief planning besproken en vastgesteld in de projectgroep. Een extern bureau gaat in 2024 voor zowel Ankeveen als Kortenhoef West eco- en hydrologisch (veld)onderzoek doen als input voor de ecologische visie. De ecologische visie en de wensen uit de omgeving komen uiteindelijk samen in een inrichtingsplan voor het gebied. Bij het vertalen van de ecologische visie naar een (concept)inrichtingsplan worden zowel de projectgroep als andere belanghebbenden (zoals grondeigenaren) betrokken.

Ster van Loosdrecht

Het gebiedsaanbod wordt samen met de vereniging de Ster van Loosdrecht en de betrokken grond-eigenaren uitgewerkt. In de eerste helft van 2023 vonden kennismakingen en veldbezoeken plaats bij grondeigenaren in het Ster-gebied. De provincie maakt afspraken om de natuurdoelen op percelen binnen de NNN vast te leggen.

Het Hol

In Het Hol werken provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten en Waternet samen om de karakteristieke laagveennatuur te beschermen en versterken. Een belangrijk onderdeel van het plan is het verbeteren van de waterkwaliteit. Een goede waterkwaliteit vormt de basis voor een gezond ecosysteem en is nodig voor het realiseren van de natuurdoelen. Natuurmonumenten start begin 2024 met het baggeren en op orde brengen van het watersysteem zodat de fosfaatbelasting wordt beperkt en de nog aanwezige kwel optimaal wordt benut. In 2023 zijn de bewoners in de omgeving van Het Hol via onder andere huis-aan-huis-brieven en berichten in lokale media hierover geïnformeerd. In de volgende fase gaan we aan de slag met het herstellen van natuur en het ontwikkelen van nieuwe natuur (fase 2). Fase 2 wordt uitgevoerd door de provincie Noord-Holland en staat gepland voor de periode 2025-2027.



3

Financiën



Waar staan we nu?

Vanaf de start in 2017 zien we dat na zes jaar veel projecten uit het uitvoeringsprogramma zijn gestart, afgevallen of afgerond, maar ook dat er deelprojecten zijn bijgekomen of vervangen. De resterende looptijd van het programma willen we meer focus aanbrengen en vooral inzetten op de uitvoering van projecten.

De meeste projecten bevinden zich in de voorbereidingsfase. Hierdoor is van het door de stuurgroep goedgekeurde en vrijgegeven budget van circa €35 miljoen tot nog toe slechts een deel echt uitgegeven.

Schematisch (in miljoenen euro's):	
raming uitvoeringsprogramma	77,2
totaal huidige dekking	52,2
uitgegeven	15,4
beschikbaar restbudget	36,8

Ontwikkeling kosten

Programmabreed komen de kosten in 2023 uit op een totaal van € 3,42 miljoen. Over de periode 2017-2023 is er € 15,4 miljoen uitgegeven; dit is ruim 29,5% van het huidige gedekte programmabudget van € 52,2 miljoen. Er is minder uitgegeven dan geprognosticeerd door met name capaciteitsvraagstukken, vertragende scopewijzigingen of omdat het overleg met derden meer tijd vraagt.

Verdeling over de pijlers

De uitgaven in de afgelopen jaren zijn als volgt verdeeld over de drie pijlers van het gebiedsakkoord:

- 1.1 t/m 1.7 - Ontwikkelen vrijetijdslandschap: € 9,60 miljoen
- 2.1 t/m 2.5 - Versterking ecologische waarden: € 4,04 miljoen
- 3.1 t/m 3.4 - Transitie recreatiesector/organisatiekosten: € 0,63 miljoen
- 4.0 - Bureau- en capaciteitslasten: € 1,10 miljoen

Pas aan het einde van de planuitwerkingsfase, waarbij op basis van planning, risico's en raming het kasritme wordt bepaald, kan een realistisch uitgavenpatroon worden vastgesteld. Dan kunnen we ook een goede meerjarenprognose afgeven.

In deze voortgangsrapportage wijken projectkosten die onder verantwoordelijkheid vallen van de gemeente Wijdmeren soms af ten opzichte van de rapportages uit voorgaande jaren. Dit komt omdat in voorgaande jaren de BTW is meegenomen in de kosten, terwijl de gemeente deze kan compenseren.

Financieel totaaloverzicht

Programma Oostelijke Vechtplassen			2023	2017 -2023	2024
Deelproject	Budget GA	Herzien budget	Kosten	Totaal Kosten	Budget
Recreatieve verbindingen	14.071.000	5.887.945	88.817	853.703	5.034.242
Bagger en zwevend slib	30.850.000	19.363.337	2.776.690	8.597.646	10.765.691
Proces en onderzoek	190.000	170.000	5.000	150.095	19.905
Versterking ecologische waarden	30.511.000	23.433.874	359.123	3.653.647	19.780.227
Bestrijding invasieve exoten	1.000.000	500.000	-	387.323	112.677
Transitie recreatie sector	570.000	685.000	12.578	626.119	58.882
Bureaunkosten	-	559.264	30.534	278.794	280.470
Capaciteit	-	380.000	29.400	354.556	25.444
Communicatie	-	1.218.000	120.604	468.584	749.416
EINDTOTAAL	77.192.000	52.197.419	3.422.746	15.370.466	36.826.953

4

Status projecten



Lopende projecten			Huidige fase	Scope	Planning	Financiën
Ontwikkelen vrijetijdslandschap						
1.1	Recreatieve routes & natuur- en landschapsbeleving	Verkenning				
1.2	(Water)recreatie 's-Graveland/Kortenhoef	Verkenning				
1.3	Alternatieven voor de waterrecreatie (voorheen Vaarverbinding Loosdrechtse Plassen - Hilversums Kanaal)	Verkenning				
1.5a	Van dorpslint naar recreatieboulevard (Wijdmeren)	Verkenning				
1.7.1a	Aanpak baggerproblematiek (fase 1)	Realisatie				
1.7.1b	Aanpak baggerproblematiek (exclusief fase 1)	Verkenning en planuitwerking				
1.7.2	Aanpak zwevend slib: helder water en ontwikkeling waterplanten	Planuitwerking				
1.8	Herstel en duurzaam behoud legakkerlandschap Kievitsbuurten	Realisatie				
Versterken ecologische waarden						
2.1	Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Kortenhoef Oost	Verkenning				
2.1	Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Kortenhoef West	Verkenning				
2.1	Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Ankeveen (HAP/SAP)	Verkenning				
2.1	Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Weersloot	Verkenning				
2.1	Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Ster van Loosdrecht	Verkenning				
2.1	Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Vuntus	Verkenning				
2.1	Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – 't Hol	Planuitwerking				
2.2a	Realiseren Ecologische verbindingen – N201	Planuitwerking				
2.2b	Realiseren Ecologische verbindingen - Faunapassages	Planuitwerking				
2.3	Verbeteren waterkwaliteit	Planuitwerking				
2.4.3a	Planuitwerking natuurmaatregelen voor moerasvogels	Planuitwerking				
2.4.3b	Quickscan Nieuwe Polderplas	Verkenning				
2.5.2	Maatregelen ganzenvraat	Realisatie				
2.5.3	Bestrijding exoten	Planuitwerking				
Transformatie recreatiesector						
3.1	Gebiedsloods	Realisatie				
3.2a	Transitieteam Recreatie en Toerisme	Realisatie				
3.2b	Toekomstbeeld Recreatie 2030	Planuitwerking				
3.4	Verkenning bedrijveninvesteringszone / investeringsfonds	Verkenning				
Organisatiekosten						
4.1	Organisatiekosten GA OVP	Niet fase gebonden				

 Project verloopt volgens meest actuele plan van aanpak, geen besluit stuurgroep vereist

 Project verloopt niet geheel volgens meest actuele plan van aanpak, geen besluit stuurgroep vereist

 Project verloopt niet volgens meest actuele plan van aanpak, besluit stuurgroep vereist

Afgeronde (deel)projecten uit het uitvoeringsprogramma

Projecten		Opmerkingen
1.1	Wandelbrug 's-Graveland	De wandelbrug is opgeleverd in 2019.
1.1	Deelproject Kano-overstapplaats Wijde Blik-Vuntus	Officiële décharge heeft in 2021 plaatsgevonden.
1.4	Onderzoek ontsluiting en toegankelijkheid	Het onderzoek is afgerond. De gemeente Wijdemeren is aan zet om aan de slag te gaan met de aanbevelingen uit het rapport.
1.5b	Duurzame ontwikkeling Scheendijk (Stichtse Vecht)	De toekomstvisie Scheendijk is opgeleverd en vastgesteld. De realisatie van het plan valt buiten het OVP; de gemeente Stichtse Vecht gaat hiermee verder.
1.6	Prijsvraag Icoon Oostelijke Vechtplassen	De prijsvraag is afgerond. De Gouden Greep heeft een plan gemaakt en een website ontwikkeld. Een werkgroep onder leiding van de gemeente Wijdemeren werkt het plan uit.
2.2	Deelproject Faunapassage Gele Brug	Bij de renovatie van de brug in Ankeveen is een faunapassage aangelegd.
2.3	Defosfatering Bethuneoverschot	Door defosfatering van het Bethuneoverschot stroomt er schoner water in de Loosdrechtse Plassen.
2.5.1	Populatiebeheer ganzen	De provincies zijn verantwoordelijk voor het ganzenbeleid. Binnen het OVP wordt de ganzenproblematiek waar mogelijk meegenomen in andere projecten.
2.5.2	(Nood)maatregelen Ganzenvraat t.b.v. de grote karekiet	Het budget is volledig besteed. Maatregelen worden waar mogelijk meegenomen in andere projecten.
3.1	Fiets-voet-veer	Beide onderzoeken zijn in 2020 afgerond.
3.3	Integreren recreatie en natuur: onderzoek <i>samengaan natuur en waterrecreatie</i> en onderzoek <i>duurzaam varen</i>	Er is geen financiering voor de follow-ups van deze onderzoeken.

5

Ontwikkelen vrijetijdslandschap



Project 1.1 Recreatieve verbindingen

Projecttrekker(s)	Gemeente Wijdmeren		
Projectraming volgens UVP	€ 2.621.000		
Fase project	Verkenning		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	11-07-2018		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Een aaneengesloten wandel- en/of fietsnetwerk draagt bij aan een betere bereikbaarheid, ontsluiting en beleving van het gebied. Het zoeken naar meer mogelijkheden voor recreatie waarbij de natuur niet wordt belast, is een intensief proces dat veel afstemming vraagt. Vanwege het ontbreken van een project-leider is in 2023 beperkte voortgang geboekt op dit project.		
Betrokken partijen	Gemeente Wijdmeren, Gemeente Stichtse Vecht, Gemeente Hilversum, Provincie Noord-Holland, Provincie Utrecht, Natuurmonumenten, Waternet/AGV, Plassenschap Loosdrecht e.o. en private partijen		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: diverse projecten Natuurontwikkeling (2.1), Van dorpslint naar recreatieboulevard (1.5), Aanleg van nieuwe vaarverbindingen (1.3), Alternatieve projecten waterrecreatie (1.2) en Ontwikkeling van de Nieuwe Polderplas (2.4.3b). Ook is er een relatie met Transitie recreatie en toerisme (3.2).		

Resultaatbereik 2023

Beoogd resultaat 2023

- Het plan van aanpak voor het Zoddepad en het Vuntuspad is goedgekeurd. De routes zijn bekend en er is gestart met het voorbereiden van de realisatie van de voorzieningen, zoals bruggetjes, hekwerk en bewegwijzering.
- Voor het Korremofpad is een plan van aanpak goedgekeurd en de route is - na gesprekken met de grondeigenaren - grotendeels bekend.
- Routing van het Groenewoudpad heeft een plek gekregen binnen het opstellen van het NNN-inrichtingsplan Kortenhoef-Oost.
- Voor het project Horstermeer-Zuid is een plan van aanpak goedgekeurd en in uitvoering.
- Voor wat betreft het LegakkerFortenpad Kievitsbuurten wordt binnen de mogelijkheden een plan van aanpak opgesteld.
- Er is duidelijkheid over de plannen van het Trekpad en deze kunnen worden uitgewerkt binnen het project Nieuwe Polderplas.

Bereikt resultaat 2023

Zoddepad en het Vuntuspad

Het participatietraject met de grondeigenaren en buurtbewoners voor de aansluiting van het Vuntuspad op de Kromme Rade is door het ontbreken van een projectleider in 2023 niet verder gebracht. Het wandelpad moet uiteindelijk een plek krijgen in het NNN-inrichtingsplan voor het Vuntusgebied.

Wandelpad Ster van Loosdrecht

In de eerste helft van 2023 vonden kennismakingsgesprekken en veldbezoeken plaats bij grondeigenaren in het gebied Ster van Loosdrecht. Het streven is het wandelpad samen met de NNN-opgaven onder te brengen in een integrale gebiedsvisie. De provincie Noord-Holland gaat in 2024 het participatietraject met de omgeving bepalen en uitrollen.

Korremofpad

In 2023 is een ecologische toets uitgevoerd voor het Korremofpad waarbij de mogelijke effecten op moerasvogels bij realisatie van het pad in kaart zijn gebracht. Vanuit het perspectief van natuurwetgeving is het mogelijk een wandelpad te openen op het voorgestelde tracé. Mits de drie petgaten aan de noordzijde én de graslanden aan de oostzijde ontoegankelijk zijn voor wandelaars. Fysieke beperkingen zoals een sloot, bramen- of meidoornhaag of een hoog hek kunnen dit voorkomen. Aan de rand van de Kortenhoefse Plassen is het gewenst een strook hoge vegetatie te laten staan, zodat de vogels die op de plassen rusten, geen zicht hebben op wandelaars.

Groenewoudpad

De ontwikkeling van het Groenewoudpad wordt meegenomen bij de realisatie en uitvoering van het NNN-inrichtingsplan Kortenhoef-Oost door de gelijknamige projectgroep. Het besluit van de provincie Noord-Holland over de voormalige vuilstort Groenewoud bepaalt de aanpak voor het hele gebied Kortenhoef-Oost. De verwachting is dat hierover in 2024 meer duidelijkheid ontstaat.

Horstermeer Zuid

Dit project omvat een wandelroute op de Ringdijk Zuid, het NERA-ommetje, de fietsdoorsteek Horstermeerpolder en het wandeltraject Horstermeer - Fort Kijkuit - Hilversumskanaalpad (noordoever). Een verbinding met het Korremofpad is eveneens een wens. Starten en parkeren bij Fort Kijkuit/Natuurmonumenten is geen optie waardoor realisatie van zonneveer Molen-Gabriël niet haalbaar lijkt. Pas nadat de plannen voor realisatie van NNN van de provincie Noord-Holland en die voor waterbeheer van Waternet/AGV duidelijk zijn, kan worden bepaald of de gewenste trajecten haalbaar zijn. Daarbij lijkt realisatie van het NERA-ommetje over onder andere de NERA-dijk het meest haalbaar.

LegakkerFortenpad (gemeente Stichtse Vecht)

Het bestuur heeft in 2023 besloten het haalbaarheidsonderzoek on hold te zetten om dit in januari 2024 weer te hervatten. Daarbij geldt als randvoorwaarde dat de provincie Utrecht een aantal besluiten heeft genomen dat de haalbaarheid van het wandelpad bepaalt, zoals andere het ganzenrustgebied en de integrale gebiedsontwikkeling van polder Mijnden.

Trekpad Loenderveenseplas

Suggesties voor dit pad zijn al in 2019 en 2020 vastgelegd in scenario's voor de eventuele ontwikkeling van de Nieuwe Polderplas, die in eigendom is van de provincie Noord-Holland. Zodra er duidelijkheid bestaat over de toekomst van deze plas kan worden beoordeeld of een trekpad Loenderveenseplas kans van slagen heeft.

Algemene ontwikkelingen

Eind 2023 heeft een gesprek plaatsgevonden met Natuurmonumenten waarin de mogelijkheden voor realisatie van de verschillende wandelpaden in het plassengebied zijn besproken. In 2024 vinden vervolggesprekken plaats. De focus ligt op het realiseren van die wandelpaden waarover weinig discussie bestaat en daarmee de grootste kans van slagen hebben.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning Planuitwerking	N.v.t.	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 275.000	€ 2.621.000	€ 20.000 voor kano overstapplaats (RGV) € 75.000 voor Korremofpad € 25.000 voor Vuntuspad € 50.000 voor uitvoering Horstermeer Zuid € 30.000 voor LegakkerFortenpad (SV) en € 75.000 voor Zoddenpad
Herzien projectbudget			€ 1.499.173	€ 80.000 overgeheveld t.b.v. inhuur projectleiding Horstermeer Zuid. Ten behoeve van de dekking van de algemene programmakosten is 3,5 % van het budget afgeroomd. Geen dekking voor project Fort Spion € 650.000.
Totaal besteed:	t/m 2022	€ 30.088	€ 30.088	
	in 2023	€ 14.054	€ 14.054	€ 950 is uitgegeven aan een ecologisch onderzoek t.b.v. het Korremofpad. Kosten Stichtse Vecht voor het Legakker- fortenpad zijn € 13.104. Capaciteitsuitgaven van Wijdemeren voor de recreatieve verbindingen komen ten laste van project 4.1 organisatiekosten, onderdeel capaciteit Wijdemeren.
	Totaal	€ 44.142	€ 44.142	
Resterend budget		€ 230.858	€ 1.455.031	

Doorkijk 2024

Beoogd resultaat 2024

- In afstemming met Natuurmonumenten is bepaald welke wandelpaden kunnen worden gerealiseerd. Een projectleider pakt de uitwerking en realisatie van deze kansrijke paden op.
- Voor de deelgebieden Vuntus, Ster van Loosdrecht en Weersloot is in opdracht van de provincie Noord-Holland samen met bewoners, terreinbeheerders, waterschap en grondbezitters onderzocht op welke manier de gestelde ambities én de beleving van natuur en landschap in deze drie deelgebieden concreet vorm kunnen krijgen.
- De opgaven op het gebied van natuur en water voor het gebied Horstermeer-Zuid zijn vertaald in een plan. Dit plan biedt ook duidelijkheid over de haalbaarheid van de gewenste recreatieve verbindingen.
- Er zijn voorstellen gedaan voor het vervolg van het LegakkerFortenpad.
- Het Groenewoudpad heeft plaats gekregen in het NNN-inrichtingsplan in het gebied Kortenhoef-Oost.
- De plannen voor de Nieuwe Polderplas zijn duidelijk en daarmee ook de kansen voor realisatie van het Trekpad Loenderveense Plas.
- Duidelijk is of en zo ja, op welke wijze we verbinding kunnen maken met ontwikkelingen rondom de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Risico's scope, planning, financiën

- Grondeigenaren willen niet meewerken en vertragen daarmee het proces of maken dit onmogelijk waardoor we moeten bekijken of alternatieve trajecten grotere kans van slagen hebben.
- Het ontbreken aan duidelijkheid over de NNN-projecten, waarmee ook de haalbaarheid van realisatie van de paden onduidelijk blijft.

Project 1.2 Waterrecreatie 's-Graveland/Kortenhoef

Projecttrekker(s)	Gemeente Wijdmeren		
Projectraming volgens UVP	€ 5.750.000		
Fase project	Verkenning		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	02-09-2020		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	In maart 2023 is een scopewijziging doorgevoerd nadat duidelijk was geworden dat het geheel bevaarbaar maken van de 's Gravelandsevaart geen optie (meer is). Onderzocht wordt welke waterrecreatieve projecten wél haalbaar zijn en als wenselijk alternatief kunnen fungeren. Daarbij is het zoekgebied uitgebreid met het noordelijke deel van de Oostelijke Vechtplassen, inclusief de N201 en de Wijde Blik. Dit betreft het gebied van de Groene Uitweg en het gebied dat nauw daarmee samenhangt.		
Betrokken partijen	Gemeente Wijdmeren, gemeente Hilversum, Regio Gooi en Vechtstreek, provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten, Plassenschap Loosdrecht e.o., HISWA-RECRON, Toeristische Kanobond Nederland, Watersportverbond, Stichting Behoud Erfgoed 's-Gravelandsevaart, Bewonersfederatie OVP, (vertegenwoordiging van de) recreatieondernemers		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: Recreatie routes (1.1), Waterrecreatie 's Graveland en Korte Hoef (1.2) en andere recreatieve ontsluitingen. Ook bestaat er een relatie met het project Transitieteam recreatie en toerisme (3.2). Bij de uitvoering moet rekening worden gehouden met projecten die de ecologische waarden in het gebied versterken of beschermen.		

Resultaatbereik 2023

Beoogd resultaat 2023

- De projectleider heeft een start gemaakt met het actualiseren van het plan van aanpak. De aanpak is afgestemd op de activiteiten die worden uitgevoerd voor project 1.3 met de gewijzigde scope: het onderzoek naar de alternatieven voor de waterrecreatie.

Bereikt resultaat 2023

- Vanaf 1 augustus heeft een nieuwe projectleider de vaarverbindingen die in eerdere onderzoeken zijn benoemd, gescreend op haalbaarheid.
- Bij sommige projecten ontwikkelen andere partijen het project zoals bij de Ster en de Wijde Blik.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning	-	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 203.000	€ 5.750.000	
Herzien projectbudget		-	€ 1.597.380	Er is € 245.000 overgeheveld naar communicatie en capaciteit gemeente Wijdmeren. Ten behoeve van de dekking van de algemene programmakosten is het budget met 3,5 % afgeroomd. De dekking uit Groene Uitweg middelen vervalt. Een deel van de reeds gemaakte kosten is verrekend met het terug te vloeien budget, totaal € 3.720.725.
Totaal besteed:	t/m 2021	€ 101.334	€ 1101.334	
	in 2022	€ 18.620	€ 18.620	€ 18.620 is besteed aan onderzoek naar haalbare alternatieven voor de vaarverbinding 's-Gravelandse vaart.
	Totaal	€ 119.954	€ 119.954	
Resterend budget		€ 83.046	€ 1.477.426	

Doorkijk 2024

- Het onderzoek naar haalbare alternatieven voor de vaarverbinding 's-Gravelandse vaart is in het eerste kwartaal van 2024 opgeleverd. Op basis daarvan is een advies opgesteld voor het vervolg van projecten.
- De stuurgroep OVP maakt keuzes voor het vervolg, waarbij mogelijk een bredere koerswijziging plaatsvindt.

Risico's scope, planning, financiën

- Het vervolg van dit project moet aansluiten bij keuzes die de stuurgroep maakt voor project 1.3, waarbij wordt gezocht naar alternatieven die de waterrecreatie een impuls geven.
- Omdat de bevaarbaarheid van de 's-Gravelandsevaart niet verder wordt onderzocht, vervallen de Groene Uitweg gelden voor het upgraden/aanpassen van de Noordersluis, de Corverbrug, de upgrade/verplaatsing van de Zuidersluis en het aanbrengen van remmingswerken en het herstel van (een deel van) de oeverbescherming en beschoeiing.

Project 1.3 Alternatieven waterrecreatie (voorheen vaarverbinding Loosdrechtse plassen - Hilversums kanaal)

Verkenning Rondje om de Zuid

Projecttrekker(s)	Gemeente Wijdmeren		
Projectraming volgens UVP	€ 5.700.000		
Fase project	Verkenning		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	Het intakeformulier is goedgekeurd op 06-12-2022 en ter kennisname doorgestuurd aan RG op 25-01-23 en aan SG op 20-02-2023.		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Het onderzoek naar de alternatieven voor de waterrecreatie heeft geleid tot de keuze om één van de alternatieven, het zogenoemde Rondje om de Zuid, verder te verkennen. Dit rondje loopt vanaf de Kraaienestersluis over het Tienhovens kanaal via de plassen en over de Drecht terug naar de Vecht. Een upgrade van de route zou een aanvulling zijn op het bestaande vaarnetwerk en het gebied aantrekkelijker maken voor een grotere groep watersporters. Bij de besluitvorming over de financiële vraagstukken binnen het OVP zijn ongedekte budgetten weggeschreven. Voor dit project gaat dat om een bedrag van € 2.750.000. De partners hebben bij het laten vervallen van de vaarverbinding LP-HK afgesproken om samen te zoeken naar aanvullende financiering voor een alternatief project. Onderdeel van deze afspraak is dat de provincies Noord-Holland en Utrecht de kosten van de verkenning voor hun rekening nemen.		
Betrokken partijen	Gemeente Wijdmeren, gemeente Stichtse Vecht, gemeente Hilversum, provincie Noord-Holland, provincie Utrecht, recreatie-ondernemers, Watersportverbond, HISWA-RECRON, Bewonersfederatie OVP, Natuurmonumenten, Vechtplassencommissie, Waternet/AGV, Toeristische Kanobond Nederland, Vereniging Kievitsbuurten, Plassenschap Loosdrecht e.o.		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: Recreatieve routes (1.1), Waterrecreatie 's Gravenland en Kortenhoef (1.2) en andere recreatieve ontsluitingen, Transitieteam recreatie en toerisme (3.2). Bij de uitvoering van het project moet rekening worden gehouden met projecten die de ecologische waarden versterken of beschermen.		

Resultaatbereik 2023

Boord resultaat 2023

De verkenning van het Rondje om de Zuid is afgerond en heeft geresulteerd in een aantal scenario's. De stuurgroep heeft hierover een besluit genomen, dat is gecommuniceerd met alle betrokkenen.

Bereikt resultaat in 2023

De stuurgroep heeft besloten te stoppen met de verkenning van het zogenoemde Rondje om de Zuid. Uit de verkenning blijkt dat de route niet geschikt kan worden gemaakt voor de kleinste klasse kajuit- en zeilboten met strijkbare mast (BRTN DM klasse), en ook niet voor een light variant waarbij de BRTN DM klasse als eis wordt losgelaten.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning	-	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 780.000	€ 5.700.000	
Herzien projectbudget		€ 780.000	€ 2.771.392	€ 100.000 overgeheveld t.b.v. communicatie € 2.750.000 weggeschreven die niet gedekt was. Restantbedrag met 3,5% verlaagd t.b.v. programmakosten. Budget toegekend voor haalbaarheidsanalyse alternatieven. € 100.000 budget toegekend eind 2022 voor verkenning Rondje om de Zuid.
Totaal besteed:	t/m 2022	€ 633.464	€ 633.464	NB: gecorrigeerd bedrag t.o.v. jaarverslag over 2022. Kosten gemeente Wijdmeren € 87.883. Kosten provincie Noord-Holland € 545.581.
	in 2023	€ 118.535 -€ 62.392	€ 118.535 -€ 62.392	De kosten voor de verkenning van het Rondje om de Zuid bedroegen totaal € 124.784. De provincie Utrecht draagt bij aan de helft van de kosten.
	Totaal	€ 689.607	€ 689.607	
Resterend budget		€ 90.393	€ 2.081.785	

Doorkijk 2024

Er bestaat duidelijkheid over de gevolgen die een koerswijziging van het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen op dit project heeft.

Risico's scope, planning, financiën

Bij het sluiten van het gebiedsakkoord was bekend dat er geen volledige dekking is voor de realisatie van de vaarverbinding LP-HK. Alleen het gedekte budget is nog beschikbaar.

Project 1.5a Van dorpslint naar recreatieboulevard

Projecttrekker(s)	Gemeente Wijdmeren		
Projectraming volgens UVP	€ 60.000 voor totaal project 1.5 waarvan € 45.000 voor onderdeel gemeente Wijdmeren		
Fase project	Verkenning		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	31 maart 2021 (intakeformulier)		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	De reconstructie van de Nieuw Loosdrechtsedijk zorgt voor vertraging van dit project. De werkzaamheden zijn in het najaar van 2023 gestart en lopen door tot najaar/winter 2024/2025. Daarna kunnen onder andere de mogelijkheden worden verkend voor het realiseren van een passende aansluiting van de aangrenzende (particuliere) percelen op de gereconstrueerde weg in het gebied Boomhoek.		
Betrokken partijen	Gemeente Wijdmeren, Waternet/AGV, recreatiesector, VVBB, bewoners en eigenaren belendende percelen		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: projecten waarbij de betrokkenheid van bewoners, al dan niet vertegenwoordigd in belangengroepen, belangrijk is. Dit zijn onder andere: NNN-realisatie in Weersloot en in Ster van Loosdrecht (2.1) en mogelijk Maatregelen voor moerasvogels (2.4). Daarnaast bestaat er een relatie met: Transitieteam recreatie en toerisme (3.2), Onderzoek Ontsluiting en Toegankelijkheid (1.4) en waar mogelijk wordt een combinatie gemaakt met het project Faunapassages (2.2).		

Resultaatbereik 2023

Beoogd resultaat 2023

Er is duidelijkheid over het vervolg en hoe daarbij onder andere kan worden samengewerkt met de Vereniging Verenigde Bedrijven Boomhoek (VVBB).

Bereikt resultaat 2023

Behalve de toezegging van € 10.000 aan de VVBB voor het opstellen van een plan voor bewoners en ondernemers in de omgeving Boomhoek, is er op dit project geen voortgang geboekt. Dit gebeurt op z'n vroegst na oplevering van de recreatieboulevard in het najaar/winter van 2024/2025.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning Planuitwerking	-	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 30.000	€ 45.000	Betreft het deel van gemeente Wijdmeren.
Herzien projectbudget		-	€ 30.000	€ 15.000 is overgeheveld naar inzet capaciteit.
Totaal besteed:	t/m 2022	€ 4.380	€ 4.380	
	in 2023	€ 0	€ 0	
	Totaal	€ 4.380	€ 4.380	
Resterend budget		€ 25.620	€ 25.620	

Doorkijk 2024

- Er bestaat duidelijkheid of, in welke vorm en onder welke regie de aanbevelingen uit het rapport vervolg krijgen.
- Het plan van de VVBB is uiterlijk een half jaar na oplevering van de recreatie-boulevard ingediend.

Risico's scope, planning, financiën

- Als onvoldoende eigenaren van aangrenzende percelen willen meewerken aan het plan voor een passende aansluiting van percelen op een nieuw ingerichte openbare ruimte, is heroverweging over het vervolg noodzakelijk.
- Voor het vervolg is zeer beperkt budget beschikbaar. Dit kan de animo om deel te nemen beperken.

Project 1.7.1a Baggeropgave fase 1

Projecttrekker(s)	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 6.276.315		
Fase project	Realisatie		
Datum goedkeuring huidig PVA (SG/RG)	8-10-2020 (Verseon 1505767)		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Het baggeren loopt op schema. Het streven is het baggeren op de Loosdrechtse Plassen af te ronden medio 2024. Het bagger uit het depot in polder Mijnden wordt in het derde kwartaal van 2025 verspreid. Daarna wordt het oude slotenpatroon hersteld en worden percelen ingezaaid.		
Betrokken partijen	Gemeenten en provincie Utrecht		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: overige fasen van de baggeropgave en Zorg voor legakkerlandshap (1.8), maar ook projecten die bijdragen aan het versterken van natuurwaarden en recreatie: Betere waterkwaliteit (2.3), Bestrijden van exoten (2.6), Maatregelen voor moerasvogels (2.4), Nieuwe Polderplas (2.4.3b) en Integreren van recreatie en natuur (3.3).		

Resultaatbereik 2023

Beoogd resultaat 2023

- De scope van fase 1B is toegevoegd aan de scope van fase 1A.
- Eind van het jaar is circa 65% van de baggeropgave van fase 1 bereikt.
- De moeilijkste oppervlakken in de Loosdrechtse Plassen zijn gebaggerd.

Bereikt resultaat 2023

- Circa 70% van de baggeropgave fase 1 is bereikt.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase				
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP			€ 6.276.315	
Herzien projectbudget			€ 6.876.315	Middels een stuurgroep-besluit is er € 600.000 budget extra beschikbaar. Dit budget is afkomstig van Baggeren fase 2 en 3.
Totaal besteed:	t/m 2022		€ 1.503.631	
	in 2023		€ 2.454.878	
	Totaal		€ 3.958.406	
Resterend budget			€ 2.917.909	Het grootste deel zit in de verplichting aan de aannemer.

Doorkijk 2024

Verwacht resultaat 2023

Het baggeren in de Loosdrechtse plassen is fysiek gereed. Na het drogen van de bagger is het depot in polder Mijnden ontmanteld.

Risico's scope, planning, financiën

- Tijdens de realisatie treedt schade op aan de omgeving, zoals wegen en oevers.
- De opdrachtgever beheerst de omvang van de zettingen in de ondergrond van het depot onvoldoende.
- De opdrachtnemer voert de monitoring van de bodemdaling in het depot niet uit conform het monitoringsplan.

Project 1.7.1b Aanpak baggerproblematiek (exclusief fase 1)

Projecttrekker(s)	Provincie Noord-Holland		
projectraming volgens UVP	€ 7.223.685		
fase project	Verkenning en planuitwerking		
datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	30 juni 2021		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Het baggeren van de jachthavens als volgende stap in de opgave blijkt complex. Het voorkomen van slibinstroom in havens is niet mogelijk, waardoor baggeren van havens een periodieke kostbare opgave is. Een projectgroep maakt een voorstel voor verdergaande stimulering van deze baggeropgave en kijkt daarbij ook naar de beheeropgave. De planning staat onder druk, maar met kordaat doorpakken en draagvlak kan mogelijk in 2025 gestart worden met het baggeren van jachthavens. Het succes daarvan kan bijdragen aan draagvlak voor de beheeropgave.		
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland, provincie Utrecht, Waternet/AGV, gemeente Wijdmeren, gemeente Stichtse Vecht, gemeente Hilversum, HISWA-RECRON, het Watersportverbond, stichting Kievitsbuurten, Natuurmonumenten, Bewonersfederatie OVP		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: Zwevend slib en Waterplanten (1.7.2) en Zorg voor legakkerlandschap (1.8).		

Resultaatbereik 2023

Beoogd resultaat 2023

- De verkenning naar mogelijkheden om instroom van slib in havens te voorkomen is uitgevoerd.
- Er is een aanzet gemaakt voor een beheerplan.

Bereikt resultaat 2023

- Een verkenning heeft uitgewezen dat instroom van slib niet kan worden voorkomen.
- Een projectgroep werkt aan een visie-document, maar het beheerplan is nog niet gereed.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 2.459.200	€ 6.967.086	Conform rapportage 2022.
Herzien projectbudget		-	€ 6.367.086	Dekking van € 600.000 overgegaan naar Baggeren fase 1.
Totaal besteed:	t/m 2022	€ 2.203.712	€ 2.203.712	Kosten zijn iets hoger dan in rapportage 2022 door herijking kosten Waternet/AGV voor preventieve maatregelen, zie 1.7.2.
	in 2023	€ 61.377	€ 61.377	
	Totaal	€ 2.265.089	€ 2.265.089	
Resterend budget		€ 194.111	€ 4.101.997	

Doorkijk 2024

Beoogd resultaat 2024

- De werkhaven Rimboe van het plessenschap is gebaggerd.
- Er ligt een uitgewerkt en gedragen voorstel voor het baggeren van de jachthavens.
- Het beheerplan heeft vorm gekregen.
- Er is aanvullende financiering gezocht voor de beheeropgave en er bestaat inzicht in de mogelijkheden en draagvlak.

Risico's scope, planning, financiën

- De jachthavens worden niet gebaggerd omdat de havens de kosten, met inachtneming van de subsidie, toch te hoog vinden.
- Het baggeren van Vuntus en Stille plas (fase 3) is te kostbaar om binnen het OVP-budget te kunnen uitvoeren waardoor er andere mogelijkheden van financiering moeten worden verkend.
- Er komt geen overeenstemming over de verantwoordelijkheden en financiering van het beheer van de plassen.
- Als de baggeroperatie in de Loosdrechtse Plassen herhaald moet worden, ontstaat een uitdaging om dit binnen de programmaperiode van het OVP uit te voeren. Dit vraagt aanvullende financiering.

Project 1.7.2 Aanpak zwevend slib en waterplanten

Projecttrekker(s)	Waternet/AGV		
Projectraming volgens UVP	€ 6.050.000		
Fase project	Planuitwerking		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	Regiegroep 20 april 2023		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	De uitvoering verloopt conform het in april 2023 vastgestelde plan van aanpak. De voortgang is echter vertraagd door onvoldoende capaciteit. Dit wordt opgelost door uitbesteding van werkzaamheden aan een ingenieursbureau (offerte uitvraag december 2023). Afstemming met project 2.5.3 was nog niet mogelijk, omdat dit project in 2023 stillag.		
Betrokken partijen	Waternet/AGV, provincie Noord-Holland, gemeente Wijdmeren, Plassenschap Loosdrecht e.o.		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: Aanpak baggerproblematiek (1.7), Waterkwaliteit (2.3), Zorg voor legakkerlandschap (1.8), Maatregelen voor moerasvogels (2.4) en Bestrijding exoten (2.5.3).		

Resultaatbereik 2023

Beoogd resultaat 2023

- Er is een definitief plan van aanpak gereed voor het vergroten van de kansen voor ontwikkeling van waterplanten.
- Het projectplan voor uitvoering van maatregelen is gereed en afgestemd met het project Bestrijding exoten (2.5.3).
- Er is een praktijkexperiment gestart, gericht op het lokaal realiseren van luwe omstandigheden voor waterplanten en het vasthouden van slib.

Bereikt resultaat 2023

- Het plan van aanpak is aangepast en de regiegroep heeft dit vastgesteld op 20 april 2023.
- De offerte-uitvraag is gestart voor het opstellen van het uitvoeringsplan voor aanleg van luwtemaatregelen, inclusief het pilotproject gericht op het lokaal realiseren van luwe omstandigheden voor waterplanten en het vasthouden van slib.

Overige bijzonderheden

- Deltares heeft in samenhang met project 1.7.1 een rapport opgesteld om slibaanwas in havens en toegangseuilen inzichtelijk te maken en de effectiviteit te beoordelen van maatregelen om deze slibaanwas te verminderen. De conclusies zijn besproken in de bijeenkomsten van het Baggerplatform, regiegroep en stuurgroep.
- De verkenning is gestart naar mogelijkheden om de ontwikkeling van waterplanten te monitoren met behulp van satellietbeelden. Dit vond plaats naar aanleiding van het werkbezoek aan de Gastvrije Randmeren najaar 2023. Dit krijgt een vervolg in 2024.

Projectcijfers per fase

		Huidig fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Planuitwerking		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 1.050.000	€ 3.650.000	Budget van € 6.05 mio bestaat uit € 3.65 mio voor zwevend slib en € 2.4 mio voor Defosfatering.
Herzien projectbudget			€ 1.651.661	Subsidie van € 1.880.000 is uit budget gehaald, deze subsidie wordt elders verantwoord. Projectbudget is verlaagd met € 118.339 t.b.v. dekking programma-kosten.
Totaal besteed:	t/m 2022	€ 411.640	€ 411.640	
	in 2023	€ 97.959	€ 97.959	€ 67.904,60 eindfactuur slibmodel en effectberekening luwtestructuren € 30.054,59 is 50% van verkenning preventieve maatregelen slibaanwas à €60.109,17 (kosten verdeeld over 1.7.1. en 1.7.2).
	Totaal	€ 509.599	€ 509.599	
Resterend budget		€ 540.401	€ 1.142.062	

Doorkijk 2024

Beoogd resultaat 2024

- In februari is opdracht verleend voor het uitwerken van het uitvoeringsplan voor het realiseren van luwtemaatregelen en een praktijkexperiment gericht op het vasthouden van slib.
- Het uitvoeringsplan is gereed, waarbij de locaties en ontwerpen voor de aanleg van luwtemaatregelen zijn vastgesteld.
- We hebben de benodigde vergunningen in beeld en de aanvragen zijn gestart. De doorlooptijd is nog onbekend.
- Er is een programma voor monitoring opgesteld.
- Er is een praktijkexperiment gestart.

Risico's scope, planning, financiën

- De omvang/effectiviteit van de maatregelen valt tegen als realisatie op kansrijke plekken niet mogelijk blijkt te zijn.
- Er treedt vertraging op bij het vaststellen van het uitvoeringsplan door bezwaren van belanghebbenden, of door benodigde onderzoeken voor de vergunningen.
- De kosten zijn afhankelijk van het nog te kiezen ontwerp en daarom nog niet duidelijk.
- De effectiviteit van de luwtemaatregelen valt lager uit dan oorspronkelijk gedacht. Recreanten kunnen zich zorgen maken over de mogelijke locaties en effecten van de luwtestructuren en over een realisatie die duurder wordt dan het beschikbare budget. Luwtemaatregelen kunnen op verschillende manieren worden aangelegd. Een natuurlijke inpassing in het landschap (bijvoorbeeld rietstroken) draagt bij aan doelen op het gebied van waterkwaliteit (KRW) en natuur.

Project 1.8 Herstel en duurzaam behoud legakkerlandschap Kievitsbuurten

Projecttrekker(s)	Gemeente Stichtse Vecht		
Projectraming volgens UVP	€ 2.100.000		
Fase project	Planuitwerking		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	20 november 2019		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Alle uitvoeringswerkzaamheden zijn afgerond, inclusief de monitoringsfase volgens uitvraag. De oplevering van het definitieve monitoringsrapport moet nog plaatsvinden. Sinds eind december 2023 wordt in overleg met Waternet de stimuleringsregeling uitgewerkt (qua type pilots), inclusief verlenging van de ecologische monitoring en uitvoering van (eventueel) aanvullende werkzaamheden.		
Betrokken partijen	Waternet/AGV, Plassenschap Loosdrecht e.o, Vereniging Kievitsbuurten		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: Baggeren en zwevend slib (1.7), Betere waterkwaliteit (2.3) en Maatregelen voor moerasvogels (grote Karekiet) (2.4).		

Resultaatbereik 2023

Beoogd resultaat 2023

- Alle pilots zijn aangelegd en anderhalf jaar gemonitord.
- Uit de monitoringsresultaten blijkt hoe de vegetatie op de legakkers zich ontwikkelt en hoe de vooroevers zich hebben ontwikkeld gedurende 1 ½ jaar.
- Er bestaat meer inzicht in de factoren die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van riet en andere oever/waterplanten, zowel op de legakkers als in de vooroevers.

Bereikt resultaat 2023

- De pilots zijn vanaf het moment van uitvoering gemonitord en na aanleg specifiek op constructie, inklinking van toegepaste bagger en de ecologische ontwikkeling van de vooroevers.
- In mei 2023 vonden aanvullende werkzaamheden plaats om de rietgroei in diverse pilots te stimuleren cq. op gang te krijgen.
- In december 2023 is het monitoringsrapport opgeleverd met daarin de gegevens tot november 2023. Het definitieve rapport wordt in februari 2024 verwacht.
- De resultaten en kennis van de ecologische ontwikkeling van de oeverplanten op de legakkers en in de vooroevers bepaalt de uitwerking van de stimuleringsregeling.
- De monitoringsgegevens geven duidelijk aan dat het verwijderen van begroeiing op de legakker zelf in combinatie met het verwijderen van de bovengrond leidt tot een mooie helofytenvegetatie (riet, lisdodde, zeggen) op de legakker. Dit is een gewenste spontane ontwikkeling.

Overige bijzonderheden

- Eind 2023 is gebleken dat de ecologische ontwikkeling van de vooroevers niet zodanig (snel) is verlopen dat op basis van de (monitoring) gegevens harde conclusies kunnen worden getrokken voor het uitwerken van de stimuleringsregeling.
- In nauw overleg met Waternet (bevoegd gezag voor de waterkwaliteit en toepassen van bagger voor verondieping) wordt bepaald hoe de stimuleringsregeling uitgewerkt wordt in 2024 en welke aanvullende werkzaamheden (monitoring en aanvullende werkzaamheden) uitgevoerd moeten worden.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Realisatie		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 1.168.275	€ 2.100.000	In totaal is 2.100.000 euro beschikbaar voor dit project. Het budget voor fase 1 en 2 bedraagt 1.200.000 euro. Voor fase 3, de stimuleringsregeling zelf, was oorspronkelijk 900.000 euro begroot.
Herzien projectbudget			€ 2.068.275	Projectbudget is verlaagd t.b.v. dekking programmakosten.
Totaal besteed:	t/m 2022	€ 943.267	€ 943.267	Fase 1 en Fase 2. De kosten komen na nauwkeurige herberekening iets hoger uit dan vermeld in de voortgangsrapportage 2022.
	in 2023	€ 172.975	€ 645.539	Fase 2
	Totaal	€ 1.116.242	€ 1.116.242	
Resterend budget		€ 52.033	€ 952.033	Resterend budget voor fase 3.

Doorkijk 2024


Verwacht resultaat 2024

- In overleg met m.n. Waternet is vastgesteld of en hoe de stimuleringsregeling in 2024 openbaar kan worden gemaakt voor particulieren.
- De langere monitoringsperiode geldt in ieder geval voor geheel 2024, maar mogelijk ook nog in 2025.
- Op basis van de ecologische monitoringsresultaten is duidelijk of (water)riet groeit in bagger die recent is aangebracht. Deze resultaten zijn ook belangrijk voor de toekomstige plannen voor de Nieuwe Polderplas.

Risico's scope, planning, financiën

- In 2024 wordt de ecologische monitoring verlengd om duidelijkheid te krijgen over de ontwikkeling van de rietvegetatie en andere helofyten.
- Extra monitoring en mogelijk ook extra uitvoering van werkzaamheden aan de huidige pilots leidt tot meer uitgaven. Daarnaast nemen de begeleidingskosten toe.
- Fase 3, waarin de stimuleringsregeling voor particulieren wordt uitgewerkt en ingevoerd, gaat niet in op 1 augustus 2023 zoals de regiegroep en stuurgroep hebben vastgesteld, maar begin 2024. Budgettaire is dit mogelijk, financieel duidelijker en inhoudelijk zijn de fasen beter te scheiden.
- Het resterend budget van circa € 90.000 is beschikbaar voor fase 3. Dit is gezien de extra uit te voeren werkzaamheden voor de stimuleringsregeling en de langere periode van monitoren en mogelijke uitvoering van extra werkzaamheden meer dan wenselijk.
- De regie- en stuurgroep beslissen in maart en april over de planning, financiën en de uitvoering van de stimuleringsregeling.

Versterken ecologische waarden



Project 2.1 Natuurontwikkeling (NNN) Kortenhoef Oost

Projecttrekker(s)	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 1.950.000 NB De voorbereidingskosten mbt de NNN-opgaven komen niet vanuit het OVP-budget.		
Fase project	Verkenning		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	30 oktober 2021		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	De natuuropgaven worden aangevuld met rijksopgaven (waaronder stikstof en waterkwaliteit). Vervolg gebiedsproces wacht op GS-besluit omtrent toekomst Groenewoud en een ambitiekaart o.b.v. het uitgevoerde ecologische en hydrologische onderzoek.		
Betrokken partijen	Natuurmonumenten, Waternet/AGV, gemeente Wijdmeren, LTO Noord, Afvalzorg, VLEK, Baken		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: Natuurontwikkeling (2.1), projecten in Kortenhoef West, Ankeveen en Groenewoud.		

Resultaatbereik 2023

Beoogd resultaat 2023

- Het concept inrichtingsplan en/of kansenkaart is afgerond.
- De gesprekken met grondeigenaren zijn opgestart, waarbij is gestart in het zuidelijke deel van het gebied.
- Een eerste financiële inschatting voor de realisatie van de gewenste natuurdoelen is beschikbaar.
- De invulling van het definitieve inrichtingsplan is opgestart. Naar verwachting gaat dit in meerdere fases plaatsvinden, afhankelijk van wat in welk deel van het gebied wanneer mogelijk is.

Bereikt resultaat 2023

- Het concept inrichtingsplan/kansenkaart is nog niet gereed. Dit hangt voornamelijk samen met het uitblijven van besluitvorming rondom Groenewoud. Daarnaast was akkoord nodig vanuit de projectgroep voor het eco- en hydrologisch onderzoek, omdat dit onderzoek de basis vormt voor de ecologische ambitiekaart. Dit akkoord is in 2023 niet gegeven.
- Ook het opstarten van de gesprekken met grondeigenaren heeft om die reden nog niet plaatsgevonden.
- Besluitvorming over de toekomst van Groenewoud is ivm een nieuw college GS naar voren geschoven. De verwachting is dat medio 2024 een besluit wordt genomen.
- Het ecologisch en hydrologisch onderzoek is na een second opinion afgerond en wordt begin 2024 als definitief (met opmerkingen vanuit projectgroep) gepubliceerd.

Overige bijzonderheden

Initiatieven vanuit het gebied worden opgepakt. In 2023 hebben enkele perceeleigenaren contact opgenomen met de provincie om de mogelijkheden voor zelfrealisatie te bespreken.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 474.180	€ 1.950.000	
Herzien projectbudget			€ 1.855.314	Projectbudget verlaagd t.b.v. dekking programmakosten.
Totaal besteed:	t/m 2022	€ 156.251	€ 156.251	
	in 2023	-	-	Budget OVP is bestemd voor de realisatiefase.
	Totaal	€ 156.251	€ 156.251	
Resterend budget		€ 317.929	€ 1.699.063	

Doorkijk 2023

Verwacht resultaat 2024

Het concept inrichtingsplan is gereed en de eerste gesprekken met grondeigenaren hebben plaatsgevonden.

Risico's scope, planning, financiën

- Vertraging in het GS-besluit over Groenewoud zorgt voor vertraging in het gebiedsproces Kortenhoef Oost.
- Pas als het concept inrichtingsplan gereed is en er zicht bestaat op de noodzakelijke maatregelen om natuurdoelen te realiseren, wordt de financiële druk op het project helder. Dan weten we of het (resterende) budget voldoende is om de doelen te bereiken.
- Er is onvoldoende draagvlak voor de plannen (bestuurlijk en/of politiek).
- Uit het aanvullend onderzoek komen milieutechnische risico's naar voren, in het bijzonder geldt dit voor het onderzoek naar effecten van de voormalige vuilstort Groenewoud.
- De beschikbare kennis en capaciteit bij betrokken partijen zijn niet voldoende.

Project 2.1 Natuurontwikkeling (NNN) Kortenhoef West

Projecttrekker(s)	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 588.000 NB De voorbereidingskosten mbt de NNN-opgaven komen niet vanuit het OVP-budget.		
Fase project	Verkenning		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	30 oktober 2021		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	De natuuropgaven worden aangevuld met rijksopgaven (waar- onder stikstof en waterkwaliteit). Het gebiedsproces wacht op eco- en hydrologisch onderzoek, dat naar verwachting medio 2024 start en ongeveer een jaar duurt. Dat betekent dat het rapport eind 2025 kan worden vastgesteld en we in 2026 het gebiedsproces kunnen vervolgen. Daar komt bij dat het team momenteel onderbemenst is en het de vraag is hoeveel capaciteit kan worden vrijgemaakt voor dit project. Hiermee is de kans heel klein dat de planning (in 2027 gereed) wordt gehaald.		
Betrokken partijen	Natuurmonumenten, gemeente Wijdmeren, Waternet/AGV, LTO Noord (nu nog geen projectgroep), Baken (op afstand)		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: projecten Natuurontwikkeling (2.1) in Kortenhoef Oost en Ankeveen.		

Resultaatbereik 2023

Beoogd resultaat 2023

De verkenningfase is van start gegaan, en daarmee ook het eco- en hydrologisch onderzoek. Hiermee ontstaat een goed beeld van de natuur- en watermogelijkheden in het gebied.

Bereikt resultaat 2023

Vanwege de vertraging van projecten in Kortenhoef Oost en Ankeveen is het proces in Kortenhoef West nog niet opgestart. De beschikbare capaciteit is ingezet op deze twee processen. Daarnaast heeft het ecologisch en hydrologisch onderzoek voor Ankeveen en Kortenhoef West vertraging opgelopen.

Overige bijzonderheden

Initiatieven vanuit het gebied worden opgepakt. In 2023 hebben enkele perceeleigenaren contact opgenomen met de provincie om de mogelijkheden voor zelfrealisatie te bespreken.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 50.000	€ 588.000	
Herzien projectbudget			€ 558.839	Projectbudget verlaagd t.b.v. dekking programmakosten.
Totaal besteed:	t/m 2022	-	-	
	in 2023	-	-	Budget OVP is bestemd voor de realisatiefase.
	Totaal	-	-	
Resterend budget		€ 50.000	€ 558.839	

Doorkijk 2024

Verwacht resultaat 2024

- Het eco- en hydrologisch onderzoek is gestart.
- Initiatieven uit het gebied worden opgepakt.
- Het plan van aanpak kan pas worden opgesteld nadat de ambitiekaart voor het gebied o.b.v. de uitkomsten uit het ecologisch en hydrologisch onderzoek is vastgesteld.

Risico's scope, planning, financiën

- Pas als het concept inrichtingsplan gereed is en er zicht bestaat op de noodzakelijke maatregelen om natuurdoelen te realiseren, wordt de financiële druk op het project helder. Dan weten we of het (resterende) budget voldoende is om de doelen te bereiken.
- Er is onvoldoende draagvlak voor de plannen (bestuurlijk en/of politiek).
- Uit aanvullend onderzoek dat in 2024 wordt opgestart, blijken milieutechnische risico's.
- Beschikbare kennis en capaciteit bij betrokken partijen zijn niet voldoende.
- Verlies van momentum in het gebied door vertraging en weinig contact.

Project 2.1 Natuurontwikkeling (NNN) Ankeveen (HAP/SAP)

Projecttrekker(s)	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 1.270.500 NB De voorbereidingskosten mbt de NNN-opgaven komen niet vanuit het OVP-budget.		
Fase project	Verkenning		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	30 oktober 2021		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	De natuuropgaven worden aangevuld met rijksopgaven (waaronder stikstof en waterkwaliteit). Vervolg gebiedsproces wacht op eco- en hydrologisch onderzoek. Dit onderzoek start naar verwachting medio 2024 en duurt ongeveer een jaar. Dat betekent dat het rapport eind 2025 kan worden vastgesteld en pas in 2026 vervolg kan krijgen. Daar komt bij dat het team momenteel onderbemenst is en het de vraag is hoeveel capaciteit kan worden vrij gemaakt voor Kortenhoef-West. Hiermee is de kans heel klein dat de planning (in 2027 gereed) gehaald kan worden.		
Betrokken partijen	Natuurmonumenten, gemeente Wijdmeren, Waternet/AGV, LTO Noord, Baken		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: projecten Natuurontwikkeling (2.1) in Kortenhoef Oost en Kortenhoef West.		

Resultaatbereik 2023

Beoogd resultaat 2023

De verkenningfase is van start gegaan, en daarmee ook het eco- en hydrologisch onderzoek. Daarmee ontstaat een goed beeld van de natuur- en watermogelijkheden in het gebied.

Bereikt resultaat 2023

- Vanwege de vertraging in de projecten in Kortenhoef Oost en Kortenhoef West is het gebiedsproces in Ankeveen gestagneerd.
- De projectgroep Ankeveen heeft in 2023 akkoord gegeven op het plan van aanpak voor het gebiedsproces Ankeveen.
- Het eco- en hydrologisch onderzoek heeft vertraging opgelopen. Het plan van aanpak, ná het rapport dat volgde uit het onderzoek, moet daarom opnieuw worden geactualiseerd. Daarna kan een ambitiekaart worden opgesteld.

Overige bijzonderheden

Initiatieven vanuit het gebied worden opgepakt. In 2023 hebben enkele perceeleigenaren contact opgenomen met de provincie om de mogelijkheden voor zelfrealisatie te bespreken.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning	-	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 201.185	€ 1.270.500	
Herzien projectbudget			€ 1.206.622	Projectbudget verlaagd t.b.v. dekking programmakosten.
Totaal besteed:	t/m 2022	€ 19.492	€ 19.492	
	in 2023	-	-	
	Totaal	€ 19.492	€ 19.492	
Resterend budget		€ 181.693	€ 1.187.630	

Doorkijk 2024

Verwacht resultaat 2024

- Het eco- en hydrologisch onderzoek is gestart.
- Initiatieven vanuit het gebied worden opgepakt.
- Het opstellen van het plan van aanpak kan pas nadat de ambitiekaart voor het gebied o.b.v. de uitkomsten uit het ecologisch en hydrologisch onderzoek is vastgesteld.

Risico's scope, planning, financiën

- Pas als het concept inrichtingsplan gereed is en er zicht is op de noodzakelijke maatregelen om natuurdoelen te realiseren, wordt de financiële druk op het project helder. Dan weten we of het (resterende) budget voldoende is om de doelen te bereiken.
- Er bestaat onvoldoende draagvlak voor de plannen (bestuurlijk en/of politiek).
- Uit aanvullend onderzoek komen milieutechnische risico's naar voren.
- Beschikbare kennis en capaciteit bij betrokken partijen zijn niet voldoende.
- Verlies van momentum in het gebied door vertraging en weinig contact.

Project 2.1 Natuurontwikkeling (NNN) Weersloot

Projecttrekker (s)	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 2.385.500 NB De voorbereidingskosten mbt de NNN-opgaven komen niet vanuit het OVP-budget.		
Fase project	Verkenning / planuitwerking		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	10 april 2021		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Het gebiedsproces in de Weersloot heeft even stilgelegen door gebrek aan capaciteit, maar wordt nu weer opgestart. Capaciteit blijft een aandachtspunt. Daarnaast zijn de gevolgen voor de scope van het project vanuit het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) nog niet duidelijk. Vooral wat betreft de stikstofdoelstellingen en Natura2000-opgaven.		
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland, Gemeente Wijdmeren, Waternet/AGV, Natuurmonumenten, Vereniging de Weersloot		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: de projecten Recreatieve routes (1.1) en Faunapassages (2.3).		

Resultaatbereik 2023

Beoogd resultaat 2023

- De gesprekken met individuele grondeigenaren over de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) zijn gestart.
- Er heeft afstemming plaatsgevonden met KRW-maatregelen en N2000-beheerplan.

Bereikt resultaat 2023

- Het gebiedsproces in de Weersloot heeft in 2023 een paar maanden stilgelegen door gebrek aan capaciteit. Rond de zomer is de uitwerking van het gebiedsaanbod op perceelsniveau in het westelijke deel van de Weersloot weer opgestart.
- De voorbereiding van de uitvoering van de realisatie van de ecologische verbindingszone in Egelshoek is gestart.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning/ planuitwerking	-	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 400.000	€ 2.385.000	
Herzien projectbudget			€ 2.275.276	Projectbudget verlaagd t.b.v. dekking programmakosten.
Totaal besteed:	t/m 2022	€ 233.434	€ 233.434	
	in 2023	€ 98.631	€ 98.631	
	Totaal	€ 332.065	€ 332.065	
Resterend budget		€ 67.935	€ 1.943.211	

Doorkijk 2024

Verwacht resultaat 2024

- (Her)bevestiging van de scope van het project, inclusief aanvullende opgaven KRW, N2000 en waar mogelijk uit het PPLG (stikstof, klimaat, water- en bodemsturend, recreatie).
- Er is een proces voor het opstellen van een inrichtingsplan voor het hele Weerslootgebied opgestart, onder andere op basis van de inrichtingsplannen van grondeigenaren op perceelsniveau.
- Opdrachtverlening heeft plaatsgevonden en er is gestart met eco- en hydrologisch onderzoek op enkele percelen in het gebied.

Risico's scope, planning, financiën

- Er is vertraging door een tijdelijk capaciteitstekort.
- Er is onvoldoende draagvlak voor de plannen (bestuurlijk en/of politiek).
- Er wordt onvoldoende natuurontwikkeling behaald.
- Uit aanvullend onderzoek komen milieutechnische risico's naar voren.
- Er vindt een scopewijziging plaats door aanvullingen uit het Provinciaal Programma Landelijk Gebied en/of vanuit de Rijksoverheid.

Project 2.1 Natuurontwikkeling (NNN) Ster van Loosdrecht

Projecttrekker(s)	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 2.691.000		
Fase project	Verkenning / planuitwerking		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	10 april 2021		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Het gebiedsproces in de Ster van Loosdrecht heeft vertraging opgelopen door een tekort aan capaciteit. Inmiddels is de capaciteit uitgebreid. Gezien de veelomvattendheid van de opgave blijft dit een aandachtspunt. Daarnaast zijn de gevolgen voor de scope van het project vanuit het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) nog niet duidelijk. Vooral wat betreft de stikstofdoelstellingen en N2000 opgaven.		
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland, gemeente Wijdereen, Waternet/AGV, Natuurmonumenten, Vereniging Ster van Loosdrecht en aangesloten grondeigenaren		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: projecten Recreatieve routes (1.1) en Faunapassages (2.3).		

Resultaatbereik 2023

Beoogd resultaat 2023

- Er is voortgang geboekt met gesprekken met individuele grondeigenaren over de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).
- Er heeft afstemming plaatsgevonden met KRW-maatregelen en het N2000-beheerplan.

Bereikt resultaat 2023

- De uitwerking van het gebiedsaanbod is in 2023 voortgezet. Daarbij worden per grondeigenaar afspraken gemaakt over onder meer de te realiseren natuurdoelen en de bijbehorende vergoedingen. Deze afspraken worden uiteindelijk per grondeigenaar omgezet in een overeenkomst en ook notarieel vastgelegd.
- Met Waternet/AGV is de afstemming over de voorgenomen KRW-maatregelen voortgezet, onder andere over de plaatsing van een defosfateringsinstallatie.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning	-	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 300.000	€ 2.691.000	
Herzien projectbudget			€ 2.246.809	Projectbudget verlaagd t.b.v. dekking programmakosten en inhuur capaciteit.
Totaal besteed:	t/m 2022	€ 107.992	€ 107.992	
	in 2023	-	-	Budget OVP is bestemd voor de realisatiefase.
	Totaal	€ 107.992	€ 107.992	
Resterend budget		€ 192.008	€ 2.138.817	

Doorkijk 2024

Verwacht resultaat 2024

- Er vindt een (her)bevestiging plaats van de doelen van het project, inclusief eventuele aanvullende opgaven KRW, stikstof en N2000.
- Er is een akkoord gesloten met de vereniging Ster van Loosdrecht over een nieuw uitvoeringsprogramma (2024 en verder) en zo nodig is de bestaande overeenkomst tussen de vereniging en de provincie aangepast.
- Er is overeenstemming met de individuele leden van vereniging Ster van Loosdrecht bereikt.
- De opdrachtverlening en start van het ecologisch onderzoek op enkele percelen in het gebied heeft plaatsgevonden.

Risico's scope, planning, financiën

- Er treedt vertraging op door capaciteitstekort.
- Er bestaat onvoldoende draagvlak voor de plannen (bestuurlijk en/of politiek).
- Er wordt onvoldoende natuurontwikkeling bereikt.
- Uit aanvullend onderzoek komen milieutechnische risico's naar voren.
- Er vindt een wijziging in de opgave plaats door aanvullingen uit het Provinciaal Programma Landelijk Gebied en/of vanuit de Rijksoverheid.

Project 2.1 Natuurontwikkeling (NNN) Vuntus

Projecttrekker(s)	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 599.000 NB De voorbereidingskosten mbt de NNN-opgaven komen niet vanuit het OVP-budget.		
Fase project	Verkenning		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	10 april 2021		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) kan invloed hebben op de scope van het project. Dit geldt met name voor de stikstofdoelstellingen en N2000-opgaven. Daarnaast speelt enige vertraging door beperkte capaciteit. Er is prioriteit gegeven aan de uitwerking van de opgaven rondom het VONA-terrein. Er is een start gemaakt met het oppakken van de overige NNN-opgaven in het gebied.		
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland, gemeente Wijdmeren, Waternet/AGV, Natuurmonumenten, Vereniging de Weersloot		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhangt met: Recreatieve routes (1.1) en Fauna-passages (2.3).		

Resultaatbereik 2023

Beoogd resultaat 2023

- Er ligt een uitgewerkt voorstel voor twee ecologische verbindingen over het VONA-terrein.
- Er zijn scenario's uitgewerkt voor de wijze waarop met behulp van de menukaart 'ecologische meerwaarde' kan worden vastgelegd met tuineigenaren VONA.
- Er heeft een verkenning plaatsgevonden met de gemeente Wijdmeren over het vastleggen van NNN op gemeentelijke percelen.

Bereikt resultaat 2023

- Voor de ecologische verbindingen en de watergang ten oosten van het VONA-terrein is een inrichtingsschets opgesteld, die is afgestemd met de betrokken stakeholders. Deze vormt de basis voor vastlegging van afspraken met VONA, Waternet en Natuurmonumenten. Daarna kan een werkomschrijving worden opgesteld en kan het werk worden uitgevoerd.
- Voor de provinciale percelen in het oostelijk deelgebied van Vuntus is in samenspraak met de gebiedspartners een inrichtingsschets opgesteld, die als basis kan dienen voor een uitvoeringsstrategie.
- In 2023 is er minder bereikt dan vooraf gedacht. Dit komt met name door de beschikbare capaciteit (zowel intern als extern). Dit blijft een risico voor 2024.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 190.000	€ 599.000	
Herzien projectbudget			€ 573.149	Projectbudget verlaagd t.b.v. dekking programmakosten.
Totaal besteed:	t/m 2022	€ 130.520	€ 130.520	
	in 2023	-	-	Budget OVP is bestemd voor realisatiefase.
	Totaal	€ 130.520	€ 130.520	
Resterend budget		€ 59.480	€ 442.629	

Doorkijk 2024

Verwacht resultaat 2024

- Er heeft een bestuurlijke afweging plaatsgevonden over hoe om te gaan met tuineigenaren VONA over de toepassing van de menukaart 'ecologische meerwaarde'.
- De inrichting van twee ecologische verbindingen over het VONA-terrein heeft plaatsgevonden.
- De verkenningfase voor de overige delen van Vuntus is afgerond, inclusief een visie op de inrichting van het gebied en bijbehorende afstemming met stakeholders en grondeigenaren.
- Er is een uitvoeringsstrategie gemaakt voor de provinciale percelen in het oostelijk deelgebied van de Vuntus inclusief de aanpalende watergang (o.b.v. inrichtingsschets).

Risico's scope, planning, financiën

- Onvoldoende capaciteit (zowel intern als extern) blijft een risico voor 2024.
- De impact van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied is eveneens een risicofactor.

Project 2.1 Natuurontwikkeling (NNN) Het Hol

Projecttrekker(s)	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 900.000 NB De voorbereidingskosten mbt de NNN-opgaven komen niet vanuit het OVP-budget.		
Fase project	Planuitwerking		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	31 maart 2018		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	In Q4 2022 is de scope van het project bijgesteld. Een belangrijke verandering is om af te zien van een defosfateringsinstallatie. Daarnaast wordt de uitvoering van het herstel- en inrichtingsplan gesplitst in 2 onderdelen die volgtijdelijk worden uitgevoerd: • fase 1 baggeren en aanpassing watersysteem • fase 2 de natuurinrichting De projectleiding voor Fase 1 ligt bij Natuurmonumenten en die van fase 2 bij de provincie Noord-Holland. De stuurgroep heeft deze wijziging op 5 april 2023 vastgesteld. Het oorspronkelijke budget is niet voldoende. In 2023 is gezocht naar besparingen en aanvullende financiering. Voor fase 1 zijn er aan NM twee subsidies toegekend en een derde subsidie is binnen de begroting van de provincie Noord-Holland gereserveerd. Het waterschap AGV stelt voor fase 1 € 250.000 beschikbaar. Hiermee kunnen de werkzaamheden van fase 1 worden uitgevoerd. Het budget voor fase 2 wordt voor een deel aangevuld met een aangevraagde rijksbijdrage.		
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten, Waternet/AGV		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: Verbeteren waterkwaliteit (2.3) en Bestrijding exoten (2.5.3).		

Resultaatbereik 2023

Beoogd resultaat 2023

- De stuurgroep heeft een besluit genomen over aanpassing van de scope.
- Provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten en het Waternet/AGV hebben de afspraken vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst (SOK).

Bereikt resultaat 2023

- Er worden voorbereidingen getroffen voor het aanpassen van het watersysteem en baggerwerkzaamheden ten behoeve van de KRW-doelstelling. Hiervoor is het bestek opgesteld en de vergunning aangevraagd.
- De afspraken over nieuwe ontsluiting voor toekomstig beheer zijn vastgelegd.
- De herstart grondverwerving heeft plaatsgevonden.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Planuitwerking		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 900.000	€ 900.000	
Herzien projectbudget				
Totaal besteed:	t/m 2022	€ 416.237	€ 416.237	In 2023 geen kosten geboekt t.l.v. programma OVP.
	in 2023	-	-	
	Totaal	€ 416.237	€ 416.237	
Resterend budget		€ 483.763	€ 483.763	

Doorkijk 20224

Verwacht resultaat 2024

- De drie partijen hebben de samenwerkingsovereenkomst bestuurlijk vastgesteld.
- De uitvoering van fase 1 (aanpassen van het watersysteem) is gestart.
- Er zijn voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van fase 2 (natuurinrichting) en het opstellen van een inrichtingsplan.

Risico's scope, planning, financiën

- Het intensieve agrarisch gebruik uit het verleden beïnvloedt de natuurpotentie negatief, bijvoorbeeld door uitstroom van nutriënten.
- Er is uitloop in tijd doordat de bagger die in de tijdelijke depots wordt geplaatst, meer tijd nodig heeft om in te drogen. De inrichtingsmaatregelen van fase 2 starten hierdoor later dan gepland.

Project 2.2a Ecologische verbindingen - N201

Projecttrekker(s)	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 2.071.000		
Fase project	Planuitwerking		
Datum goedkeuring huidig PVA (SG/RG)	Dit project is voor 2017 gestart en gefinancierd, dus buiten het programma OVP om.		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	In 2021 heeft herijking van het project (faunamaatregelen, vervanging bruggen, onderhoud, en overige maatregelen) plaatsgevonden om de scope en integraliteit van de maatregelen helder te krijgen. Dit is vastgelegd in een projectwijziging en vastgesteld in het opdrachtenloket. Op basis van de herijking is ook de planning bijgesteld.		
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland, gemeente Wijdmeren, gemeente Hilversum, Regio Gooi en Vechtstreek, Waternet/AGV, gebieds-aannemer, ingenieursbureau, particuliere grondeigenaren en ondernemers		
Samenhang andere projecten	Het aanbrengen van de faunapassages valt onder een traject-benaderingsproject. Dit betekent dat de uitvoering van de faunapassages is gekoppeld aan onderhoudswerkzaamheden en het vervangen van twee bruggen van de N201. Er is bovendien samenhang met elk infra- en natuurontwikkelingsproject in het gebied, waaronder Het Hol, aanpassingen Zuwe en de aansluiting met het Utrechts deel van de N201.		

Resultaatbereik 2023

Beoogd resultaat 2023

- Er is een voorlopig ontwerp opgesteld door Arcadis.
- Er is een aanbestedingscontract opgesteld dat aansluit bij het gebiedscontract.

Bereikt resultaat 2023

De provincie is bezig met de verdere voorbereiding van het onderhouden van het wegvak, de vervanging van de bruggen en het vervangen van de eco-tunnels. Voor de faunapassages en de bruggen moet (nog) bekeken worden hoeveel (in rijrichting gezien) breder die worden gemaakt. Vervolgens wordt gezien of die extra breedte past binnen het bestaande vigerende bestemmingsplan.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Planuitwerking	-	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 2.071.000	€ 2.071.000	
Herzien projectbudget		-	-	
Totaal besteed:	t/m 2022	€ 190.193	€ 190.193	
	in 2023	-	-	
	Totaal	€ 190.193	€ 190.193	
Resterend budget		€ 1.880.807	€ 1.880.807	

Doorkijk 2024

Verwacht resultaat 2024

- Start planfase; in bouwteamverband met de gebiedsaannemer, het ingenieursbureau en de provincie is het project voorbereid op de uitvoering.
- Contractdocumenten zijn gereed, inclusief ontwerp.
- De mogelijkheden voor IFD bouwen en duurzaamheid zijn opgenomen in de scope.
- De uitvoeringsfase met de gebiedsaannemer, waaronder DO/UO is gestart.

Risico's scope, planning, financiën

Door vertraging vanwege diverse personeelsswisselingen bij het ingenieursbureau, een iets gewijzigde scope (hergebruik betonnen liggers A9), de locatie van een tweetal faunapassages die niet uitgevoerd kunnen worden door een te hoge waterstand en vanwege de aangescherpte stikstofwet alsmede de prijsstijgingen van het afgelopen jaar, start de realisatie pas in 2024 en vallen de kosten hoger uit. Eind 2023 worden de daadwerkelijke kosten bekend.

Project 2.2b Faunapassages

Projecttrekker(s)	Provincie Noord-Holland (directie B&U)		
Projectraming volgens UVP	€ 1.800.000 – na herziening 2022 € 1.742.384		
Fase project	Planuitwerking		
Datum goedkeuring huidig PVA (SG/RG)	Regiegroep: 10-02-2022 Stuurgroep: 30-03-2022		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Het schrijven van een heldere uitvraag bleek door toedoen van de verscheidenheid aan benodigdheden per locaties nogal lastig. Op de ene locatie is een voorlopig ontwerp voldoende om vervolgens een aannemer in een ander project de faunapassage als meekoppelkansen te laten meenemen. Terwijl voor een andere locatie een volledig definitief ontwerp gewenst is samen met aanbestedingsdocumenten. Hoeveel passages er in uitvoering kunnen en hoeveel er op welke manier straks moeten worden uitgewerkt, maakt het voor bureaus onduidelijk waar op in te schrijven. Na verschillende overleggen is er een uitvraag opgesteld met fase-verdeling, zodat deze onduidelijkheden verwerkt zijn.		
Betrokken partijen	Gemeente Wijdmeren, Regio G&V, Waternet/AGV, Natuurmonumenten, provincie Noord-Holland, particuliere grondeigenaren en ondernemers		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: vrijwel alle infrastructurele en natuurontwikkelingsprojecten in het gebied. We kijken waar mogelijkheden voor koppelkansen zijn.		

Resultaatbereik 2023

Beoogd resultaat 2023

- Er is een ecologisch adviesbureau ingeschakeld voor exactere uitwerking van faunapassages op vastgestelde locaties; dit levert een schetsontwerp per locatie op.
- Waar nodig zijn vervolgstappen genomen om te komen tot een voorlopig of definitief ontwerp.
- Er zijn met de gemeente Wijdmeren afspraken gemaakt over gepland onderhoud en daarbij te combineren faunapassages met als resultaat een planning met wie, wanneer, welke passage in uitvoering neemt.,

Bereikt resultaat 2023

- Het gereed maken van de uitvraag had meer tijd nodig dan verwacht. Na een informatiebijeenkomst met verschillende ingenieursbureaus is uiteindelijk een uitvraag opgesteld en in november binnen de raamovereenkomst uitgezet. De gunning vindt plaats op 12 februari 2024.
- De vervolgstap van voorlopig naar definitief ontwerp en de planning met de gemeente laten op zich wachten tot na de oplevering van de voorontwerpen door het ingenieursbureau.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Planvorming		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 166.500		
Herzien projectbudget			€ 1.742.384	Projectbudget is verlaagd t.b.v. dekking programmakosten.
Totaal besteed:	t/m 2022	€ 98.742	€ 98.742	Kosten uitvoering Gele Brug gemeente Wijdmeren.
	in 2023	-	-	
	Totaal	€ 98.742	€ 98.742	
Resterend budget		€ 67.758	€ 1.643.642	

Doorkijk 2024

Verwacht resultaat 2024

- Het ingenieursbureau heeft de voorontwerpen opgeleverd.
- Met samenwerkingspartners heeft prioritering van locaties plaatsgevonden.
- Er is met samenwerkingspartners een planning voor de aanleg gemaakt.
- Het ingenieursbureau heeft voor diverse locaties een vervolgoopdracht gekregen om tot een definitief ontwerp en aanbestedingsdocumenten te komen.

Verwacht resultaat na 2024

- Het ingenieursbureau heeft de definitieve ontwerpen opgeleverd.
- De beheerovereenkomst is vastgelegd.
- Er heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor de passages die niet in een ander project kunnen worden uitgevoerd.
- De uitvoering van de aanleg faunapassages is van start.

Risico's scope, planning, financiën

- Het projectbudget is ontoereikend, waardoor niet alle passages kunnen worden aangelegd. Hierdoor bereiken we een lagere ecologische waarde.
- Het benodigde beheer en onderhoud worden niet uitgevoerd met als gevolg een mindere functionaliteit.
- Er ontstaat weerstand vanuit de omgeving waardoor een intensiever participatieproces nodig is en de realisatie later van start gaat.

Project 2.3 Verbeteren waterkwaliteit

Projecttrekker(s)	Waterschap Amstel, Gooi en Vecht		
Projectraming volgens UVP	€ 4.350.000		
Fase project	Planuitwerking		
Datum goedkeuring huidig PVA (SG/RG)	12 december 2018		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Om de KRW-doelen voor het oppervlaktewater te halen is het noodzakelijk om in het OVP-gebied defosfateringsinstallaties (DFI) te bouwen om de concentraties van voedingsstoffen zoals fosfor sterk verlagen. De DFI's zijn onderdeel van het KRW-implementatieplan 2022-2027, het Stroomgebiedsbeheerplan III Regio Rijn-West en staan benoemd in het OVP Uitvoeringsprogramma "beperken fosfaatbelasting". De drie locaties zijn: 1. DFI Spiegelplas: water uit de Vecht en de Spiegelpolder wordt gezuiverd voor het de Spiegelplas in gaat. 2. DFI Kortenhoef: water uit de Horstermeerpolder en het achterland van de Ankeveense Plassen wordt gezuiverd voor het de Kortenhoefse Plassen in gaat. 3. DFI Weersloot & de Ster van Loosdrecht: water vanuit de Ster van Loosdrecht wordt geleid naar de Weersloot, waar het wordt gezuiverd voor het de Loosdrechtse Plassen en het Noorderpark in gaat.		
Betrokken partijen	Waternet/AGV, gemeente Wijdmeren, gemeente Hilversum, Natuurmonumenten, diverse bewonersverenigingen		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: Zwevend slib en waterplanten (1.7.2), Legakkerherstel in de Kievitsbuurten (1.8) en de projecten voor Natuurontwikkeling (2.1).		

Resultaatbereik 2023

Beoogd resultaat 2023

- Het bouwen van de defosfateringsinstallatie bij de Spiegelpolder en Kortenhoefse Plassen is gestart.
- Er wordt een besluit genomen over welke maatregel het meest doelmatig is om de fosfaatbelasting vanuit het Hilversums Kanaal naar Kortenhoef te verminderen.

Bereikt resultaat 2023

- Waterkwaliteitsmaatregelen gericht op het beperken van de fosfaatbelasting (bouwen van defosfateringsinstallaties) zitten nog in de planvormingsfase. Voor de drie locaties in het gebied is een besluit genomen over de zuiveringsmethode die toegepast gaat worden.
- Het besluit over welke maatregel het meest doelmatig is om de fosfaatbelasting vanuit het Hilversums Kanaal naar Kortenhoef te verminderen hangt af van enkele onderzoeken over nalevering van fosfaat uit de waterbodem.
- Waterkwaliteitsmaatregel 'herstel invloed kwelwater Het Hol en Suikerpot': het inrichtings- en herstelplan en de samenwerkingsovereenkomst voor Het Hol zijn gereed, de waterkwaliteitsmaatregel is in het plan opgenomen.

- Waterkwaliteitsmaatregel in Hollands Ankeveen 'omleiden waterstroom vanuit het achterland Hollands Ankeveense Plassen': de bouw van het gemaal dat hiervoor zorgt is afgerond. Het gemaal zorgt dat fosfaatrijk water niet meer in de plassen terechtkomt, maar naar een andere plek in de polder wordt afgevoerd.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Planuitwerking		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		-	€ 4.350.000	
Herzien projectbudget				
Totaal besteed:	t/m 2022	-	-	De uitvoering van de KRW maatregelen (in het uitvoeringsprogramma) ligt bij het Waternet/AGV. Het is daarom afgesproken de financiën bij Waternet/AGV te laten i.p.v. via de gezamenlijke rekening bij het groenfonds.
	in 2023	-	-	
	Totaal	-	-	
Resterend budget		-	€ 4.350.000	

Doorkijk 2024

Verwacht resultaat 2024

- Er is een besluit genomen over welke maatregel het meest doelmatig is om de fosfaatbelasting vanuit het Hilversums Kanaal naar Kortenhoef te verminderen.
- De planvormingsfase voor de drie defosfateringsinstallaties is afgerond.
- De werkzaamheden voor herstel van het kwelwater in Het Hol zijn gestart.
- In de Hollands Ankeveense Plassen is een gemaal geopend en in gebruik genomen.

Risico's scope, planning, financiën

De Kaderrichtlijn Water is een Europese Richtlijn die alle lidstaten moeten naleven. Op Europees en nationaal niveau zijn afspraken gemaakt over de invulling van de verplichtingen die uit deze richtlijn voortvloeien. Zo moeten in 2027 alle maatregelen genomen zijn om de wateren in 'goede toestand' te krijgen. De goede toestand voor oppervlaktewateren gaat zowel over een 'goede chemische toestand' als over een 'goede ecologische toestand'.

Project 2.4.3a Planuitwerking natuurmaatregelen voor moerasvogels

Projecttrekker(s)	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 2.600.000		
Fase project	Planuitwerking		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	28 juni 2023		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Op basis van uitvoerbaarheid, beheerbaarheid, risico's en de hoogste potentie voor moerasvogels zijn de gebieden Hollands Ankeveen, Kortenhoef West en de Loosdrechtse Plassen geselecteerd. De stuurgroep OVP heeft op 28 juni 2023 de keuze van maatregelen voor de moerasvogels voor deze drie deelgebieden bekrachtigd. Inrichtingsfase Ingenieursbureau RHDHV heeft de definitieve ontwerpen in een RAW-bestek uitgewerkt. Middels een aanbestedingsprocedure is de aannemer (voorlopig) gegund om het werk uit te voeren. Tevens zijn middels een aanbestedingsprocedure de directievoerder en toezichthouder (voorlopig) gegund die namens de opdrachtgever provincie Noord-Holland de aannemer controleert of het werk goed en volgens de geldende regelgeving wordt uitgevoerd. Vergunningen De gemeente Wijdmeren heeft de omgevingsvergunning verleend en Waternet/AGV de watervergunning. Realisatiefase De werkzaamheden zouden starten in het najaar 2023 en doorlopen tot het voorjaar van 2026. Er vinden geen werkzaamheden plaats tijdens het broedseizoen van de moerasvogels (15 april – 15 augustus). De realisatie is vertraagd omdat de onderhandelingen over de uitvoeringsovereenkomst tussen de provincie Noord-Holland en Natuurmonumenten nog lopen. Deze overeenkomst moet voor de start van de werkzaamheden zijn ondertekend.		
Betrokken partijen	Natuurmonumenten, provincie Noord-Holland, Waternet/AGV en de gemeente Wijdmeren		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: Baggeren en zwevend slib (1.7), Natuurontwikkeling (NNN, 2.1), Betere waterkwaliteit (2.3), Populatiebeheer voor ganzen (project 2.5.1), Noodmaatregelen tegen ganzenvraat ten behoeve van grote karekiet (project 2.5.2), Bestrijden van exoten (2.6).		

Resultaatbereik 2023

Beoogd resultaat 2023

- De omgevings- en watervergunning zijn verleend.
- Het RAW (Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw)-bestek is uitgewerkt.
- Er heeft gunning plaatsgevonden aan de aannemer, directievoerder en toezichthouder.
- De realisatie is najaar 2023 gestart.

Bereikt resultaat 2023

- De omgevings- en watervergunning zijn verleend.
- Het RAW-bestek is uitgewerkt.
- De aannemer, directievoerder en toezichthouder zijn voorlopig gegund.

Overige bijzonderheden

De uitvoeringsovereenkomst tussen de provincie Noord-Holland en Natuurmonumenten moet worden opgesteld en ondertekend vóór definitieve gunning aan aannemer, directievoerder en toezichthouder en aanvang realisatie. De onderhandelingen over onder andere het vastleggen van de verantwoordelijkheden van beide partijen lopen nog.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Planuitwerking		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 2.600.000	€ 2.600.000	
Herzien projectbudget		€ 2.401.804	€ 2.401.804	Projectbudget verlaagd t.b.v. dekking programmakosten en Quickscan Nieuwe Polderplas.
Totaal besteed:	t/m 2022	€ 534.290	€ 534.290	
	in 2023	€ 126.533	€ 126.533	
	Totaal	€ 660.823	€ 660.823	
Resterend budget		€ 1.740.981	€ 1.740.981	

Doorkijk 2024**Verwacht resultaat 2024**

- Er is een ondertekende uitvoeringsovereenkomst.
- De definitieve gunning aan aannemer, directievoerder en toezichthouder hebben plaatsgevonden.
- De realisatie van de maatregelen moerasvogels start in najaar 2024 en duurt tot 2026.
- De beheerinspanning (incl. kosten) is opgesteld, aanvullend op regulier natuur- en landschapsbeheer voor de nieuw gerealiseerde natuurbeheertypen (veenmoeras en vochtig hellinghakhout) tot 3 jaar na inrichting.
- Er is een beheerplan (incl. kosten) opgesteld om bestaande en nieuw geplaatste ganzenrasters te beheren en onderhouden, herstellen, verplaatsen en verwijderen voor 10-12 jaar na realisatie.

Risico's scope, planning, financiën

- De provincie Noord-Holland en Natuurmonumenten bereiken geen overeenstemming over de uitvoeringsovereenkomst.
- Door vertraging kunnen de aannemer, directievoerder en toezichthouder de werkzaamheden niet meer uitvoeren voor de prijs in hun offerte (juni 2023). Hierdoor stijgen de realisatiekosten met circa 10%. Deze verhoging past binnen het projectbudget.
- Terreinomstandigheden zijn dusdanig slecht (slechte draagkracht, te natte bodem) dat aanvullende maatregelen en financiën nodig zijn om het werk te kunnen realiseren.
- De verwachting is dat in 2024 geen uitgaven worden gedaan vanuit het uitvoeringsprogramma. Eerst wordt de € 2,9 mln (incl. BTW) vanuit de Regeling specifieke uitkering Uitvoeringsprogramma Natuur (SPUK) aangesproken. De realisatie dient uiterlijk 15 maart 2026 te worden afgerond. Lukt dat niet, dan komt mogelijk € 2,9 mln (incl. BTW) aan subsidie te vervallen.

Project 2.4.3b Realiseren natuurnetwerk Nederland (NNN) - Quickscan Nieuwe Polderplas

Projecttrekker(s)	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 0		
Fase project	Verkenning		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	19 februari 2024		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Een combinatie met toepassing van bagger in de Nieuwe Polderplas blijkt financieel niet haalbaar vanwege onder andere de hoge eisen aan waterkwaliteit. Voor het baggeren van de havens biedt dit wellicht nog wel een mogelijkheid als locatie voor baggerdepots. De kosten zijn echter aanzienlijk en overschrijden het budget van OVP. Onderzocht worden de recreatieve kansen van de plas.		
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland, gemeente Wijdmeren, Waternet/AGV, Tjhuis Ingenieurs, bewonersorganisaties		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: Baggeren zwevend slib (1.7), Maatregelen voor moerasvogels op privaat eigendom (2.4), Recreatieve verbindingen (1.1) en Icoon van Loosdrecht (1.6).		

Resultaatbereik 2023

Beoogd resultaat 2023

Er bestaat duidelijkheid over de Nieuwe Polderplas en hoe deze kan bijdragen aan het realiseren van de doelen van het OVP.

Bereikt resultaat 2023

In 2023 is een casus uitgewerkt voor een onderwatertoepassing, die kansen voor natuur biedt. Een project is technisch haalbaar, maar stuit op hoge kosten onder andere t.b.v. waterkwaliteit. Omdat de druk op het realiseren van depots groot is, vooral vanuit de recreatiesector en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is het verstandig de Nieuwe Polderplas als optie open te houden. Een combinatie met herstel van legakkers kan nog steeds gekoppeld blijven aan initiatieven voor (onderwater) depots. Er zijn wel kansen voor koppelingen met bagger maar deze zijn (zeer) kostbaar. Voor recreatie kan ook gezocht worden naar initiatieven zonder toepassing van bagger en ook niet in combinatie met het project Maatregelen voor moerasvogels.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		-	-	
Herzien projectbudget		€ 62.000	€ 62.000	€ 31.000 budget uit project baggeren + € 31.000 budget uit project Moerasvogels.
Totaal besteed:	t/m 2022	€ 23.800	€ 23.800	Excl. aanschafkosten van € 648.000
	in 2023	-	-	
	Totaal	€ 23.800	€ 23.800	
Resterend budget		€ 38.200	€ 38.200	

Doorkijk 2024

Verwacht resultaat 2024

Het project verdient een nadere blik door een aan te stellen projectleider die de recreatieve mogelijkheden verkend. Dit in relatie tot de ateliers in 2019, de initiatieven voor fort Spion van Waternet en de ambitie van de provincie Noord-Holland op het gebied van recreatie en de waterlinie. Dit in afstemming met het project Baggeren en zwevend slib waarin gezocht wordt naar locaties voor baggerdepots. Als een hernieuwde verkenning is uitgevoerd, kan een besluit genomen worden over de Nieuwe Polderplas.

Risico's scope, planning, financiën

- Het ontbreekt aan draagvlak voor een herinrichting.
- Er is geen budget binnen het programma OVP voor de uitvoering van een initiatief. Dit budget moet via andere bronnen worden verkregen.

Project 2.5.2 (Nood)maatregelen ganzenvraat

Projecttrekker(s)	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 50.000		
Fase project	Realisatie		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)			
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Jaarlijks wordt de eventuele schade aan de rasters gerepareerd en een deel van de nylon netten vervangen door gaas als verbetermaatregel. Het huidige onderhoudscontract loopt tot eind 2024.		
Betrokken partijen	Natuurmonumenten		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: Maatregelen voor moerasvogels (2.4.3).		

Resultaatbereik 2023

Beoogd resultaat 2023

Begin 2022 is een nieuw onderhoudscontract afgesloten voor een periode van 3 jaar om de bestaande ganzenrasters te onderhouden.

Progressie op hoofdlijnen in 2022

In 2023 is de schade aan de rasters gerepareerd en een deel van de nylon netten vervangen door gaas dat veel robuuster is. Dit gebeurt met name op de meest kwetsbare locaties die regelmatig beschadigd worden.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Realisatie		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 50.000	€ 50.000	
Herzien projectbudget		€ 137.000	€ 137.000	Budget is opgehoogd ten behoeve van monitoring en onderhoud van de rasters. Dit budget is afkomstig van 2.5.1 Populatiebeheer ganzen.
Totaal besteed:	t/m 2022	€ 95.804	€ 95.804	Kosten onderhoud
	in 2023	€ 18.419	€ 18.419	Kosten worden gedekt uit het budget van 2.5.1 Populatiebeheer ganzen.
	Totaal	€ 114.223	€ 114.223	
Resterend budget		€ 22.777	€ 22.777	

Doorkijk 2024

Verwacht resultaat 2024

Onderhoud, reparatie en vervanging van ganzenrasters zijn begroot op € 16.242. Inmiddels worden deze maatregelen uitgevoerd binnen project 2.5.1 Populatiebeheer ganzen.

Risico's scope, planning, financiën

Het huidige onderhoudscontract loopt tot eind 2024. Voorjaar 2024 vindt de laatste onderhoudsronde plaats, met wellicht nog een aparte onderhoudsronde eind 2024. Effectiever is het om pas aan het einde van de winter of in het vroege voorjaar de aparte onderhoudsronde uit te voeren. Het is een optie om het huidige onderhoudscontract hiervoor met 4 maanden te verlengen.

Project 2.5.3 Bestrijding exoten

Projecttrekker(s)	Provincie Noord-Holland, gemeente Wijdmeren, Natuurmonumenten, Vereniging Samen Cabomba Aanpakken (VSCA), Waternet/AGV, Watersportverbond/HISWA-RECRON, Plassenschap Loosdrecht		
Projectraming volgens UVP	€ 1.000.000		
Fase project	Planuitwerking		
Datum goedkeuring huidig PVA (SG/RG)	30 maart 2022		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Na de evaluatie van het oorspronkelijke plan van aanpak is besloten de koers te wijzigen en in te zetten op structureel en toekomstgericht beheer en het tegengaan van overlast, met een daarbij behorend structureel beheerbudget. Er is een nieuw plan van aanpak gemaakt en er is nagedacht over een beheerplan. Dit laatste laat echter op zich wachten, onder andere omdat het investeren en het doen van voorstellen voor functies en zonering meer tijd vragen.		
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland, gemeente Wijdmeren, Plassenschap Loosdrecht e.o., Waternet/AGV, Natuurmonumenten, Watersportverbond, HISWA-RECRON en VSCA		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: Baggeren zwevend slib (1.7) en Maatregelen voor moerasvogels (2.4).		

Resultaatbereik 2023

Beoogd resultaat 2023

Er is een structureel en toekomstgericht beheerplan voor de aanpak van overlastgevende waterplanten, met een daarbij behorend structureel beheerbudget. Het beheerplan bevat naast maatregelen voor het bestrijden van cabomba en ongelijkbladig vederkruid ook maatregelen voor soorten als grof hoornblad, waterpest, aarvederkruid of fonteinkruid.

Bereikt resultaat 2023

- Het beheerplan is nog niet afgerond.
- De pilot in Het Hol (waarbij Het Hol met rasters werd afgesloten van het Moleneind) is afgerond en geëvalueerd. Deze rasters houden cabomba tegen terwijl de vissen er onderdoor kunnen zwemmen.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Planuitwerking	-	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 500.000	€ 500.000	Voor € 500.000 was geen dekking binnen het gebiedsakkoord.
Herzien projectbudget				
Totaal besteed:	t/m 2022	€ 387.323	€ 387.323	
	t/m 2023	-	-	
	Totaal	€ 387.323	€ 387.323	
TResterend budget		€ 112.677	€ 112.677	

Doorkijk 2024

Verwacht resultaat 2024

Er is een goedgekeurd beheerplan Overlastgevende Waterplanten met afspraken over de wijze van beheer, de organisatie van (de samenwerking van) dit beheer en de inzet van eenmalige en structurele middelen van de betrokken partijen.

Risico's scope, planning, financiën

Het komen tot een beheerplan is een zoektocht, met name vanwege de onzekerheid over de financiering. De afspraken over het beheer moeten verder gaan dan 2027.

7

Transformatie recreatiesector



Project 3.1 Gebiedsloods

Projecttrekker(s)	Gemeente Wijdmeren		
Projectraming volgens UVP	€ 320.000		
Fase project	Realisatie		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	18 juli 2018 en 3 februari 2022		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Sinds medio 2021 wordt de huidige, verbrede scope gehanteerd. Daarbij ondersteunt de gebiedsloods ondernemers niet alleen bij het opstellen van bedrijfsplannen, maar wordt ook getracht ondernemers te verbinden met bedrijfsconcepten die elders goede resultaten laten zien. Ook stimuleert de gebiedsloods ontwikkelingen die de beeldkwaliteit in het gebied kunnen verbeteren, die langer verblijf van bezoekers bevorderen en meer inzicht geven in de geldende juridische kaders. Oorspronkelijk uitgangspunt was de gebiedsloods 4 jaar in te zetten. De verbrede scope was aanleiding om de inzet van de gebiedsloods te verlengen. Wegens gebrek aan resultaat en financiële middelen is besloten om in 2023 te stoppen met de gebiedsloods. De laatste afrondende werkzaamheden van de gebiedsloods bestonden uit het ondersteunen van De Gouden Greep en een ruimtelijk traject bij Jachthaven De Wijde Blick.		
Betrokken partijen	Transitieteam OVP, gemeente Wijdmeren, gemeente Stichtse Vecht, provincie Noord-Holland, provincie Utrecht, ondernemers recreatiesector, HISWA-RECRON, Waternet/AGV, Natuurmonumenten, Plassenschap Loosdrecht e.o.		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: Transitieteam recreatie en toerisme (3.2), Integreren recreatie en natuur (3.3), Waterrecreatie 's Graveland en Kortenhoef (1.2), Alternatieve projecten waterrecreatie (1.3), Nieuwe Polderplas (2.4.3), Maatregelen voor moerasvogels (2.4) en Icoon van Loosdrecht (1.6).		

Resultaatbereik 2023

Verwacht resultaat 2023

De gebiedsloods heeft de lopende trajecten afgerond of zodanig uitgewerkt dat deze zelfstandig of met ondersteuning van anderen verder kunnen.

Bereikt resultaat 2023

Na het afronden van de twee lopende trajecten zijn de werkzaamheden van de gebiedsloods beëindigd.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Realisatie		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 320.000	€ 320.000	
Herzien projectbudget		€ 412.000	€ 412.000	Begin 2022 is extra budget toegekend van € 112.000, waarmee het totaal-budget uitkomt op € 432.000. Echter € 20.000 uit de NERA investering vloeit terug naar dit project.
Totaal besteed:	t/m 2022	€ 376.719	€ 376.719	
	in 2023	€ 12.578	€ 12.578	
	Totaal	€ 389.297	€ 389.297	
Resterend budget		€ 22.703	€ 22.703	

Doorkijk 2024

Beoogd resultaat 2024

- Er is geen budget voor een gebiedsloots
- Het transitieteam organiseert een bijeenkomst voor ondernemers waarin deze worden bijgepraat over de ontwikkelingen binnen het programma OVP en aan de hand van het rapport Toekomstbeeld 2030 worden geïnspireerd samen ideeën te ontwikkelen die bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het plasseengebied.
- Een mogelijk in te stellen recreatiefonds moet ondernemers stimuleren ideeën te ontwikkelen waarvoor zij een bijdrage in de kosten kunnen aanvragen.

Risico's scope, planning, financiën

- Er is geen uitvoeringsbudget voor recreatie en toerisme. Dit remt innovatie, kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte en kansrijke initiatieven die het recreatief aanbod en het recreatief seizoen verbreden.
- Het ontbreekt aan een duidelijke visie op Recreatie en Toerisme, die kan bijdragen aan de beoogde transitie van de recreatie en een samenhang in activiteiten kan bevorderen. Het is wenselijk dat een dergelijke visie ook geborgd wordt in toetsingskaders en plannen van de bevoegde gezagen. Daarmee wordt tevens bevorderd dat initiatiefnemers de haalbaarheid van ideeën aan de voorkant beter kunnen inschatten.

Project 3.2a Transitieteam recreatie en toerisme

Projecttrekker(s)	Gemeente Wijdmeren		
Projectraming volgens UVP	€ 50.000		
Fase project	Realisatie		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	18 juli 2018		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Sinds medio 2021 wordt de huidige, verbrede, scope gehanteerd. Daarbij wordt niet alleen ingezet op ontwikkeling van binnenuit, maar wordt ook getracht ondernemers te verbinden met bedrijfsconcepten die elders goede resultaten laten zien. Ook wordt ingezet op de ontwikkeling van de beeldkwaliteit, op mogelijkheden die langer verblijf in het gebied door bezoekers bevorderen ten gunste van de vakantiemarkt en op beter inzicht in de geldende juridische kaders. In de oorspronkelijke scope had het transitieteam de taak vergunningaanvragen van initiatiefnemers verder te brengen binnen de afzonderlijke overheden die zitting hebben in het transitieteam. Het transitieteam heeft geen uitvoeringsbudget (meer) voor het ondersteunen, verder brengen of uitvoeren van acties die de transformatie tot stand kunnen brengen of bevorderen. De realiteit is dat het op dit moment veelal blijft bij plannen en wensen en dat er veel tijd, energie en creativiteit gaat zitten in het vinden van middelen.		
Betrokken partijen	Transitieteam recreatie en toerisme, gemeente Wijdmeren, gemeente Stichtse Vecht, provincie Noord-Holland, provincie Utrecht, Waternet/AGV, Natuurmonumenten, recreatieondernemers, HISWA-RECRON, Regio Gooi en Vechtstreek, Plassenschap Loosdrecht e.o.		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: Integreren recreatie en natuur (3.3), Recreatieve verbindingen (1.1), Vergroten aanbod waterrecreatie 's Graveland en Kortenhoef (1.2), Alternatieven waterrecreatie (1.3), Icoon van Loosdrecht (1.6), Baggeren en zwevend slib (1.7), Herstel legakkerlandschap Kievitsbuurten (1.8), Nieuwe Polderplas (2.4.3), Onderzoek ontsluiting en toegankelijkheid (1.4) en Van dorpslint naar recreatieboulevard (1.5), Verkenning investeringsfonds (3.4) en Projectleider transformatie (3.1).		

Resultaatbereik 2023

De gebiedsloots heeft in 2023 de lopende projecten afgerond.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Realisatie		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 50.000	€ 50.000	
Herzien projectbudget		€ 159.439	€ 159.439	Geen herziening in 2023 Restant budget van project 3.3 van € 26.500 is overgeheveld t.b.v. Aanpak recreatie 2030. Budget van project 3.4 is toegevoegd aan het budget voor dit project, omdat dit project vanuit het transitieteam is opgepakt. € 5.000 van project 3.4 is overgeheveld naar capaciteit. In 2022 is een extra budget van € 38.000 toegekend. Van dit budget is het bedrag dat eind 2021 nog over was, € 29.440, expliciet beschikbaar gesteld voor project 3.4 verkenning BIZ/ investeringsfonds.
Totaal besteed:	t/m 2022	€ 123.260	€ 123.260	
	in 2023	-	-	
	Totaal	€ 123.260	€ 123.260	
Resterend budget		€ 36.179	€ 36.179	Van dit bedrag is € 24.440 expliciet bestemd voor de verkenning BIZ / Investeringsfonds. Van dit bedrag is € 11.739 bestemd voor het transitieteam.

Doorkijk 2024

De verwachtingen voor 2024 zijn beperkt; onder andere vanwege het gebrek aan budget en capaciteit.

Risico's scope, planning, financiën

- Er is geen uitvoeringsbudget voor recreatie en toerisme. Dat werkt remmend op de innovatie en kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte en op veelbelovende initiatieven die recreatief aanbod en het recreatief seizoen verbreden.
- Het ontbreekt aan een ontwikkelkader en een integrale visie op recreatie en toerisme remt de transitie.
- Regimes en regelgeving leggen beperkingen aan ontwikkelingen op. Met name natuurregelgeving brengt dergelijke restricties met zich mee.
- Het ontbreekt aan ruimte voor best practices om te laten zien dat het mogelijk is. Verblijfsrecreatie in de natuur ter verbetering van de omliggende natuurwaarden kan hieraan bijdragen.

Project 3.2b Toekomstbeeld recreatie 2030

Projecttrekker(s)	Provincie Utrecht		
Projectraming volgens UVP			
Fase project	Planuitwerking		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)			
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Het Toekomstbeeld Recreatie 2030 zou moeten worden uitgewerkt in een actieplan. Er is overleg hierover geweest met vertegenwoordigers van de recreatiesector, om een bijeenkomst met de hele sector te organiseren, teneinde te komen tot een actieplan.		
Betrokken partijen	Provincie Utrecht, provincie Noord-Holland, gemeente Wijdemeren, gemeente Stichtse Vecht, recreatiesector, Natuurmonumenten, Waternet-AGV, Plassenschap Loosdrecht		
Samenhang andere projecten	Het project hing samen met de activiteiten van de gebiedsloods en het Transitieteam OVP.		

Resultaatbereik 2023

Beoogd resultaat 2023

Er is een actieplan/Uitvoeringsagenda op basis van Toekomstbeeld Recreatie 2030 opgesteld.

Bereikt resultaat 2023

Er is geen voortgang geboekt in 2023 vanwege het ontbreken van een projectleider

Doorkijk 2024

Er moet duidelijkheid komen of en in welke vorm dit project vervolg krijgt binnen het OVP.

Project 3.4 Verkenning investeringsfonds

Projecttrekker(s)	Transitieteam OVP / Gemeente Wijdmeren		
Projectraming volgens UVP	€ 60.000		
Fase project	Verkenning		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	04 oktober 2021		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Een BIZ blijkt geen passend instrument voor het gebied Oostelijke Vechtplassen. Daarom heeft de stuurgroep OVP in 2021 besloten de scope van het project te verleggen naar een verkenning van een investeringsfonds. Daarna is de scope niet meer gewijzigd. Een investeringsfonds moet bijdragen aan een breed en aantrekkelijk recreatief aanbod en aan het verbeteren en ontwikkelen van een vrijetijdslandschap. Een eerste verkenning is uitgevoerd en vastgelegd in een rapport. Verdere verdieping van de verkenning is nodig, maar de voortgang daarvan hangt samen met ontwikkelingen aangaande de betrokkenheid van ondernemers bij besteding van toeristenbelasting in Wijdmeren. Deze ontwikkelingen zijn nog niet uitgekristalliseerd. In het gebiedsakkoord is bepaald dat de toeristenbelasting expliciet betrokken wordt bij de verkenning.		
Betrokken partijen	Transitieteam, recreatieondernemers, HISWA-RECRON, gemeente Wijdmeren, gemeente Stichtse Vecht, provincie Noord-Holland, provincie Utrecht, Natuurmonumenten, Waternet/AGV, Plassenschap Loosdrecht e.o.		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: Transitieteam recreatie en toerisme (3.2) en Gebiedsloods (3.1), Recreatieve verbindingen (1.1), Vergroten aanbod waterrecreatie 's-Graveland en Kortenhoef (1.2), Alternatieven waterrecreatie (1.3), van dorpslint naar recreatieboulevard / duurzame ontwikkeling Scheendijk (1.5), Icoon van Loosdrecht (1.6), baggeren (1.7), Zorg voor legakkerlandschap (1.8) en de Nieuwe Polderplas (project 2.4.3).		

Resultaatbereik 2023

Er is in 2023 geen voortgang geboekt in afwachting op de ontwikkelingen rondom de toeristenbelasting in Wijdmeren.

Overige bijzonderheden

De verkenning is uitgevoerd door de voorzitter van het transitieteam. Daarom zijn de budgetten voor dit project overgeheveld naar het transitieteam.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		-	-	
Herzien projectbudget		-	-	Budgetten zijn overgeheveld naar project 3.2.
Totaal besteed:	t/m 2021	-	-	Kosten via project 3.2. uitgaven door provincie Noord-Holland.
	in 2022	-	-	Kosten via project 3.2. uitgaven door gemeente Wijdmeren.
	Totaal	-	-	
Resterend budget		-	-	

Risico's scope, planning, financiën

- Het project betreft een verkenning. Daadwerkelijke realisatie van het fonds valt buiten de reikwijdte van het project en moeten betrokken partijen oppakken, inclusief het vinden van middelen voor realisatie.
- Een investeringsfonds kan via verschillende bronnen worden gevuld. Bijvoorbeeld via een bijdrage uit toeristenbelasting, maar ook via bijdragen vanuit het bedrijfsleven of de maatschappij. De uitkomsten van de verkenning worden dan ook beïnvloed door draagvlak bij marktpartijen en betrokkenheid van de omgeving. Ook het bestuur van het fonds en werkzaamheden die vanuit het fonds worden opgepakt staan of vallen met dit draagvlak en deze betrokkenheid.

8

Organisatiekosten



Projecttrekker(s)	Gemeente Wijdmeren, provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	Er is geen raming opgenomen in het uitvoeringsprogramma. Communicatie OVP-breed Capaciteit totaal € 800.000 • € 300.000 (eerder beschikbaar gesteld) • € 500.000 (herziening programma 2022) Communicatiemiddelen totaal € 418.000 • € 100.000 (eerder beschikbaar gesteld) • € 318.000 (herziening programma 2022) Extra capaciteit gemeente Wijdmeren totaal € 380.000 • € 380.000 (herziening programma 2022) Bureaunkosten totaal € 587.000 • € 180.000 (eerder beschikbaar gesteld) • € 407.000 (herziening programma 2022)		
Fase project	Projectoverstijgend		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	• Besluit stuurgroep over communicatie en capaciteit: 20 november 2019 (notitie) en 30 juni 2021 (intakeformulier). • Besluit stuurgroep over middelen en capaciteit communicatie via voorstel herziening organisatie en inhoud gebiedsakkoord: 3 februari 2022.		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Begin 2022 zijn voorstellen gedaan voor het structureel inregelen van de dekking van de bureaunkosten en programmacommunicatie (ten behoeve van zowel de capaciteit als de communicatiemiddelen). Hiervoor zijn middelen ter beschikking gesteld.		
Betrokken partijen	Partners binnen het programma OVP		
Samenhang andere projecten	Bij de herziening van het programma is dekking verkregen voor de bureau- en communicatiekosten door van de projecten 3,5% af te romen. De eerdere dekking voor budget communicatie komt uit verschuivingen van budgetten voor de vervallen vaarverbindingen (1.2 en 1.3) en Natuurontwikkeling (2.1). De dekking voor de extra capaciteit gemeente Wijdmeren komt m.n. uit het budget voor recreatieve verbindingen (1.1) t.b.v. inhuur van een projectleider voor het project Horstermeer Zuid waarvan geen van de partijen trekker was en uit verschuivingen van budgetten voor de vaarverbindingen (1.2 en 1.3), Natuurontwikkeling (2.1), Ontsluiting en toegankelijkheid (1.4) en Van dorpslint tot recreatieboulevard (1.5).		

Resultaatbereik

Gewenst resultaat 2023

Op gebied van communicatie en bureaunkosten:

- Er zijn 49 nieuwsberichten gepubliceerd.
- Er zijn 6 reguliere nieuwsbrieven verzonden.
- Er zijn programmabrede bijeenkomsten georganiseerd: de jaarlijkse inloopmarkt en voor de tweede keer de film 'Nederland onder water' op een groot scherm bij strandpaviljoen De Strook.
- Er is een tweedaagse MGA-training georganiseerd.

Voor wat betreft capaciteit Wijdemeren: de capaciteit is ingezet conform afspraken (t.b.v. NNN, recreatie en Horstermeer Zuid).

Bereikt resultaat 2023

- De programma-brede bijeenkomsten (informatiemarkt en filmavond) hebben plaatsgevonden.
- Er zijn 49 nieuwsberichten geplaatst.
- Er zijn 6 nieuwsbrieven verstuurd.

Projectcijfers per fase

		Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Projectoverstijgend (geen fases)	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		Communicatie capaciteit € 300.000 Communicatie middelen € 100.000 Capaciteit WDM € 380.000 Bureaunkosten € 180.000	
Herzien projectbudget		Communicatie Capaciteit € 800.000 Communicatie Middelen € 418.000 Capaciteit WDM € 380.000 Bureaunkosten € 587.000	In februari 2022 heeft de stuurgroep besloten extra middelen beschikbaar te stellen: - inhuur communicatie manager € 500.000; - communicatiemiddelen € 318.000 voor 6 jaar; - bureaunkosten € 407.000 voor 6 jaar. Van de € 407.000 was een deel niet gedekt, deze dekking is terug naar betreffende projecten.
Totaal besteed:	t/m 2022	Communicatie capaciteit € 293.390 Communicatie middelen € 54.590 Capaciteit WDM € 320.156 Bureaunkosten € 248.260	
	in 2023	Communicatie capaciteit € 102.503 Communicatie middelen € 18.101 Capaciteit WDM € 29.400 Bureaunkosten € 30.534	
	Totaal	Communicatie capaciteit € 395.893 Communicatie middelen € 72.691 Capaciteit WDM € 349.556 Bureaunkosten € 278.794	
Resterend budget		Communicatie capaciteit € 404.107 Communicatie middelen € 345.309 Capaciteit WDM € 30.444 Bureaunkosten € 280.471	

Doorkijk 2024

- De communicatiewerkgroep zet onder voorzitterschap van de communicatiemanager OVP de ingezette werkwijze verder voort met de jaarkalender als planningsinstrument.
- Een mogelijke scopewijziging vraagt om een update van de communicatiestrategie.
- In oktober 2024 vindt de vierde jaarlijkse informatiemarkt plaats voor omwonenden en andere belangstellenden.
- Er vindt een training plaats over de Mutual Gains Approach voor de leden van de regiegroep.

COLOFON

De voortgangsrapportage is een jaarlijks terugkerende uitgave verzorgd door het programmabureau Oostelijke Vechtplassen in nauwe samenwerking met de diverse projecttrekkers. De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen heeft dit rapport op 10 april 2024 vastgesteld.

Aanpak Oostelijke Vechtplassen

p/a secretariaat OVP
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

T: 023-5143098

E: secretariaat_OVP@noord-holland.nl

Partners:

provincie Noord-Holland | provincie Utrecht |
gemeente Wijdmeren | gemeente Stichtse Vecht |
gemeente Hilversum | Waternet | Waterschap Amstel,
Gooi en Vecht | Plassenschap Loosdrecht e.o. |
Regio Gooi en Vechtstreek | Natuurmonumenten |
LTO Noord | HISWA-Recron | Koninklijk Nederlands
Watersportverbond | Verenigde bedrijven Boomhoek |
Vechtplassencommissie | Platform Recreatie en Toerisme
Wijdmeren | Toeristische Kano Bond Nederland |
Vereniging Kievitsbuurten | ANWB | Bewonersfederatie OVP

Vormgeving:

Pier 19 Grafisch ontwerpers

Fotografie:

@eenkwestievanfotografie: 1, 11, 14, 15, 18, 21, 40

vdmarel.com: 6, 9, 69

Programmabureau OVP: 10, 77

Provincie Noord-Holland: 3, 6

Kees Joustra/Natuurmonumenten: 2
