


Voortgangsrapportage Oostelijke vechtplassen 2024



Inhoudsopgave



Voorwoord



We weten elkaar te vinden en helpen elkaar waar dat nodig is

Laat ik beginnen met het uitspreken van mijn waardering voor iedereen die zich inzet voor het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen (OVP). De betrokkenheid van alle partijen is groot. We weten elkaar steeds beter te vinden en helpen elkaar waar dat nodig is. Dat leidt tot resultaat. Na de eerste jaren waarin vooral veel aandacht ging naar verkenning en onderzoek, komen nu meer projecten in de uitvoeringsfase. Dat geeft energie. En smaakt naar meer.

De bij aanvang van het programma geïntroduceerde Mutual Gains Approach, waarbij het begrip consensus centraal staat, passen we in de praktijk meer en meer toe. In plaats van energie te steken in het bij elkaar brengen van niet te verzoenen standpunten, proberen we begrip te creëren voor elkaars belangen. Dat leidt regelmatig tot betere ideeën en oplossingen, die bovendien langer standhouden. Maar ook een praktische en op resultaat gerichte manier van samenwerken helpt ons verder.

Tegelijkertijd moeten we erkennen dat we niet alle opgaven op het gebied van natuur, waterkwaliteit en recreatie gaan halen binnen de resterende 3 jaar van het programma. De doelen bij aanvang van het programma in 2017 waren ambitieus, en zijn dat nog steeds, maar we moeten ook realistisch blijven. Een kritische omgeving en een kabinet dat een nieuwe koers heeft ingeslagen, vragen van ons de nodige flexibiliteit én daardoor ook tijd. Van belang is echter dat elke partij haar eigen verantwoordelijkheid neemt en dat we samen optrekken. De meerwaarde van samenwerking erkent iedereen. Daarom denken we nu al na hoe we deze na afloop van het programma vorm willen geven.

De ontwikkelingen op landelijk niveau dwingen ons echter nu al tot het maken van keuzes. In 2024 schrapte het kabinet het Transitiefonds Landelijk Gebied en Natuur (het stikstoffonds) en het Nationaal Programma Landelijk gebied, waardoor provincies zich moeten beraden op de gebiedsprocessen. Wat dit betekent voor deze processen in het Vechtplassengebied wordt in 2025 duidelijk.

De projecten binnen het OVP gaan ondertussen onverminderd door. Zo werd het baggeren van de 1e tot en met 5e plas in 2024 afgerond, al moet het baggerdepot nog indrogen. Samen met de recreatiesector werken we aan plannen voor het

baggeren van de havens. De subsidieregeling voor de havens in het Vechtplassengebied wordt in 2025 opengesteld. Ook denken we na over het beheer van de plassen vanaf 2028, zodat we deze ook in de toekomst bevaarbaar houden.

De gebiedsprocessen voor natuurontwikkeling in Kortenhoef Oost en West, Ankeveen, Ster van Loosdrecht, de Vuntus en Weersloot gingen verder, waarbij veel overleg met de belanghebbenden plaatsvond. In natuurgebied het Hol begonnen we in het najaar met het baggeren en het op orde brengen van het watersysteem. Vanaf 2026 gaan we daar ook aan de slag met het herstellen van natuur en het ontwikkelen van nieuwe natuur.

Eind 2024 maakten we een start met maatregelen voor betere omstandigheden voor moerasvogels in Hollands-Ankeveen en Kortenhoef West. We herstellen open landschap door bomen weg te halen en zorgen voor gezonde rietoevers en waterrietkragen. Daarnaast troffen we voorbereidingen voor maatregelen voor moerasvogels in het Vechtplassengebied, die begin 2025 beginnen.

Bewoners en andere belangstellenden kregen in de zomer de mogelijkheid te reageren op de ontwerpen van 14 faunapassages. Daarna hebben de partners gewerkt aan een prioriteitenlijst omdat er onvoldoende budget is om alle 14 faunapassages te realiseren. Het streven is in 2025 de eerste faunapassage aan te leggen.

Alhoewel we onze handen behoorlijk vol hebben om alle projecten tot een goed einde te brengen, kwamen er ook twee nieuwe projecten bij. De stuurgroep stemde hiermee in omdat deze projecten bijdragen aan het realiseren van de programmadoelstellingen. De stuurgroep stelde geld beschikbaar voor het opknappen van de vaarverbinding De Heul in Loosdrecht en reserveerde geld voor de Kwaliteitsimpuls Wijde Blik. Dit geld is afkomstig vanuit het resterend budget van 2 niet-realiseerbare projecten voor de (water)recreatie. Een adviesbureau brengt in kaart hoe dit resterend budget ten goede kan komen aan (water)recreatie. Begin 2025 presenteert dit bureau de eerste bevindingen.

De lijst met projecten in uitvoering groeit de komende jaren verder, al zullen we ook afscheid moeten nemen van projecten die we niet verder kunnen brengen. Om welke reden dan ook. Dit gebeurt in goed overleg met alle partijen, zoals inmiddels in onze werkwijze zit verweven. Focus en helderheid zijn nodig om resultaten te kunnen boeken. Als we ons gezamenlijke doel maar voor ogen blijven houden: een aantrekkelijk en toegankelijk landschap waar natuur en recreatie elkaar versterken en waar mensen graag wonen, werken en recreëren. We willen dat ook toekomstige generaties van dit prachtige plassengebied kunnen blijven genieten.

Rosan Kocken

voorzitter stuurgroep OVP

Voortgang in vogelvlucht

2024




Overzicht budget en uitgaven

De uitgaven van de afgelopen jaren (tot 31 dec 2024) zijn als volgt verdeeld:

Uitgaven per programma onderdeel in procenten ten opzichte van herzien budget (inclusief absoluut restant)

Budget (herijkt)

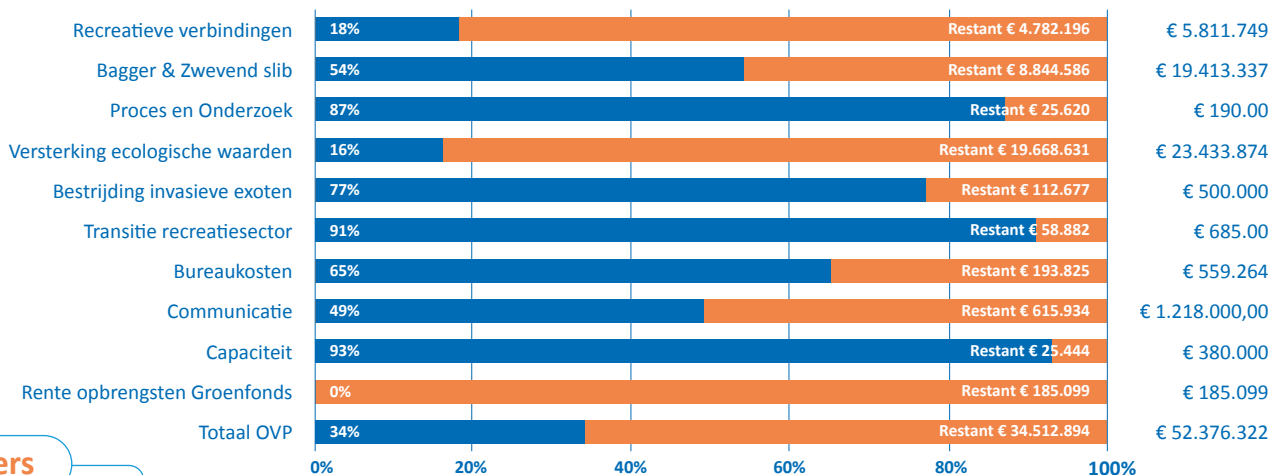


3 pijlers

Ontwikkelen
vrijtijdslandschap

Moderniseren
recreatiesector

Versterken
natuurwaarde

Budget en uitgaven (in mln.)

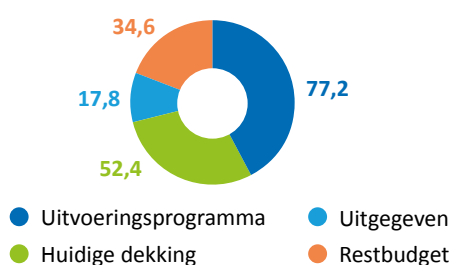

Status projecten

Scope

Planning

Financiën



- Project verloopt niet volgens goedgekeurd PvA, ingreep stuurgroep nodig
- Project verloopt niet volgens goedgekeurd PvA, géén ingreep stuurgroep benodigd
- Project verloopt volgens goedgekeurd PvA

Communicatie (in aantallen)

80 bezoekers jaarlijkse
informatiemarkt

867
abonnees nieuwsbrief

8300 bezoekers website

2 nieuwsbrieven baggeren

98 nieuwsberichten
website

300 abonnees
nieuwsbrief baggeren

6 nieuwsbrieven OVP

Fasering lopende (deel)projecten



1

Organisatie en draagvlak



De uitvoering van het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen (OVP) loopt van 2017 tot en met 2027. De stuurgroep, de regiegroep, het kernteam, het programmabureau en de projectleiders vormen samen de programma-organisatie waarin ieder eigen taken en verantwoordelijkheden heeft.

Taken en verantwoordelijkheden

In de stuurgroep zitten de bestuurders van de provincies Noord-Holland en Utrecht, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, de gemeenten Wijdemer, Hilversum en Stichtse Vecht, het Plassenschap Loosdrecht, Regio Gooi en Vecht, LTO Noord, een vertegenwoordiging namens de diverse watersportorganisaties, Natuurmonumenten en de Bewonersfederatie Oostelijke Vechtplassen. Samen dragen zij de verantwoordelijkheid voor het behalen van de programmadoelstellingen.

De regiegroep bestaat uit dezelfde partijen als de stuurgroep. Zij toetst plannen en voorstellen, ziet toe op de voortgang en samenhang van de projecten en bewaakt het programmabudget. Ook bepaalt de regiegroep welke plannen en voorstellen worden voorgelegd aan de stuurgroep. Dit gebeurt vijf keer per jaar. Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats waarin de regiegroep terugkijkt op het voorgaande jaar en aandachtspunten voor het komende jaar formuleert. Wanneer de regiegroep aangeeft meer over een bepaald project of onderwerp te willen weten, organiseert het programmabureau hiervoor een aparte bijeenkomst. In 2024 gebeurde dit voor het onderwerp financiën, waarbij de programmacontroller de aanwezigen een toelichting gaf op de huidige financiële situatie van het programma OVP en de afspraken die hierover zijn gemaakt met de partners.

Het kernteam met daarin de programmamanagers van de betrokken provincies, gemeenten en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht bespreekt wekelijks de voortgang en stemt onderwerpen en projecten met elkaar af. Ook vindt binnen dit team de voorbereiding van de vergaderstukken voor de regie- en stuurgroep plaats.

In het programmateam stemmen programmamanager, -secretaris, -controller, -ondersteuner en communicatiemanager wekelijks onderwerpen af zoals bijvoorbeeld de vergaderingen en bijeenkomsten van de regie- en stuurgroep en de jaarlijkse voortgangsrapportage. De programmanager coördineert de realisatie van het uitvoeringsprogramma, geeft leiding aan het programmabureau en zit de regiegroep voor.

De projectleiders dragen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de projecten. Zij informeren de regie- en de stuurgroep over de voortgang en leggen plannen van aanpak voor zodat de gereserveerde budgetten kunnen worden vrijgegeven. In het maandelijkse (online) projectleidersoverleg bespreken zij de voortgang van projecten en wisselen informatie en ervaringen met elkaar uit. In 2024 vond er voor het eerst een fysiek projectleidersoverleg plaats. Projectleiders informeerden elkaar over de projecten en bespraken de leer- en knelpunten. Gezien de positieve ervaringen van deze bijeenkomst organiseren we begin 2025 wederom een fysiek projectleidersoverleg.

Capaciteit en middelen

In het opdrachtgeversoverleg bespreken de overheidspartijen de benodigde capaciteit en middelen. In 2024 is in dit overleg met name gesproken over de realisatie van projecten in de resterende looptijd van het programma. Daarnaast is de wens uitgesproken om met elkaar te onderzoeken op welke wijze vanaf 2028 (na het gebieds-akkoord) kan worden samengewerkt aan de opgaven op het gebied van natuur, waterkwaliteit en recreatie. Het programmabureau maakt een voorstel dat begin 2025 wordt voorgelegd aan de regie- en stuurgroep.

Wettelijke kaders

Het schrappen van het Transitiefonds Landelijk Gebied en Natuur (het stikstoffonds) door het kabinet veroorzaakte in het voorjaar veel onzekerheid bij provincies. Begin september schrapte het kabinet ook het Nationaal Programma Landelijk gebied, waardoor de provincies zich moesten beraden op de gebiedsprocessen.

De provinciale plannen bepalen voor een groot deel de NNN-projecten binnen het Vechtplassengebied, waarbij de Vogel Habitatrichtlijnen vanuit het Europees netwerk Natura 2000 leidend en bepalend zijn, naast de Kaderrichtlijn Water (KRW)-maatregelen en de klimaatdoelstellingen van Parijs.

Voor de zomer besloot de provincie Noord-Holland met de beperkte financiële middelen in te zetten op 3 focusgebieden: Veenweidegebied, Binnenduinrand en Gooi en Vechtstreek. Het programma OVP valt binnen het laatstgenoemde focusgebied. De provincie Utrecht kondigde aan het eind van het jaar aan te willen blijven samenwerken met haar partners aan een toekomstbestendig en gezond landelijk gebied. Daarmee toonde de provincie initiatief voor de aanpak van de problemen én maakte een eind aan de onzekerheid voor agrariërs en andere betrokkenen.

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht werkt aan de uitvoering van de KRW-maatregelen. De waterkwaliteitsmaatregelen in het Vechtplassengebied vormen onderdeel van het KRW-maatregelenpakket voor de uitvoeringsperiode 2022-2027. Net zoals de natuurontwikkelingsprojecten dragen de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) maatregelen bij aan de doelstellingen die de provincies moeten halen. Eind 2024 liet Waterschap Amstel, Gooi en Vecht weten dat het niet lukt om alle KRW-maatregelen voor eind 2027 uit te voeren. Het waterschap doet een oproep voor aangepaste en extra maatregelen.

Mutual Gains Approach

Bij aanvang van het programma besloten de betrokken partijen te werken met de Mutual Gains Approach (MGA-methode). Hierbij werken de partners vanuit belangen aan oplossingen en niet vanuit meningen. De aanpak richt zich op het verkrijgen van consensus over bestuursvoorstellen én draagvlak voor gemaakte keuzes. De afspraken uit het gebiedsakkoord vragen een coöperatieve houding en het vermogen om eigen standpunten ondergeschikt te maken aan gezamenlijke programmadoelen. In 2024 is bij de regiegroep getoetst of er behoefte bestond om een nieuwe (opfris) MGA-training te organiseren. Conclusie was dat de partijen elkaar inmiddels goed weten te vinden en de samenwerking naar tevredenheid verloopt. We helpen elkaar waar nodig en zetten in op resultaat. Er bestaat geen behoefte aan een meerdaagse MGA-training. De regiegroep wil de tijd en middelen liever besteden aan een jaarlijks bezoek aan projecten in het gebied, waarbij kan worden ingegaan op de uitdagingen en kansen. In het voorjaar van 2025 organiseren we daarom een gebiedsexcursie waarin het thema waterkwaliteit centraal staat. Dit onderwerp raakt immers alle projecten binnen het programma.

Voortgang in de projecten

In 2024 zijn de Loosdrechtse Plassen 1 tot en met 5 gebaggerd, inclusief de werkhaven van het Plassenschap. Ook de (zand)drempels in de Oostelijke Drecht zijn verwijderd. De eerste fase van het project baggeren is echter pas afgerond als ook het baggerdepot is opgeheven. Begin 2024 hebben watersportsector, bewonersfederatie, gemeenten, waterschap en provincie de koppen bij elkaar gestoken om tot een passende oplossing te komen voor het baggeren van de havens. Na twee intensieve werksessies ontstond een plan voor een gedragen aanpak en uitvoeringsregeling. Deze zijn in de loop van 2024 met inspanning van bestuurders in de watersportsector verder uitgedragen. We verwachten de subsidieregeling voor het baggeren van de havens in het Vechtplassengebied in het voorjaar van 2025 via de provincie Noord-Holland te kunnen openstellen.

Begin 2024 werd besloten om een jaar langer te monitoren binnen het project Zorg voor legakkerlandschap. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht vond de ecologische ontwikkeling nog onvoldoende. Vanwege de langere monitoringsperiode van de pilots verschuift de invoering van de stimuleringsregeling. De invoering van de regeling staat nu gepland voor medio 2025.

In 2024 ging veel aandacht naar de gebiedsprocessen om nieuwe natuur (NNN) in het Plassengebied te realiseren. Het betreft processen in Kortenhoef Oost, Kortenhoef West, Ankeveen, Weersloot, Ster van Loosdrecht, Vuntus en Het Hol. Elk gebied doorloopt een eigen proces in afstemming met grondeigenaren, bewoners en ondernemers. De afstemming met de omgeving vraagt een zorgvuldige en daardoor intensieve

aanpak. Dat geldt vooral voor het proces in Kortenhoef Oost; waar de provincie besloot de voormalige vuilstort Groenewoud te saneren.

In natuurgebied Het Hol werken provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht samen om de karakteristieke laagveennatuur te beschermen en te versterken. Begin 2024 zijn de werkzaamheden voor fase 1 gestart. Na het aanleggen van twee noordoostelijke depots, kon worden gestart met het verwijderen van schone bagger uit de watergangen in het natuurgebied. De volgende stap bestaat uit het optimaliseren van het water-systeem met dammen en duikers. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot medio 2027. Daarna staat het herstellen van natuur en het ontwikkelen van nieuwe natuur (fase 2) op de planning.

Vanaf januari 2024 heeft een ingenieursbureau onderzocht welke faunapassage op welke locatie in het Vechtplassengebied past. Totaal zijn 14 voorontwerpen uitgewerkt. Omdat het projectbudget ontoereikend is om alle ontwerpen tot uitvoering te brengen, moet er geprioriteerd en gekozen worden. Na overeenstemming over de prioritering kan de uitvoering starten. De verwachting is dat in de loop van 2025 de eerste faunapassagie wordt aangelegd.

Sinds eind 2024 laat Natuurmonumenten werkzaamheden uitvoeren voor een beter leefgebied voor moerasvogels in Hollands Ankeveen en Kortenhoef West. Het gebied wordt opener. Rietkragen krijgen de kans om te herstellen en zich verder te ontwikkelen. De werkzaamheden duren tot begin 2026, met een onderbreking tijdens het broedseizoen. In de Loosdrechtse Plassen start de provincie Noord-Holland in februari 2025 met de uitvoering van maatregelen voor moerasvogels.

Besluiten stuurgroep

De stuurgroep nam in 2024 een aantal belangrijke besluiten. Zo stelde de stuurgroep € 600.000 beschikbaar voor het herstellen van de beschouwingen van het zuidelijk deel van De Heul in Loosdrecht en werd voor de kwaliteitsimpuls Wijde Blik € 51.000 gereserveerd. Aan het eind van het jaar stelde de stuurgroep een budget van ongeveer 1,5 miljoen euro beschikbaar voor de realisatie en het beheer van vijf nieuwe wandelroutes, een kwaliteitsimpuls in Ankeveen en bebording en beleving van deze routes. Het gaat hierbij vooral om het invullen van ontbrekende schakels in het huidige wandelnetwerk. Ook stemde de stuurgroep in met het voorstel om een onafhankelijk adviesbureau in kaart te laten brengen op welke wijze het resterend budget van twee projecten die onhaalbaar bleken te zijn (1.2 Waterrecreatie 's Gravenland en Kortenhoef en 1.3 Alternatieve projecten waterrecreatie), ten goede kan komen aan (water)recreatie. Naar verwachting kan de stuurgroep in het voorjaar van 2025 op basis van de rapportage een beslissing nemen over dit resterend budget.

In 2024 ontstond duidelijkheid over het plan van de Gouden Greep, waarbij eiland Weer wordt getransformeerd naar een plek waar natuurbeleving en -spelen samengaan met de ontwikkeling van natuurlijke oevers. Het Plassenschap, de gemeente Wijdemeren en andere partners uit het programma OVP zien te veel beperkingen bij de realisatie van het totaalconcept van de Gouden Greep op dit eiland. Bepaalde onderdelen kunnen mogelijk wel op deze of andere plekken in de Loosdrechtse Plassen worden toegepast.

Realisatie en beheer

Beheer vormt geen onderdeel van het programma OVP; de projecten richten zich vooral op verkenning en ontwikkeling. Met het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Kansrijke Recreatieve Routes komt hier verandering in. De kosten voor twintig jaar beheer en onderhoud van de routes maken deel uit van het uitvoeringsprogramma. De gemeente Wijdemeren verwacht de vijf wandelroutes binnen de resterende looptijd van het programma te kunnen realiseren.

Ook bij het plan voor de aanpak van overlastgevend waterplanten willen de partijen toekomstig beheer meenemen. Dit zorgt voor duurzame oplossingen en draagt bij aan de bevaarbaarheid van het Vechtplassengebied op de langere termijn. Het plan wordt waarschijnlijk medio 2025 ter besluitvorming aangeboden aan de stuurgroep.

2

Communicatie



2.1 Werkwijze

In de communicatiewerkgroep overleggen de communicatieadviseurs van de provincie Noord-Holland, de gemeente Stichtse Vecht, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Natuurmonumenten over de communicatie over projecten. In de plannen van aanpak voor projecten vormt communicatie een vast onderdeel. De communicatiemanager OVP zit de werkgroep voor en is verantwoordelijk voor het beleid, regie en afstemming van communicatie binnen het programma en adviseert daarnaast de gemeente Wijdmeren over communicatie over projecten uit het OVP. De communicatiewerkgroep kwam in 2024 vijf keer bijeen. Dat gebeurt telkens twee weken voorafgaand aan de vergaderingen van de regiegroep zodat ook de communicatie over voorliggende bestuursbesluiten kan worden besproken.

Berichtgeving

De belangrijkste besluiten van de stuurgroep verschijnen na de vergadering op de website, worden opgenomen in de nieuwsbrief van het programma OVP en verschijnen regelmatig op de website of in de nieuwsbrief Gooi en Vechtstreek van de provincie Noord-Holland. Ook de communicatiekanalen van de andere partners worden gebuikt om nieuws te verspreiden of bepaalde onderwerpen onder de aandacht te brengen.

2.2 Programmacommunicatie

Website

De website www.vechtplassen.nl fungeert als het centrale communicatiemiddel van het programma. Hierop staat onder andere uitleg over het programma, de organisatie, de partners en de projecten. Projecten beschikken over een eigen pagina waarop de actuele stand van zaken staat vermeld.

In 2024 telde de website 8300 bezoekers; hiervan komen 8000 bezoekers voor het eerst op de site. Het aantal bezoekers stijgt met ruim 2000 ten opzichte van 2023; toen dit aantal 6200 bedroeg. Hierbij zien we, net zoals voorgaande jaren, een stijging in het aantal bezoekers na het verzenden van de digitale OVP-nieuwsbrief aan de abonnees.



Op de nieuwspagina verschijnen wekelijks nieuwe berichten. Deze gaan met name over de voortgang in projecten, maar ook over relevante provinciale en regionale ontwikkelingen. In totaal werden in 2024 98 nieuwsberichten op de website geplaatst. Vorig jaar kwam het totaal aantal nieuwsberichten uit op 49. De nieuwsberichten verschijnen ook regelmatig op de gemeentepagina's van de gemeenten Wijdmeren en Stichtse Vecht. Daarnaast worden de berichten regelmatig doorgeplaatst in de nieuwsbrieven en op social media kanalen van de gemeenten Stichtse Vecht en Wijdmeren en de provincie Noord-Holland.

Digitale nieuwsbrief

In 2024 verstuurden we vanuit het programma 6 digitale nieuwsbrieven met daarin veel aandacht voor de voortgang van projecten. Regelmatig plaatsen we ook een interview of achtergrondartikel in de nieuwsbrief. De nieuwsbrief kende op 31 december 2024 totaal 867 abonnees (2023: 828 abonnees).

OVP-middelen

Voor communicatie met partners, bewoners en andere belangenpartijen maken we gebruik van OVP-communicatiemiddelen, zoals bijvoorbeeld briefpapier, presentaties, de jaarlijkse voortgangsrapportage en informatieposters (vooral gebruikt tijdens fysieke informatiebijeenkomsten). Het consequent toepassen van de OVP-huisstijl in de communicatiemiddelen draagt bij aan de herkenbaarheid van het programma én onderstreept de samenwerking tussen de partners.

Regionale en lokale media

In 2024 verschenen in lokale en regionale media diverse artikelen over onderwerpen en projecten van het OVP. De lokale media schonken aandacht aan de baggerwerkzaamheden in de Loosdrechtse Plassen, de werkzaamheden in het Hol, de jaarlijkse informatiemarkt en de maatregelen voor moerasvogels die eind 2024 in uitvoering gingen. Er ging vooral veel aandacht naar de sanering van de voormalige vuilnisbelt Groenewoud, hetgeen voorwaarde is voor de natuurontwikkeling in polder Kortenhoef Oost. Deze sanering is een verantwoordelijkheid van de provincie Noord-Holland en vormt geen onderdeel van het programma OVP.

Sociale media

Het opbouwen en onderhouden van een achterban op social media vraagt veel aandacht, en daarmee inzet en budget. Na het besluit om vanaf 2024 alleen X (Twitter) in te zetten voor het OVP, bleek het moeilijk dit kanaal levend te houden. Daarnaast is er veel discussie rondom X vanwege de onbetrouwbaarheid. Besloten is het account 'slapend' voort te zetten. Dit houdt in dat het account niet actief wordt ingezet, maar wordt gebruikt om te kunnen volgen wat andere partijen hierop kenbaar maken. Waar mogelijk en van toegevoegde waarde maken we gebruik van de sociale media kanalen van onze partners. Zij hebben een groter bereik en staan vaak dichterbij de doelgroep, vooral als boswachters en beheerders actief zijn op sociale media.

Algemene informatiemarkt

Op 10 oktober vond de vierde algemene OVP-informatiemarkt plaats in sporthal De Fuik in Kortenhoef. De nadruk ligt tijdens de markt op de interactie: het voeren van een persoonlijk gesprek, suggesties ophalen en (duurzame) relaties aangaan of verstevigen voor de projecten in het programma. Op verzoek van de regiegroep is in 2024 gezocht naar een locatie die niet in de dorpskern Loosdrecht ligt zodat we nieuwe doelgroepen kunnen bereiken. De informatiemarkt is aangekondigd via de eigen communicatiekanalen en die van partners, vooral die van de gemeente Wijdmeren. Ter ondersteuning zijn advertenties in verschillende regionale media geplaatst.

Net zoals de voorgaande jaren stond informatie over de verschillende projecten uit het programma centraal tijdens de informatiemarkt. Ieder project presenteert zich aan de hand van enkele posters. Alhoewel de opkomst lager was dan vorig jaar, kijken we tevreden terug op de informatiemarkt. De algemene conclusie luidt dat de opzet letterlijk en figuurlijk voldoende ruimte bood om met elkaar in gesprek te gaan. Dat geldt niet alleen voor omwonenden, maar ook voor projectleiders. Voor 2025 kijken we kritisch naar de toegevoegde waarde en vorm van de informatiemarkt zodat kosten en inzet in verhouding blijven staan met de doelstellingen.

2.3 Projectcommunicatie

Het vergroten van de betrokkenheid van partners, stakeholders en de omgeving (lees: bewoners, grond-eigenaren, ondernemers, gebruikers en andere belanghebbenden) bij de diverse projecten was ook in 2024 de belangrijkste doelstelling. Dat gaat vooral over meedenken, -praten en -doen. We ondersteunen dit met transparante en regelmatige communicatie over de voortgang van projecten via verschillende kanalen.

Baggeren

In het eerste kwartaal van 2024 zijn de baggerwerkzaamheden op de Loosdrechtse plassen afgerond. In de digitale Baggernieuwsbrief en met behulp van een planningsposter op A3-formaat is de omgeving hierover geïnformeerd. De nieuwsberichten kregen ook een plek op vechtplassen.nl, de bouwapp, de regionale facebookpagina van de provincie en regionale media.

Er verschenen in 2024 twee nieuwsbrieven over baggeren aan zo'n 300 abonnees. In de eerste nieuwsbrief van januari stond onder andere de kwartaalplanning van de werkzaamheden. De tweede nieuwsbrief kwam uit in juni. Daarin werd een voorschot genomen op het baggeren van de havens en was ook het filmpje te zien over het baggeren van de 1e tot en met de 5e Loosdrechtse Plas.

Het Baggerplatform kwam in 2024 twee keer bij elkaar, in januari en augustus. Tijdens deze bijeenkomsten kregen aanwezigen informatie over de voortgang van de verschillende projecten en issues die daarbij spelen. Onderwerpen waren onder andere de resultaten van fase 1 (baggeren 1e t/m 5e Loosdrechtse Plas), voorde-ringen fase 2 (baggeren van de havens), onderzoek naar luwtestructuren, beheervisie en de aanpak van overlastgevende waterplanten. Het aantal deelnemers aan het Baggerplatform blijft nagenoeg gelijk en daarmee de betrokkenheid onverminderd groot.

Zorg voor legakkerlandschap

Eigenaren van legakkers in de Kievitsbuurten werden op 28 mei 2024 bijgepraat over de pilots en konden input leveren voor de stimuleringsregeling. We bekijken hoe we meer eigenaren kunnen betrekken bij de uitwerking van de regeling. Vooral de eigen ervaringen met het stimuleren van rietgroei of natuurvriendelijke oevers kunnen van belang zijn.

Natuurontwikkeling

Kortenhoef Oost

Met de kennis uit de verkenningsfase is een natuurambitiekaart voor de polder Kortenhoef Oost opgesteld. Omwonenden en grondeigenaren konden zowel tijdens de inloopavond op 17 juli als via een online reactie-formulier reageren op deze natuurambitiekaart. Op verzoek van de gemeente Wijdmeren ontvingen alle inwoners van Kortenhoef een uitnodiging voor deze inloopavond. Een terugkoppeling van de inloopavond is geplaatst op www.vechtplassen.nl en meegenomen in de nieuwsbrief OVP. De inbreng wordt gebruikt bij het opstellen van het inrichtingsplan voor het gebied. Ook worden met alle perceeleigenaren individuele gesprek-ken gevoerd over de natuurdoelen op hun gronden en bijbehorend beheer. Deze fase duurt naar verwachting twee tot drie jaar. Daarna wordt het inrichtingsplan voor vaststelling voorgelegd aan de stuurgroep OVP en de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

Kortenhoef West

Op initiatief van individuele perceeleigenaren voerde de provincie Noord-Holland in 2024 gesprekken over de natuurontwikkeling op hun perceel.

Ankeveen

Om helder te krijgen welke natuurlijke inrichting waar in Ankeveen het meest gewenst is, laat de provincie Noord-Holland de komende jaren voor dit gebied een ecologische visie opstellen. Dit gebeurt in overleg met grondeigenaren en belanghebbenden in het gebied.

Ster van Loosdrecht

Het gebiedsaanbod wordt samen met de vereniging de Ster van Loosdrecht en de betrokken grondeigenaren uitgewerkt. Doel is gezamenlijk afspraken te maken over de realisatie van de natuurdoelen op percelen binnen de NNN.

Het Hol

Natuurmonumenten heeft bewoners via brieven en de lokale media geïnformeerd over de start van de werkzaamheden in natuurgebied Het Hol. Ook op de website vechtplassen.nl en in de digitale nieuwsbrief zijn hierover artikelen verschenen.

Faunapassages

Op 11 juli kregen zo'n 40-50 mensen tijdens een informatiebijeenkomst uitleg over de 14 ontwerpen van de faunapassages en konden zij in gesprek met de projectleider en deskundigen. Daarna is met vertegenwoordigers van de gemeente Wijdmeren, Natuurmonumenten en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht per ontwerp gekeken naar de technische haalbaarheid, de bijbehorende kosten en eventuele bezwaren vanuit de omgeving. Ook de winst voor de natuur en het combineren van de aanleg met andere werkzaamheden spelen een rol bij de prioritering.

Moerasvogels

De werkzaamheden voor betere omstandigheden voor moerasvogels zijn eind 2024 onder andere aangekondigd via lokale h-a-h-bladen en de nieuwsbrieven van de gemeente Wijdmeren en het programma OVP.



3

Financiën; waar staan we nu?



Waar staan we nu?

Vanaf de start in 2017 zien we dat na acht jaar veel projecten uit het uitvoeringsprogramma zijn gestart, afgevallen of afgerond, maar ook dat er deelprojecten zijn bijgekomen of vervangen. De resterende looptijd van het programma zetten we vooral in op de uitvoering van projecten. Daarnaast voeren we projecten af wanneer we zeker weten dat deze niet realiseerbaar zijn in de resterende drie jaar van het uitvoeringsprogramma. Zo houden we een realistische lijst met haalbare projecten over.

Tabel 1 - Deze tabel geeft in het kort weer welk budget uit het uitvoeringsprogramma is gedekt en uitgegeven. Voor meer informatie zie hoofdstuk "in een vogelvlucht"

Schematisch (in miljoenen euro's):	
Raming uitvoeringsprogramma	77,2
Totaal huidige dekking	52,4
Uitgegeven	17,8
Beschikbaar restbudget	34,6

Ontwikkeling kosten

Programmabreed komen de kosten in 2024 uit op een totaal van € 2,74 miljoen. Over de periode 2017-2024 is er € 17,8 miljoen uitgegeven. Dit is 34% van het huidige gedekte programmabudget van € 52,4 miljoen. De huidige dekking is met € 0,19 miljoen toegenomen door rente-inkomsten op de Groenfonds-rekening.

Verdeling over de pijlers

De uitgaven in de afgelopen jaren zijn als volgt verdeeld over de drie pijlers van het gebiedsakkoord:

- 1.1 t/m 1.7 - Ontwikkelen vrijetijdslandschap: € 11,8 miljoen
- 2.1 t/m 2.5 - Versterking ecologische waarden: € 4,2 miljoen
- 3.1 t/m 3.4 - Transitie recreatiesector/organisatiekosten: € 0,63 miljoen
- 4.0 - Bureau- en capaciteitslasten: € 1,3 miljoen

Pas aan het einde van de planuitwerkingsfase, waarbij op basis van planning, risico's en raming het kasritme wordt bepaald, kan een realistisch uitgavenpatroon worden vastgesteld. Dan kunnen we ook een goede meerjarenprognose afgeven.

4

Status projecten



Lopende projecten			Huidige fase	Scope	Planning	Financiën
Ontwikkelen vrijetijdslandschap						
1.1	Recreatieve routes & natuur- en landschapsbeleving	Verkenning				
1.2	(Water)recreatie 's-Graveland/Kortenhoef	N.v.t.				
1.3	Alternatieven voor de waterrecreatie (voorheen Vaarverbinding Loosdrechtse Plassen - Hilversums Kanaal)	N.v.t.				
1.5a	Van dorpslint naar recreatieboulevard (Wijdmeren)	Verkenning				
1.7.1a	Aanpak baggerproblematiek (fase 1)	Realisatie				
1.7.1b	Aanpak baggerproblematiek (fase 2-3)	Verkenning en planuitwerking				
1.7.2	Aanpak zwevend slib: helder water en ontwikkeling waterplanten	Planuitwerking				
1.8	Herstel en duurzaam behoud legakkerlandschap Kievitsbuurten	Realisatie				
1.9	Kwaliteitsimpuls Wijde Blik	Planuitwerking				
1.10	Vaarverbinding de Heul	Realisatie				
Versterken ecologische waarden						
2.1	Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Kortenhoef Oost	Verkenning				
2.1	Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Kortenhoef West	Verkenning				
2.1	Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Ankeveen (HAP/SAP)	Verkenning				
2.1	Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Weersloot	Verkenning				
2.1	Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Ster van Loosdrecht	Verkenning				
2.1	Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Vuntus	Verkenning				
2.1	Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – 't Hol	Planuitwerking				
2.2a	Realiseren Ecologische verbindingen – N201	Planuitwerking				
2.2b	Realiseren Ecologische verbindingen - Faunapassages	Planuitwerking				
2.3	Verbeteren waterkwaliteit	Planuitwerking				
2.4.3a	Planuitwerking natuurmaatregelen voor moerasvogels	Planuitwerking				
2.4.3b	Quicksan Nieuwe Polderplas	Verkenning				
2.5.2	Maatregelen ganzenvraat	N.v.t.				
2.6	Bestrijding exoten / overlastgevende waterplanten	Planuitwerking				
Transformatie recreatiesector						
3.1	Gebiedsloods	N.v.t.				
3.2a	Transitieteam Recreatie en Toerisme	N.v.t.				
3.2b	Toekomstbeeld Recreatie 2030	N.v.t.				
3.4	Verkenning bedrijveninvesteringszone / investeringsfonds	N.v.t.				
Organisatiekosten						
4.1	Organisatiekosten GA OVP	N.v.t.				



Project verloopt volgens meest actuele plan van aanpak, geen besluit stuurgroep vereist



Project verloopt niet geheel volgens meest actuele plan van aanpak, geen besluit stuurgroep vereist



Project verloopt niet volgens meest actuele plan van aanpak, besluit stuurgroep vereist

Afgeronde (deel)projecten uit het uitvoeringsprogramma

Projecten		Opmerkingen
1.1	Wandelbrug 's-Graveland	De wandelbrug is opgeleverd in 2019.
1.1	Deelproject Kano-overstapplaats Wijde Blik-Vuntus	Officiële décharge heeft in 2021 plaatsgevonden.
1.2	Waterrecreatie 's-Graveland en Kortenhoef	Projecten 1.2 en 1.3 zijn officieel beëindigd in 2024. Middelen worden gealloceerd voor andere projecten. Hiervoor loopt een onderzoek naar de vorm besteding van deze middelen.
1.3	Alternatieven waterrecreatie (voorheen vaarverbinding Loosdrechtse Plassen – Hilversums Kanaal	Projecten 1.2 en 1.3 zijn officieel beëindigd in 2024. Middelen worden gealloceerd voor andere projecten. Hiervoor loopt een onderzoek naar de vorm besteding van deze middelen.
1.4	Onderzoek ontsluiting en toegankelijkheid	Het onderzoek is afgerond. De gemeente Wijdemeren neemt de aanbevelingen uit het rapport mee in haar plannen.
1.5b	Duurzame ontwikkeling Scheendijk (Stichtse Vecht)	De toekomstvisie Scheendijk is opgeleverd en vastgesteld. De realisatie van het plan valt buiten het programma OVP; de gemeente Stichtse Vecht pakt de uitvoering op.
1.6	Prijsvraag Icoon Oostelijke Vechtplassen	De prijsvraag is afgerond. In 2024 heeft de Stuurgroep OVP laten weten geen mogelijkheden te zien in realisatie van de Gouden Greep op eiland Weer.
2.5	Ganzenvraat en ganzenbeheer	De provincies zijn verantwoordelijkheid voor het ganzenbeleid. Binnen het programma OVP wordt de ganzenproblematiek waar mogelijk meegenomen in andere projecten.
3.3	Integreren recreatie en natuur: onderzoek <i>samengaan natuur en waterrecreatie</i> en onderzoek <i>duurzaam varen</i>	Beide onderzoeken zijn in 2020 afgerond. Er is geen financiering voor de follow-up van deze onderzoeken.

5

Pijler 1

Ontwikkelen vrijetijdslandschap



Project 1.1 Recreatieve verbindingen

Projecttrekker(s)	Gemeente Wijdmeren en gemeente Stichtse Vecht		
Projectraming volgens UVP	€ 2.621.000		
Fase project	Verkenning		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	11-07-2018		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Betrokken partijen	Gemeente Wijdmeren, Gemeente Stichtse Vecht, Gemeente Hilversum, Provincie Noord-Holland, Provincie Utrecht, Natuurmonumenten, Waternet/AGV, Plassenschap Loosdrecht e.o. en private partijen		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: diverse projecten Natuurontwikkeling (2.1), Van dorpslint naar recreatieboulevard (1.5), Aanleg van nieuwe vaarverbindingen (1.3), Alternatieve projecten waterrecreatie (1.2), Ontwikkeling van de Nieuwe Polderplas en Transitieteam recreatie en toerisme (3.2).		

Resultaatbereik 2024

Beoogd resultaat

- In afstemming met partners in het programma OVP komt duidelijkheid over de haalbaarheid van de realisatie van verschillende wandelpaden. Dit vormt de input voor een Uitvoeringsprogramma Kansrijke Recreatieve Routes.
- Voor de gebieden Vuntus, Ster van Loosdrecht en Weersloot is in opdracht van de provincie Noord-Holland samen met bewoners, terreinbeheerders, waterschap en grondbezitters onderzocht op welke manier de gestelde ambities én de beleving van natuur en landschap in deze drie deelgebieden concreet vorm kunnen krijgen.
- De opgaven op het gebied van natuur en water voor het gebied Horstermeer-Zuid zijn vertaald in een plan. Dit plan biedt duidelijkheid over de haalbaarheid van de gewenste recreatieve verbindingen.
- Er worden voorstellen gedaan voor het vervolg van het LegakkerFortenpad.
- Het Groenewoudpad heeft een plek gekregen in het NNN-inrichtingsplan van polder Kortenhoef-Oost.
- In 2024 worden de plannen voor de Nieuwe Polderplas duidelijk en daarmee ook de kansen voor realisatie van het Trekpad Loenderveense Plas.
- Bekeken wordt of en zo ja, op welke wijze verbinding kan worden gemaakt met ontwikkelingen rondom de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Bereikt resultaat

- Onder leiding van de gemeente Wijdmeren hebben alle partners gewerkt aan een overzichtsdocument van realiseerbare routes.
- Met het beschikbare budget als randvoorwaarde, heeft dit geleid tot het Uitvoeringsprogramma Kansrijke Recreatieve Routes.
- De stuurgroep heeft dit uitvoeringsprogramma op 18 december 2024 vastgesteld, waardoor budget beschikbaar komt voor realisatie van de wandelroutes, kwaliteitsimpuls en de bewegwijzering. Voor de kanoroutes uit het uitvoeringsprogramma is nog geen geld beschikbaar gesteld. Hierover besluit de stuurgroep pas als er duidelijkheid bestaat over de resterende middelen uit de niet realiseerbare projecten 1.2 en 1.3. Onderdeel van het uitvoeringsprogramma vormt de borging van het beheer en onderhoud van

de te realiseren routes en voorzieningen voor de komende 20 jaar. De eerder vrijgegeven middelen die nog niet zijn besteed, worden toegevoegd aan het budget van het uitvoeringsprogramma.

- Eind 2024 is een projectleider van de gemeente Wijdmeren gestart met het uitvoeringsprogramma. De komende 3 jaar gaat de projectleider aan de slag met de realisatie van:
 1. Wandelpad Horstermeer Radioweg, Nederhorst den Berg
 2. Wandelpad Korremofpad, Kortenhoef
 3. Wandelpad Nieuw-Loosdrecht, doorsteek Ster van Loosdrecht
 4. Wandelpad Nieuw-Loosdrecht, doorsteek Weersloot
 5. Wandelpad Stichtse Vecht – Legakker Fortenpad
 6. Kwaliteitsimpuls recreatieve routes Ankeveen
 7. Bebording / bewegwijzering

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting
Huidige fase		Verkenning Planuitwerking	N.v.t.	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 1.499.173	€ 2.621.000	2024 – Alle overgebleven middelen zijn geoormerkt voor het Uitvoeringsprogramma Kansrijke Recreatieve Routes.
Herzien projectbudget		€ 1.499.173	€ 1.519.173	€ 80.000 overgeheveld t.b.v. inhuur projectleiding Horstermeer Zuid. Ten behoeve van de dekking van de algemene programmakosten is 3,5 % van het budget afgeroomd. Geen dekking voor project Fort Spion € 650.000. Een bedrag van € 20.000 is gelabeld voor Nera-investeringen.
Totaal besteed	T/m 2023	€ 44.142	€ 44.142	
	In 2024	€ 44.211	€ 44.211	Er is € 18.638,- besteed aan het opstellen van het overzichtsdocument, het uitvoeringsprogramma en de SKK-ramingen van alle routes. Er is € 3040,- besteed aan meer uren voor het overzicht van de waterrecreatie en de daaruit voortvloeiende kanoroutes voor het uitvoeringsprogramma. Er is € 22.533,- besteed aan het opstellen en uitvoeren van een procesvoorstel voor natuur- en landschapsbeleving.
	Totaal	€ 88.353	€ 88.353	
Resterend budget		€ 1.410.820	€ 1.430.820	

Doorkijk 2025

Beoogd resultaat

- De gemeente Wijdmeren zet in op realisatie van het Uitvoeringsprogramma Kansrijke Recreatieve Routes voor 2028, met uitzondering van de kanoroutes.
- In 2025 start de gemeente met de onderdelen:
 - Kwaliteitsimpuls Ankeveen - De verwachting is dat in 2025 de uitvoering van concrete maatregelen kan starten.
 - Wandelpad Stichtse Vecht – Legakker Fortenpad – De gemeente Wijdmeren draagt de uitvoering over aan de gemeente Stichtse Vecht en maakt afspraken over realisatie voor 2028.
 - Wandelpad Nieuw-Loosdrecht doorsteek Weersloot – De gemeente Wijdmeren start het participatie- en vergunningenproces.
 - Wandelpad Nieuw-Loosdrecht, doorsteek Ster van Loosdrecht – Er wordt verkend hoe de oversteek van de Drecht kan worden gerealiseerd.
 - Een goede financiële borging en inrichting voor de beheergelden krijgen vanaf aanvang aandacht.

In 2026 starten de overige 2 processen voor de realisatie van wandelpad Horstermeer Radioweg in Nederhorst den Berg en het wandelpad Korremofpad in Kortenhoef.

Risico's scope, planning, financiën

- Grondeigenaren willen niet meewerken en vertragen daarmee het proces van bijvoorbeeld een vergunningstraject, of maken realisatie onmogelijk. Op dat moment bekijkt de gemeente of alternatieve trajecten grotere kans van slagen hebben.
- De wandelpaden en de bijbehorende elementen, zoals bruggen, liggen in NNN- en Natura 2000 gebied. Er gelden grote beperkingen voor wat betreft het realiseren van toevoegingen in het gebied. Dit kan betekenen dat een aantal beoogde elementen op een andere manier moet worden gerealiseerd.
- De routes zijn geraamd volgens de SKK-systematiek. Toch kunnen in de praktijk kosten naar voren komen die op dit moment niet inzichtelijk zijn. Daarnaast kunnen inflatie of andere prijsveranderingen invloed hebben op de uiteindelijke kosten. Dit vraagt om keuzes in de uitvoering.

Project 1.5a Van dorpslint naar revreatieboulevard

Projecttrekker(s)	Gemeente Wijdmeren		
Projectraming volgens UVP	€ 60.000 voor totaal project 1.5 waarvan € 45.000 voor onderdeel gemeente Wijdmeren		
Fase project	Verkenning		
Datum goedkeuring huidig PVA (SG/RG)	31 maart 2021 (intakeformulier)		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	In dit project worden de mogelijkheden verkend voor het realiseren van een passende aansluiting van de aangrenzende (particuliere) percelen op de gereconstrueerde weg in het gebied Boomhoek. De uitgestelde reconstructie van de Nieuw Loosdrechtsedijk (onderdeel Boomhoek) zorgt voor vertraging van dit project.		
Betrokken partijen	Gemeente Wijdmeren, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, recreatiesector, VVBB, bewoners en eigenaren belendende percelen		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: NNN-realisatie in Weersloot en in Ster van Loosdrecht (2.1), Maatregelen voor moerasvogels (2.4), Transitieteam recreatie en toerisme (3.2), Onderzoek Ontsluiting en Toegankelijkheid (1.4) en Faunapassages (2.2).		

Resultaatbereik 2024

Beoogd resultaat

- Het plan van de Vereniging Verenigde Bedrijven Boomhoek (VVBB) is uiterlijk een half jaar na oplevering van de recreatie-boulevard ingediend.
- Er bestaat duidelijkheid of, in welke vorm en onder welke regie de aanbevelingen uit het rapport vervolg krijgen.

Bereikt resultaat

- De gemeente Wijdmeren en de Vereniging Verenigde Bedrijven Boomhoek (VVBB) hebben geen actie ondernomen.
- Er is vanuit het programma OVP € 10.000 toegezegd voor het opstellen van een plan voor bewoners en ondernemers in de omgeving Boomhoek, wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan. De termijn voor het indienen van dit plan is verstreken.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting
Huidige fase		Verkenning Planuitwerking	-	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 30.000	€ 45.000	Betreft het deel van gemeente Wijdemeren.
Herzien projectbudget		-	€ 30.000	Totaal is € 15.000 overgeheveld naar inzet van capaciteit.
Totaal besteed	T/m 2023	€ 4.380	€ 4.380	
	In 2024	€ 0	€ 0	
	Totaal	€ 4.380	€ 4.380	
Resterend budget		€ 25.620	€ 25.620	

Doorkijk 2025

Beoogd resultaat

De gemeente Wijdemeren voert overleg met de bewonersverenigingen over de mogelijke vervolgstappen. De inzet is het resterende budget van € 25.620 in te zetten op een paar praktisch uitvoerbare maatregelen die de dijk(en) verfraaien. Te denken valt aan hangende bloembakken, extra verlichting en andere aankleding die de beleving vergroten.

Risico's scope, planning, financiën

Voor het vervolg is zeer beperkt budget beschikbaar. Dit kan de animo om deel te nemen beperken.

Project 1.7.1a Baggeropgave fase 1

Projecttrekker(s)	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 6.876.315		
Fase project	De basisopgave is fysiek gereed. Het depot droogt in.		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)			
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Het baggeren op de Loosdrechtse Plassen is afgerond. In het najaar van 2025 wordt het depot in de polder Mijnden opgeschoond en het oude slotenpatroon hersteld. De informatie over het baggerresultaat is overgedragen aan de gemeente Wijdereen.		
Betrokken partijen	De betrokken agrariër, verhuurder van de depotlocatie.		
Samenhang andere projecten	Er bestaat geen samenhang met andere projecten.		

Resultaatbereik 2024

Beoogd resultaat

De baggeropgave in de Loosdrechtse Plassen is afgerond.

Bereikt resultaat

De baggeropgave in de Loosdrechtse Plassen is afgerond.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting
Huidige fase		Nazorg		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 6.273.315	€ 6.273.315	Statusrapport 567
Herzien projectbudget		€ 6.876.315	€ 6.876.315	
Totaal besteed	T/m 2023	€ 4.025.750	€ 4.025.750	
	In 2024	€ 1.568.040	€ 1.568.040	
	Totaal	€ 5.593.790	€ 5.593.790	
Resterend budget		€ 1.282.525	€ 1.282.525	

Doorkijk 2025

Beoogd resultaat

Het depot wordt in het vierde kwartaal van 2025 opgeschoond.

Risico's scope, planning, financiën

- De nazorgfase is het derde kwartaal 2026 gereed.
- De werkzaamheden vinden binnen het beschikbare budget plaats.

Project 1.7.1b Aanpak baggerproblematiek (fase 2-3)

Projecttrekker(s)	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 7.223.685		
Fase project	Vorbereiding en planuitwerking		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	9 oktober 2004		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	De stuurgroep heeft € 1.750.000 beschikbaar gesteld voor de afvoer en acceptatie van bagger uit de havens. Dit krijgt vorm in een uitvoeringsregeling van de provincie Noord-Holland. Havens kunnen naar verwachting in de loop van 2025 de eerste aanvragen indienen. Samen met de recreatiesector wordt gezocht naar depotlocaties ten behoeve van de beheeropgave.		
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland, provincie Utrecht, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, gemeente Wijdmeren, gemeente Stichtse Vecht, gemeente Hilversum, HISWA-Recron, het Watersportverbond, stichting Kievitsbuurten, Natuurmonumenten, Bewonersfederatie OVP		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: Zwevend slib en Waterplanten (1.7.2), Herstel legakkerlandschap (1.8).		

Resultaatbereik 2024

Beoogd resultaat

- De werkhaven de Rimboe en de Oostelijke Drecht zijn gebaggerd.
- Samen met de havens is een voorstel gemaakt voor het baggeren van de havens.
- Het beheerplan heeft vorm gekregen.
- Er is bestaat inzicht in en draagvlak voor de financiering en organisatie van de beheeropgave op langere termijn.

Bereikt resultaat

- De werkhaven van het Plassenschap is gebaggerd en voor de havens is een uitvoeringsregeling voorbereid waarmee private initiatieven financieel ondersteund kunnen worden.
- Voor het beheerplan wordt in het gebied gezocht naar depotlocaties voor schone bagger. Deze locaties worden als randvoorwaardelijk beschouwd om de beheerfase betaalbaar te houden. Deze zoektocht vordert en biedt zicht op enkele locaties.
- Het is nog onduidelijk of aanvullende financiering noodzakelijk is. De kosten worden eerst in beeld gebracht.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting
Huidige fase				
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 4.209.200	€ 6.967.086	
Herzien projectbudget		€ 4.712.230	€ 6.367.086	Fasebudget 2: € 2.215.000 Fasebudget 3: € 302.230 Voorbereiding: € 1.545.000
Totaal besteed	T/m 2023	€ 2.265.089	€ 2.265.089	
	In 2024	€ 226.894	€ 226.894	
	Totaal	€ 2.491.983	€ 2.491.983	
Resterend budget		€ 2.220.247	€ 3.875.103	

Doorkijk 2025

Verwacht resultaat

- De eerste havens zijn gestart met baggeren (ambitie is 15.000 m³).
- De depotlocatie(s) in het Plassengebied zijn bekend.
- De stuurgroep heeft een besluit genomen over de bijdrage aan oeverherstel op verschillende plekken in het gebied, onder andere in de Vuntus.
- De stuurgroep heeft een besluit genomen over de bijdrage aan en de afwerking van het depot in de Stille Plas.
- De stuurgroep heeft een besluit genomen over de ondersteuning van private baggerinitiatieven in het Plassengebied.

Risico's scope, planning, financiën

- De jachthavens gaan niet baggeren omdat zij de kosten, met inachtneming van de subsidie, toch te hoog vinden.
- Het baggeren van de Vuntus en de Stille plas (fase 3) kan pas na afronding van de havens worden vormgegeven, waardoor het moeilijk wordt om dit binnen de termijn van het programma te realiseren.
- Als de baggeroperatie in de Loosdrechtse Plassen herhaald moet worden, is het een uitdaging om dit binnen de programmaperiode uit te voeren. Dit vraagt om aanvullende financiering.

Project 1.7.2 Aanpak zwevend slib: helder water en ontwikkeling waterplanten

Projecttrekker(s)	Waterschap Amstel, Gooi en Vecht		
Projectraming volgens UVP	€ 6.050.000		
Fase project	Planuitwerking		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	Regiegroep 20 april 2023		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	De uitvoering loopt conform het in april 2023 vastgestelde plan van aanpak. De planuitwerking gaat in samenwerking met ingenieursbureau Tjhuis richting afronding. In 2025 wordt middels een geüpdatet plan van aanpak de uitvoeringsfase vastgelegd.		
Betrokken partijen	Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, provincie Noord-Holland, gemeente Wijdmeren, Plassenschap e.o.		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: Aanpak baggerproblematiek (1.7.1), Verbeteren waterkwaliteit (2.3), Herstel legakkerlandschap (1.8), Maatregelen voor moerasvogels (2.4) en Bestrijden van exoten (2.6)		

Resultaatbereik 2024

Beoogd resultaat

- In februari is opdracht verleend voor het uitwerken van het uitvoeringsplan voor het realiseren van luwtemaatregelen en een praktijkexperiment gericht op het vasthouden van slib.
- Het uitvoeringsplan is gereed, waarbij de locaties en ontwerpen voor de aanleg van luwtemaatregelen zijn vastgesteld.
- De benodigde vergunningen zijn in beeld en de aanvragen zijn gestart. De doorlooptijd is nog onbekend.
- Er is een programma voor monitoring opgesteld.
- Er is een praktijkexperiment gestart.

Bereikt resultaat

- In 2024 heeft ingenieursbureau Tjhuis een uitvoeringsplan gemaakt. Hierin zijn het ontwerp, de kansrijke locaties, het monitoringsplan en een vergunningstoets meegenomen. In het monitoringsplan staat beschreven hoe de monitoring van werking van de luwtestructuren plaatsvindt en hoe de ontwikkeling van onderwaterplanten achter de luwtestructuren gevolgd wordt. De verschillende praktijkexperimenten/onderzoeken zijn hieraan gekoppeld.
- De vergunningstoets heeft plaatsgevonden en de benodigde vergunningen zijn in beeld.
- De groei van waterplanten aan het wateroppervlak is geanalyseerd m.b.v. satellietbeelden en AI.

Projectcijfers per fase

		Huidig fase	Totaal project	Toelichting
Huidige fase		Planuitwerking		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 1.050.000	€ 3.650.000	
Herzien projectbudget			€ 1.651.661	De subsidie van € 1.880.000 is uit het budget gehaald; deze subsidie wordt elders verantwoord. Het projectbudget is verlaagd met € 118.339 t.b.v. dekking programma-kosten.
Totaal besteed	T/m 2023	€ 509.599	€ 509.599	
	In 2024	€ 92.079	€ 92.079	
	Totaal	€ 601.678	€ 601.678	
Resterend budget		€ 448.322	€ 1.049.983	

Doorkijk 2025

Verwacht resultaat

- Er ligt een vernieuwd plan voor de aanpak van de uitvoeringsfase voor de aanleg van luwtestructuren.
- Er ligt een beheerplan voor de luwtestructuren.
- De aanleg van de luwtestructuren is gestart.

Risico's scope, planning, financiën

- Er treedt vertraging op als gevolg van bezwaren van belanghebbenden of afspraken over het beheer.
- De kosten zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals ontwerp, inflatie, etc.
- De effectiviteit van de maatregelen blijkt tegen te vallen na intensief monitoren.

Project 1.8 Herstel en duurzaam behoud legakkerlandschap Kievitsbuurten

Projecttrekker(s)	Joke Nijburg		
Projectraming volgens UVP	€ 1.200.000 (uitvoering) Totaal € 2.100.000		
Fase project	Fase 3 stimuleringsregeling particulieren		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	April 2019		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	In 2024 zijn de pilots ecologisch gemonitord. De resultaten zijn in december 2024 besproken met Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Op basis hiervan gaat in 2025 de stimuleringsregeling voor particulieren in. De methodieken die toegepast kunnen worden zijn bekend en worden in deze regeling uitgewerkt. De verwachting is dat voor de zomer 2025 de regeling 'open' gaat. De monitoring van de pilots leidt tot een nuancering van de ecologische doelstelling voor de natuuroevers. Deze was (water) rietontwikkeling, maar er wordt nu ingezet op ontwikkeling met de kleine lisdodde in de startfase en riet en moerasvegetaties als doorgroeiperspectief.		
Betrokken partijen	Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Plassenschap Loosdrecht e.o, Vereniging Kievitsbuurten.		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: Baggeren (1.7), Betere waterkwaliteit (2.3), Maatregelen voor moerasvogels (2.4).		

Resultaatbereik 2024

Beoogd resultaat

- Uit de langere monitoringsperiode (in ieder geval geheel 2024 maar mogelijk ook nog in 2025) blijkt hoe de vegetatie zich op de legakkers en de vooroevers ontwikkelt.
- Eind 2024 is op basis van de ecologische monitoringsresultaten duidelijk hoe (water)riet groeit in bagger. Deze resultaten zijn ook van belang voor de toekomstige plannen voor de Nieuwe Polderplas.
- In overleg met Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is vastgesteld of en hoe voor 2024 de stimuleringsregeling openbaar gesteld kan worden voor particulieren.

Bereikt resultaat

- In overleg met het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zijn in december 2024 de conclusies van de monitoring afgestemd. Op basis hiervan kan de stimuleringsregeling gestart worden.
- De ecologische monitoring vindt ook in 2025 plaats.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting
Huidige fase		Realisatie		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 1.200.000	€ 2.100.000	In totaal is € 2.100.000 beschikbaar voor dit project. Het budget voor fase 1 en 2 is € 1.200.000. Voor fase 3, de stimuleringsregeling zelf, was oorspronkelijk € 900.000 begroot. Dit bedrag is bijgesteld naar € 868.320.
Herzien projectbudget		€ 1.218.275	€ 1.118.275	Projectbudget is met € 31.725,00 verlaagd t.b.v. dekking van de programmakosten. In 2024 is het budget met € 50.000,00 verhoogd voor een langere periode van het project en extra monitoring in 2025.
Totaal besteed	T/m 2023	€ 1.087.176,00	€ 1.087.176,00	Budget + € 25.000 euro doorgeschoven naar fase 3.
	In 2024	€ 73.594,00	€ 73.594,00	
	Totaal	€ 1.160.770,00	€ 1.160.770,00	
Resterend budget		€ 89.230,00	€ 957.460,00	Voor de stimuleringsregeling is € 868.320 beschikbaar.

Doorkijk 2025

Verwacht resultaat

- De methodieken die in de stimuleringsregeling mogen worden uitgerold, zijn nader gespecificeerd.
- De stimuleringsregeling is voor de zomer 2025 uitgewerkt en opengesteld.
- In het najaar vindt beoordeling en vervolgens vergunning plaats van de aanvragen.
- Particulieren kunnen met vooraf geselecteerde aannemers de uitvoering opstarten vanaf november 2025 (tot het broedseizoen in 2026).

Risico's scope, planning, financiën

- Er is een nuancering aangebracht voor het natuurdoel.
- De projectleider gaat ervan uit dat de planning wordt gehaald.
- De verwachting is dat het huidige budget toereikend is voor de werkzaamheden, monitoring 2025 en extra werkzaamheden aan de pilots.

Project 1.9 Kwaliteitsimpuls de Wijde Blik

Projecttrekker(s)	Natuurmonumenten		
Projectraming volgens UVP	€ 18.000 (Incl. btw)		
Fase project	Verkenningfase		
datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	10 april 2024		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	De verkenningfase van het project is afgerond. In 2024 is het verkenningdocument met alle stakeholders besproken. Half februari 2025 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden om het draagvlak en de haalbaarheid van de ecologie en de ecologische maatregelen nader te verkennen. Resultaat is dat alle partijen de ecologische/natuurmaatregelen omarmen en als kansrijk achten. Ze hebben aandachtspunten voor de volgende fase meegegeven. In de stuurgroep is € 51.000 gereserveerd voor de volgende fase, deze wordt (naar verwachting) in de loop van 2025 toegekend door de stuurgroep.		
Betrokken partijen	Ondernemers Wijde Blik, Natuurmonumenten, gemeente Wijdmeren, bewonersvereniging, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, provincie Noord-Holland, Vogelwerkgroep het Gooi, Vogelbescherming, Ravon, Omgevingsdienst NoordHollandNoord en een onafhankelijke ecooloog.		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met pijlers 1,2 en 3: bijv. Integreren recreatie en natuur (3.3) en Maatregelen voor Moerasvogels (2.4).		

Resultaatbereik 2024

Beoogd resultaat

- De verkenningfase is afgerond. Er bestaat draagvlak bij betrokken partijen en belanghebbenden voor het uitwerken van maatregelen in het schetsontwerp.
- De aandachtspunten vormen onderdeel van een voorlopig ontwerp (VO) en definitief ontwerp (DO).
- Er is (co)-financiering gevonden voor de volgende fase (VO en DO).

Bereikt resultaat

- De verkenning is afgerond. Er bestaat draagvlak bij betrokken partijen en belanghebbenden voor het uitwerken van maatregelen in het Schetsontwerp. Er zijn geen maatregelen afgevallen in deze fase.
- De financiering van de volgende fase is verkend en (gedeeltelijk) geborgd. Begin 2025 ontvangen de regie- en stuurgroep hiervan een voorstel.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting
Huidige fase				
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 18.000	€ 18.000	Het schetsontwerp is vanuit eigen middelen gefinancierd. Voor het afronden van de verkenningsfase heeft de stuurgroep OVP € 18.000 beschikbaar gesteld. Voor het voorlopig ontwerp en het definitief ontwerp is € 52.000 van het totaal-budget van € 102.000 vanuit het OVP gereserveerd. Stuurgroep OVP moet dit nog toekennen.
Herzien projectbudget		nvt		
Totaal besteed	T/m 2023	€ 0	€ 0	
	In 2024	€ 18.000	€ 18.000	Dit bedrag is besteed aan de inzet van een projectleider en ecooloog.
	Totaal	€ 18.000	€ 18.000	
Resterend budget		€ 0	€ 0	

Doorkijk 2025

Verwacht resultaat

- Het (gereserveerde) budget is beschikbaar gesteld vanuit het programma OVP en andere partijen (Natuurmonumenten, recreatieondernemers (uit belastingen), gemeente Wijdmeren, provincie Noord-Holland en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht).
- Met de beschikbaar gestelde middelen is toegewerkt naar een voorlopig ontwerp en definitief ontwerp.
- De financieringsmogelijkheden voor de realisatie zijn onderzocht.

Risico's scope, planning, financiën

- Bij het uitblijven van toekenning van middelen komt het project stil te liggen.

Project 1.10 Herstel vaarverbinding De Heul

Projecttrekker(s)	Gemeente Wijdmeren		
Projectraming volgens UVP	€ 600.000		
Fase project	Voorbereiding en Uitvoering		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	10-04-2024 en 26-06-2024		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Herstel vaarverbinding De Heul is een nieuw project binnen het programma OVP. Vanwege het belang van het behoud van deze vaarverbinding voor het recreatief product van de Oostelijke Vechtplassen heeft de stuurgroep besloten een deel van de resterende middelen uit de niet realiseerbare projecten voor de waterrecreatie (1.2 en 1.3) hieraan te besteden. Met deze besteding wordt voorkomen dat een belangrijke vaarverbinding wegvalt.		
Betrokken partijen	Gemeente Wijdmeren, gemeente Stichtse Vecht, gemeente Hilversum, provincie Noord-Holland, provincie Utrecht, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Plassenschap Loosdrecht e.o., Watersportverbond, Hiswa Recron en de Bewonersfederatie.		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang (vanwege financiering) met: Aanleg van nieuwe vaarverbindingen (1.3) en Alternatieve projecten waterrecreatie (1.2)		

Resultaatbereik 2024

Bereikt resultaat

- De stuurgroep heeft op 10 april een voorbereidingskrediet van € 50.000 vrijgegeven.
- Deze middelen zijn gebruikt om te komen tot een goed onderbouwd voorstel voor het herstel van de vaarverbinding, waarbij:
 - juridisch is aangetoond dat er geen precedentwerking volgt uit het herstellen van de vaarverbinding;
 - met lokale aannemers is samengewerkt aan een betaalbare variant;
 - met betrokken eigenaren een intentieovereenkomst is gesloten.
- Op 26 juni 2024 heeft de stuurgroep een uitvoeringsbudget van € 550.000,- vrijgegeven. Daarna heeft de gemeente Wijdmeren een start gemaakt met de voorbereidingen zodat de uitvoering voor het vaarseizoen van 2025 kan plaatsvinden.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting
Huidige fase		Uitvoering		
Budget goedgekeurd		€ 50.000		Vorbereidingskrediet
		€ 550.000	€ 600.000	Uitvoeringskrediet
Totaal besteed	in 2024		€ 119.479	De planvoorbereidingskosten zijn voor 26 juni gemaakt en de technische voorbereidingskosten na 26 juni. De notaris stuurt de factuur na de afronding in 2025. € 6790,- juridische rapportage. € 25.000,- projectleiding juridisch. € 49.245 technische kosten o.a. bouwkundige vooropname, constructieberekeningen leges, verplichte onderzoeken, tekeningen. € 38.444 vergoeding gerealiseerd deel.
	Totaal 2024		€ 119.479	
Resterend budget			€ 480.521	

Doorkijk 2025

Verwacht resultaat

De vaarverbinding is hersteld voor aanvang van het recreatieseizoen in 2025.

Risico's scope, planning, financiën

- Er kunnen zich onvoorziene kosten voordoen. Eventuele tegenvallende kosten kunnen hoogstwaarschijnlijk binnen de bijdragen worden opgevangen.
- Indien door onvoorziene omstandigheden de planning uitloopt (bijvoorbeeld door vrieskou), zijn de werkzaamheden mogelijk niet voor de start van het recreatieseizoen afgerond. De vaarverbinding blijft dan gesloten. Op dat moment moet de gemeente Wijdmeren bij de andere vaarverbinding extra maatregelen nemen om het vaarverkeer in goede banen te leiden. Hiermee is rekening gehouden in de post onvoorziën.

6

Pijler 2

Versterken ecologische waarden



Project 2.1 Natuurontwikkeling (NNN) Kortenhoef Oost

Projecttrekker(s)	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 1.950.000		
Fase project	Planvorming		
Datum goedkeuring huidig PVA (SG/RG)	December 2024		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	In maart 2024 is het proces in de planvormingsfase terechtgekomen. In deze fase voeren we met alle grondeigenaren individuele gesprekken, waardoor de toegevoegde waarde van Baken en Vlek in de projectgroep komt te vervallen. Omdat er ambtelijk te kennen is gegeven dat de kans van slagen van het plan Afvalzorg nihil is, neemt ook Afvalzorg niet meer deel aan de projectgroep. De projectgroep gaat daarom in afgeslankte vorm verder met Natuurmonumenten, LTO, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, gemeente Wijdmeren en de provincie Noord-Holland. Met het wegvallen van het NPLG, het PPLG en het transitiefonds, is er onvoldoende geld om voor heel Noord-Holland de integrale PPLG-opgaven te realiseren. Dit dwingt tot het maken van keuzes. De scope met integrale benadering binnen het programma OVP wordt enigszins losgelaten. De focus gaat naar NNN-realiseatie, omdat dat ook een positief effect heeft op de overige doelen. Qua planning en voortgang hangt eea af van de bestuurlijke besluiten in 2025. In oktober 2024 hebben de Gedeputeerde Staten het besluit genomen om saneringsmaatregelen uit te laten voeren op de voormalige vuilstort Groenewoud. Dit heeft een positief effect op het gebiedsproces, dat daardoor in een stroomversnelling is geraakt. De voorbereidingen voor sanering zijn gestart. De verwachting is dat begin 2027 de uitvoering begint. Deze neemt 1-1,5 jaar in beslag.		
Betrokken partijen	Natuurmonumenten, Waterschap Amstel Gooi en Vecht, gemeente Wijdmeren, LTO Noord.		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: Natuurontwikkeling Kortenhoef West (2.1.3), Natuurontwikkeling Ankeveen (2.2.1) en de sanering van de voormalige vuilstort Groenewoud (geen onderdeel van het programma OVP).		

Resultaatbereik 2024

Beoogd resultaat

Het concept inrichtingsplan is gereed en de eerste gesprekken met grondeigenaren hebben plaatsgevonden.

Bereikt resultaat

- Het eco- en hydrologisch onderzoek is na een second opinion afgerond en is begin 2024 (met opmerkingen vanuit projectgroep) gepubliceerd.
- Afvalzorg heeft het Onderzoek saneringsmaatregelen Groenewoud uitgevoerd en dit onderzoek is in mei gepubliceerd.

- De planvormingsfase is gestart in maart. De samenstelling van de projectgroep is daarop aangepast.
- De ecologische ambitiekaart is gepubliceerd in juni en gepresenteerd op een bewonersavond in juli. Totaal bezochten circa 200 mensen deze avond.
- Het Plan van aanpak is opgesteld en gepubliceerd.
- Er is een kostenraming gemaakt voor het gebiedsproces Kortenhoef Oost.
- In oktober hebben Gedeputeerde Staten besloten de voormalige vuilstort Groenewoud te saneren.
- Het gepubliceerde Plan van aanpak is aangepast.
- initiatieven vanuit het gebied worden opgepakt. Enkele perceeleigenaren hebben contact opgenomen met de provincie om de mogelijkheden voor zelfrealisatie te bespreken.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting
Huidige fase		Verkenning		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 474.180	€ 1.950.000	
Herzien projectbudget			€ 1.855.314	Het projectbudget is verlaagd t.b.v. de dekking programmakosten.
Totaal besteed	T/m 2023	€ 156.251	€ 156.251	
	In 2024	€ 0	€ 0	Het budget uit het programma OVP is bestemd voor de realisatiefase.
	Totaal	€ 156.251	€ 156.251	
Resterend budget		€ 317.929	€ 1.699.063	

Doorkijk 2025

Verwacht resultaat

- Met als uitgangspunt dat er voldoende geld is, heeft de provincie eind 2025 alle grondeigenaren individueel gesproken en bestaat een goed beeld van het vervolgtraject.
- Mochten eigenaren geen contact wensen, dan maken we een inrichtingsplan zonder hun inspraak.
- De uitvraag voor het inrichtingsplan is gegund en er is gestart met het opstellen ervan.
- De uitvraag voor planologische wijziging is gegund en de voorbereidingen zijn begonnen.

Risico's scope, planning, financiën

- Er is onvoldoende financiële ruimte vanuit de provincie voor grondaankopen en proceskosten.
- Er is onvoldoende (bestuurlijk en/of politiek) draagvlak voor de plannen.
- De beschikbare kennis en capaciteit bij betrokken partijen zijn onvoldoende.

Project 2.1 Natuurontwikkeling (NNN) Kortenhoef West

Projecttrekker(s)	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 588.000		
Fase project	Verkenning		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	Nog geen PvA		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Vanuit prioritering heeft de provincie Noord-Holland besloten de natuurontwikkeling in Kortenhoef West op de lange termijn op te pakken. Daarnaast wordt gewacht op het eco- en hydrologisch onderzoek. Dit onderzoek start naar verwachting medio 2025 en duurt ongeveer een jaar. Dat betekent dat het rapport eind 2026 kan worden vastgesteld en het gebiedsproces in 2027 vervolg krijgt. De focus binnen het programma OVP ligt op Kortenhoef Oost, Weersloot, Ster van Loosdrecht en Het Hol. Daarmee is er geen capaciteit meer voor Kortenhoef West. De provincie probeert wel dossiers op te pakken die zichzelf aanmelden, maar geeft geen garantie voor de uitvoering.		
Betrokken partijen	Natuurmonumenten, gemeente Wijdmeren, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, LTO Noord, Baken (op afstand).		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: Natuurontwikkeling Kortenhoef Oost (2.1.1) en Natuurontwikkeling Ankeveen (2.1.2).		

Resultaatbereik 2024

Beoogd resultaat

De verkenningsfase is gestart. Dit is inclusief het eco- en hydrologisch onderzoek. Dit onderzoek moet een goed beeld geven van de natuur- & watermogelijkheden in het gebied.

Bereikt resultaat

- In de loop van 2024 is duidelijk geworden dat er (door het wegvallen van het transitiefonds) geen geld meer is. Eind 2024 heeft de provincie besloten de gebiedsprocessen in Kortenhoef West en Ankeveen op de lange baan te schuiven. Het eco- en hydrologisch onderzoek voor deze gebieden heeft vertraging opgelopen.
- Initiatieven vanuit het gebied zijn opgepakt. In 2024 hebben enkele perceeleigenaren contact opgenomen met de provincie om de mogelijkheden voor zelfrealisatie te bespreken.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting
Huidige fase		Verkenning		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 50.000	€ 588.000	
Herzien projectbudget			€ 558.839	Projectbudget is verlaagd t.b.v. de dekking van de programmakosten.
Totaal besteed	T/m 2023	€ 0	€ 0	
	In 2024	€ 0	€ 0	Budget OVP is bestemd voor de realisatiefase.
	Totaal	€ 0	€ 0	
Resterend budget		€ 50.000	€ 558.839	

Doorkijk 2025

Verwacht resultaat

- Het eco- en hydrologisch onderzoek is gestart.
- De provincie pakt Initiatieven vanuit het gebied op.
- Voorlopig voert de provincie geen actief gebiedsproces in Kortenhoef West.

Risico's scope, planning, financiën

- Er is onvoldoende (bestuurlijk en/of politiek) draagvlak voor de plannen.
- Verlies van momentum in het gebied door vertraging en het gebrek aan contact.

Project 2.1 Natuurontwikkeling (NNN) Ankeveen (HAP/SAP)

Projecttrekker(s)	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 1.270.500		
Fase project	Verkenning		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	30 oktober 2021		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Vanuit prioritering heeft de provincie besloten het gebiedsproces in Ankeveen pas op de langere termijn op te pakken. Daarnaast wordt gewacht op de resultaten van het eco- en hydrologisch onderzoek. Dit onderzoek start naar verwachting medio 2025 en duurt ongeveer een jaar. Dat betekent dat het rapport eind 2026 kan worden vastgesteld en het gebiedsproces in 2027 vervolg krijgt. De focus binnen het programma OVP ligt op Kortenhoef Oost, Weersloot, Ster van Loosdrecht en Het Hol. Daarmee is er geen capaciteit meer voor Ankeveen; wel wordt Ankeveen meegenomen in het hierboven beschreven onderzoek. De provincie probeert daarnaast dossiers op te pakken waarbij partijen zichzelf aanmelden, maar geeft geen garantie voor de uitvoering.		
Betrokken partijen	Natuurmonumenten, gemeente Wijdmeren, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, LTO Noord, Baken.		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: Natuurontwikkeling Kortenhoef Oost (2.1.1) en Natuurontwikkeling Kortenhoef West (2.1.3).		

Resultaatbereik 2024

Beoogd resultaat

De verkenningfase is gestart, en daarmee ook het eco- en hydrologisch onderzoek. Dit onderzoek moet een goed beeld geven van de natuur- en watermogelijkheden in het gebied.

Bereikt resultaat

- Het eco- en hydrologisch onderzoek heeft vertraging opgelopen. Hierdoor is actualisatie van het plan van aanpak nodig. Daarna kan er een nieuwe ambitiekaart worden opgesteld.
- In 2024 is er weinig tot geen actie ondernomen in relatie tot het gebiedsproces Ankeveen.
- De provincie pakt initiatieven vanuit het gebied op. In 2024 hebben enkele perceeleigenaren contact opgenomen met de provincie om de mogelijkheden voor zelfrealisatie te bespreken.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting
Huidige fase		Verkenning	-	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 201.185	€ 1.270.500	
Herzien projectbudget			€ 1.206.622	Het projectbudget is verlaagd t.b.v. dekking van de programmakosten.
Totaal besteed	T/m 2023	€ 19.492	€ 19.492	
	In 2024	€ 0	€ 0	De financiën in de verkennende fase komen vanuit het budget NNN-regiebureau.
	Totaal	€ 19.492	€ 19.492	
Resterend budget		€ 181.693	€ 1.187.130	

Doorkijk 2025

Verwacht resultaat

- Het eco- en hydrologisch onderzoek is gestart.
- Er gebeurt in 2025 weinig in Ankeveen vanuit het gebiedsproces.

Risico's scope, planning, financiën

- Er bestaat onvoldoende (bestuurlijk en/of politiek) draagvlak voor de plannen.
- Verlies van momentum in het gebied door vertraging en het gebrek aan contact.

Project 2.1 Natuurontwikkeling (NNN) Weersloot

Projecttrekker (s)	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 2.385.500		
Fase project	Planvorming		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	10 april 2021		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	In de zomer van 2024 werd het NPLG en het bijbehorende transitiefonds afgeschaft. Desondanks blijft in het gebiedsproces Weersloot de scope ongewijzigd, namelijk realisatie van NNN. In 2024 zijn op basis van het gebiedsaanbod van de vereniging Weersloot de mogelijkheden voor een grondruil verkend en is gestart met de voorbereiding. Met deze grondruil kan een deel van NNN in het gebied worden gerealiseerd.		
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten, Vereniging Weersloot en andere grondeigenaren.		
Samenhang andere projecten			

Resultaatbereik 2024

Beoogd resultaat

- (Her)bevestiging heeft plaatsgevonden van de scope van het project, inclusief aanvullende opgaven KRW, N2000 en waar mogelijk uit het PPLG (stikstof, klimaat, water- en bodemsturend, recreatie).
- Er is gestart met het opstellen van een inrichtingsplan voor het hele Weerslootgebied, onder andere op basis van de inrichtingsplannen van grondeigenaren op perceelsniveau.
- De opdracht is verleend voor een eco- en hydrologisch onderzoek op enkele percelen in het gebied.

Bereikt resultaat

- De voorbereiding van een kavelruil in de Weersloot heeft plaatsgevonden. Met de kavelruil kan een deel van de NNN-opgave (ongeveer 25,6 hectare) worden gerealiseerd in het gebied. Een groot deel van de grondeigenaren in het gebied is geïnteresseerd in zelfrealisatie. Hiervoor stellen zij een kavelruil voor met Natuurmonumenten en de provincie. In overleg met Natuurmonumenten en in opdracht van de provincie is de voorbereiding gestart.
- Voor een deel van de grondeigenaren zijn inrichtingsplannen opgesteld op perceelsniveau.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting
Huidige fase		Verkenning		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 400.000	€ 2.385.000	
Herzien projectbudget			€ 2.275.275	Het projectbudget is verlaagd t.b.v. dekking van de programmakosten.
Totaal besteed	T/m 2023	€ 332.065	€ 332.065	
	In 2024	€ 0	€ 0	
	Totaal	€ 332.065	€ 332.065	
Resterend budget		€ 67.935	€ 1.943.210	

Doorkijk 2025

Verwacht resultaat

- De uitvoering van de kavelruil is gestart.
- De opdracht is verleend en er is gestart met het uitvoeren van het eco- en hydrologisch onderzoek op enkele percelen in het gebied.
- De opdracht is verleend en de uitvoering gestart van het opstellen van een overkoepelend inrichtingsplan voor het Weerslootgebied. Dit is inclusief inrichtingsplannen op perceelsniveau.
- Er hebben gesprekken plaatsgevonden met grondeigenaren die niet meedoen met de grondruil waarbij is gesproken over de natuurontwikkeling op hun percelen.
- Er is een start gemaakt met de planologische procedure om de bestemming van de gronden te wijzigen van agrarisch naar natuur. Hierover voert de provincie overleg met de gemeente Wijdereen.

Risico's scope, planning, financiën

- De provincie heeft het gebiedsproces stilgelegd door gebrek aan financiële middelen.
- Er is onvoldoende (bestuurlijk en/of politiek) draagvlak voor de plannen.
- Er wordt onvoldoende resultaat bereikt op het gebied van natuurontwikkeling.
- Er doen zich op basis van aanvullend onderzoek milieutechnische risico's voor.

Project 2.1 Natuurontwikkeling (NNN) Ster van Loosdrecht

Projecttrekker(s)	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 2.691.000		
Fase project	Verkenning / planuitwerking		
Datum goedkeuring huidig PVA (SG/RG)	10 april 2021		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Het gebiedsproces in de Ster van Loosdrecht heeft vertraging opgelopen door de onzekerheden die het vervallen van het transitiefonds met zich meebrengt. Daarnaast hebben gesprekken over maatwerk-afspraken met de vereniging de Ster van Loosdrecht meer tijd gevraagd dan verwacht. De keukentafel-gesprekken kunnen weer opgestart worden in afwachting van duidelijkheid over financiën. Capaciteit blijft een aandachtspunt.		
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland, gemeente Wijdmeren, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Natuurmonumenten, Vereniging Ster van Loosdrecht en aangesloten grondeigenaren.		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: Recreatieve routes (1.1) en Fauna-passages (2.3)		

Resultaatbereik 2024

Beoogd resultaat

- De scope van het project is herbevestigd. Dit is inclusief eventuele aanvullende opgaven KRW, stikstof en N2000.
- Er is een akkoord gesloten met de Vereniging Ster van Loosdrecht over een nieuw uitvoeringsprogramma (2024 en verder) en zo nodig is de bestaande overeenkomst tussen vereniging en provincie aangepast. Onderdeel hiervan vormt de overeenstemming over maatwerkafspraken Kruiden- en faunarijk grasland.
- Er is overeenstemming bereikt met de individuele leden van Vereniging Ster van Loosdrecht.
- De opdracht is verleend en het eco- en hydrologisch onderzoek is gestart op enkele percelen in het gebied.

Bereikt resultaat

- De voorbereidingen zijn gestart voor de plan- en uitvoeringsfase (planningen, ramingen ed).
- Met het bestuur van de Vereniging de Ster van Loosdrecht vinden (met behulp van een mediator) gesprekken plaats over maatwerkafspraken. De provincie Noord-Holland en het bestuur van de vereniging vertrouwen op maatwerk waar de vereniging achter kan staan.
- De uitnodigingen voor de keukentafelgesprekken zijn gereed.
- De uitvraag van het eco- en hydrologisch onderzoek is gereed. Dit onderzoek wordt begin 2025 op de markt gezet.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting
Huidige fase		Verkenning		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 300.000	€ 2.691.000	
Herzien projectbudget			€ 2.246.809	Het projectbudget is verlaagd t.b.v. dekking van de programmakosten en inhuur capaciteit.
Totaal besteed	T/m 2023	€ 107.992	€ 107.992	
	In 2024	€ 0	€ 0	Het budget van het programma OVP is bestemd voor de realisatiefase.
	Totaal	€ 107.992	€ 107.992	
Resterend budget		€ 192.008	€ 2.138.817	

Doorkijk 2025

Verwacht resultaat

- De ambitiekaart is herzien.
- Het eco- en hydrologisch onderzoek is gestart.
- De inkoop wordt gestart voor een overkoepelend inrichtingsplan en planologische procedure. Dit laatste is inclusief participatieplan en bestuurlijke besluitvorming over Startnotitie.
- Er is een akkoord bereikt met de Vereniging Ster van Loosdrecht over een nieuw uitvoeringsprogramma (2024 en verder).
- Circa 20 eigenaren tekenen voor NNN-realisatie. Daarmee zijn 15 inrichtingsplannen gereed.
- Er vindt (her)bevestiging plaats van de scope van het project, inclusief eventuele aanvullende opgaven KRW, stikstof en N2000.

Risico's scope, planning, financiën

- Door tijdelijk capaciteitstekort loopt het proces vertraging op.
- Er bestaat onvoldoende (bestuurlijk en/of politiek) draagvlak voor de plannen.
- Er wordt onvoldoende natuurontwikkeling behaald.
- Er doen zich op basis van aanvullend onderzoek milieutechnische risico's voor.
- Er vindt een scopewijziging plaats door aanvullingen uit het PPLG en/of vanuit de Rijksoverheid.

Project 2.1 Natuurontwikkeling (NNN) Vuntus

Projecttrekker(s)	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 599.000		
Fase project	Verkenning		
Datum goedkeuring huidig PVA (SG/RG)	10 april 2021		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Door het vervallen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en het Transitiefonds moet de provincie een keuze maken in de fasering van de gebiedsprocessen. In de Oostelijke Vechtplassen zet de provincie voornamelijk in op realisatie van NNN in de Weersloot, Ster van Loosdrecht, Kortenhoeve Oost en Het Hol. De NNN-realisatie in de Vuntus wordt op een later moment weer opgepakt. In 2024 is prioriteit gegeven aan de uitwerking van de opgaven rondom het VONA-terrein.		
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland, gemeente Wijdereen, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Natuurmonumenten.		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: Recreatieve routes (1.1) en Faunapassages (2.3).		

Resultaatbereik 2024

Beoogd resultaat

- Er vindt bestuurlijke afweging plaats over hoe om te gaan met tuineigenaren VONA over de toepassing van de menukaart 'ecologische meerwaarde'.
- De inrichting van de 2 ecologische verbindingen over het VONA-terrein heeft plaatsgevonden.
- De verkenningsfase is afgerond voor de overige delen van Vuntus, inclusief een visie op de inrichting van het gebied en bijbehorende afstemming met stakeholders en grondeigenaren.
- Er is een uitvoeringsstrategie gemaakt voor de provinciale percelen in het oostelijk deelgebied van de Vuntus, inclusief de aanpalende watergang (o.b.v. inrichtingsschets).

Bereikt resultaat

- Voor het VONA-terrein is een alternatieve NNN-strategie opgesteld. De provincie voert hierover intern overleg waarna bestuurlijke afweging plaatsvindt.
- Eén van de twee beoogde ecologische verbindingen over het VONA-terrein is gerealiseerd. Voor de ander is een inrichtingsschets opgesteld.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting
Huidige fase		Verkenning		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 190.000	€ 599.000	
Herzien projectbudget			€ 573.149	Het projectbudget is verlaagd t.b.v. de dekking van de programmakosten.
Totaal besteed	T/m 2023	€ 130.520	€ 130.520	
	In 2024	€ 26.287	€ 26.287	
	Totaal	€ 156.807	€ 156.807	
Resterend budget		€ 33.192	€ 416.342	

Doorkijk 2025

Verwacht resultaat

Naar verwachting wordt in 2025 de tweede ecologische verbinding over het VONA-terrein aangelegd.

Risico's scope, planning, financiën

Het wegvallen van het transitiefonds zorgt in de hele Oostelijke Vechtplassen voor een risico in de NNN-realiseatie.

Project 2.1 Natuurontwikkeling (NNN) Het Hol

Projecttrekker(s)	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 900.000		
Fase project	Projectvoorbereiding		
Datum goedkeuring huidig PVA (SG/RG)	31 maart 2018		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Op 5 april 2023 is de scope van het project bijgesteld. De uitvoering van het herstel- en inrichtingsplan is gesplitst in 2 onderdelen die volgtijdelijk worden uitgevoerd: • fase 1 baggeren en aanpassing watersysteem • fase 2 de natuurinrichting De uitvoering van fase 1 vindt plaats onder verantwoordelijkheid van Natuurmonumenten. provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor fase 2. In 2024 is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen de provincie, Natuurmonumenten en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Op 20 augustus 2024 heeft Gedeputeerde Staten besloten dat gedeputeerde Rosan Kocken als portefeuillehouder Natuur de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) project het Hol ondertekent. Daarmee is de SOPK vastgesteld. Het totale budget is vastgesteld op €10.600.000. Dit bedrag wordt gedekt door een aantal subsidies waaronder SPUK-gelden. Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht stelt voor fase 1 € 250.000,- beschikbaar. In 2024 zijn de eerste baggerwerkzaamheden gestart.		
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: Verbeteren waterkwaliteit (2.3) en Bestrijding exoten (2.5.3).		

Resultaatbereik 2024

Beoogd resultaat

- De voorbereidingen voor het aanpassen van het watersysteem en baggerwerkzaamheden ten behoeve van KRW-doelstellingen zijn gestart. Het bestek is opgesteld en de vergunning is aangevraagd.
- Er zijn afspraken vastgelegd over de nieuwe ontsluiting voor toekomstige beheer.
- Er heeft een herstart plaatsgevonden van de grondverwerving.

Bereikt resultaat

- Natuurmonumenten heeft de baggerwerkzaamheden aanbesteed, vergunningen verleend en de eerste baggerwerkzaamheden zijn uitgevoerd.
- De samenwerkingsovereenkomst is vastgesteld en alle drie de partijen hebben ondertekend.
- De gesprekken met de grondeigenaren van de percelen binnen de NNN-grenzen lopen.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting
Huidige fase		Vorbereiding		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 900.000	€ 900.000	
Herzien projectbudget				
Totaal besteed	T/m 2024	€ 373.487	€ 373.487	
Resterend budget		€ 526.513	€ 526.513	

Toelichting tabel: Totale budget project is €10.600.000,; een groot deel van het budget bestaat uit subsidies aan Natuurmonumenten en is reeds beschikt. Het deel projectvoorbereiding door de provincie is opgenomen in de tabel.

Doorkijk 2025

Verwacht resultaat

- Fase 1 is uitgevoerd: de baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd in de winters van 2024/2025, 2025/2026 en 2026/2027.
- Voorbereidingen voor de uitvoering fase 2 (natuurinrichting) hebben plaatsgevonden, inclusief het opstellen van het inrichtingsplan.
- Gesprekken over verwerving van percelen heeft geleid tot de eerste afspraken.
- Het omgevingsplan is aangepast.

Risico's scope, planning, financiën

- Een risico is het intensieve agrarisch gebruik uit het verleden. Dit beïnvloedt de natuurpotentie negatief. Een voorbeeld hiervan is uitstroom van nutriënten.
- Uitloop in tijd doordat de bagger in de tijdelijke depots meer tijd nodig heeft om in te drogen. Hierdoor kunnen de inrichtingsmaatregelen van fase 2 later dan gepland worden uitgevoerd.

Project 2.2a Ecologische verbindingen - N201

Projecttrekker(s)	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 2.071.000		
Fase project	Planuitwerking		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	Dit project is voor 2017 gestart en gefinancierd, dus zonder inmenging van de Stuurgroep OVP.		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	In 2021 heeft herijking van het project (faunamaatregelen, vervanging bruggen, onderhoud, en overige maatregelen) plaatsgevonden om de scope en integraliteit van de maatregelen helder te krijgen. Dit is vastgelegd in een projectwijziging en vastgesteld in het opdrachtenloket. Op basis van de herijking is ook de planning bijgesteld. In 2022 is opdracht verleend aan Arcadis voor het opstellen van een voorlopig ontwerp. In 2023 is de opdracht ingetrokken i.v.m. het in gebreke blijven van Arcadis.		
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland, gemeente Wijdereen, gemeente Hilversum, Regio Gooi en Vechtstreek, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, gebiedsaannemer, ingenieursbureau, particuliere grondeigenaren en ondernemers.		
Samenhang andere projecten	Het realiseren van de faunapassages valt onder een traject-benaderingsproject. Dit betekent dat de uitvoering van de faunapassages is gekoppeld aan onderhoudswerkzaamheden en het vervangen van twee bruggen van de N201. Dit laatste wordt in 2025 uit het project gehaald en gaat als apart project naar INFRA. Er bestaat samenhang met de infra- en natuur-ontwikkelingsprojecten in het gebied, waaronder Het Hol, aanpassingen Zuwe en de aansluiting met het Utrechts deel van de N201.		

Resultaatbereik 2024

Beoogd resultaat

- Er is een doorstart gemaakt met het voorlopig ontwerp.
- Het hergebruik van liggers A9 krijgt een inpassing in het voorlopig ontwerp van de 2 vaste kunstwerken.

Bereikt resultaat

De liggers voor hergebruik zijn aangekocht van Rijkswaterstaat en opgeslagen op het terrein van de provincie Noord-Holland.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting
Huidige fase		Planuitwerking	-	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 2.071.000	€ 2.071.000	
Herzien projectbudget				
Totaal besteed	T/m 2023	€ 343.006	€ 343.006	
	In 2024	€ 155.989	€ 155.989	
	Totaal	€ 498.995	€ 498.995	
Resterend budget		€ 1.572.005	€ 1.572.005	

Doorkijk 2025

Verwacht resultaat

- Het project wordt gesplitst in 2 delen. Het betreft enerzijds het groot onderhoud en de faunapassages en anderzijds de vervanging van de 2 vaste kunstwerken.
- Het groot onderhoud is uitgevoerd en de faunapassages m.u.v. de faunapassages in de 2 vaste kunstwerken zijn gerealiseerd.

Project 2.2b Faunapassages

Projecttrekker(s)	Provincie Noord-Holland (directie B&U)		
Projectraming volgens UVP	€ 1.800.000		
Fase project	Planuitwerking		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	Regiegroep: 10-02-2022 Stuurgroep: 30-03-2022		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Gezien een taakstellend budget voor dit project, blijven de financiën en ook de scope binnen de vastgestelde kaders. Zoals verwacht komen niet alle locaties tot uitvoering. Volgens het plan van aanpak loopt de planning achter. Het schrijven van een uitvraag en het (in samenwerking met de betrokken partijen) komen tot de verschillende voorontwerpen heeft meer tijd gekost dan gepland. De verwachting is dat de uitvoering van de fauna-passages voor eind 2027 is afgerond.		
Betrokken partijen	Gemeente Wijdmeren, Regio Gooi & Vecht, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Natuurmonumenten, provincie Noord-Holland en particuliere grondeigenaren.		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: sanering voormalige vuilstort Groenewoud, werkzaamheden Hollands End, werkzaamheden Kooibrug, werkzaamheden bushalte Oud-Loosdrechtsdijk (geen OVP-projecten).		

Resultaatbereik 2024

Beoogd resultaat

- Het ingenieursbureau levert de voorontwerpen op.
- In overleg met samenwerkingspartners is een prioriteitenlijst opgesteld.
- Er bestaat een met partners afgestemde planning voor de aanleg van de faunapassages.
- Het ingenieursbureau heeft opdracht voor diverse locaties een definitief ontwerp en aanbestedingsdocumenten op te stellen.

Bereikt resultaat

- Het ingenieursbureau heeft de voorontwerpen opgeleverd.
- Bewoners zijn tijdens een informatieavond bijgepraat over de verkregen voorontwerpen.
- Met samenwerkingspartners is een prioriteitenlijst van locaties opgesteld.
- Er bestaat overzicht van andere werkzaamheden en koppelkansen voor de uitvoering.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting
Huidige fase		Planvorming		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€1.742.384	€ 1.800.000	
Herzien projectbudget			€ 1.742.384	Na herziening 2022.
Totaal besteed	T/m 2023	€ 98.427	€ 98.427	Uitgave voor Gele brug Ankeveen.
	In 2024	€ 228.753	€ 228.753	Er is opdracht verstrekt aan een ingenieurbureau voor het verkrijgen van voorontwerpen en het begeleiden van een bewonersavond.
	Totaal	€ 347.180	€ 347.180	
Resterend budget		€ 1.395.204	€ 1.395.204	

Doorkijk 2025

Verwacht resultaat

- De twee loopplanken (Kooibrug en Kattenbrug) zijn gerealiseerd.
- De benodigde conditionerende onderzoeken (waaronder proefsleuven kabels en leidingen) zijn uitgevoerd.
- De beheerafspraken/-overeenkomsten zijn gemaakt.
- De inkoop van het opstellen (ingenieurbureau) en vervolgens uitvoeren (door een aannemer of bouwteam) van het definitief ontwerp heeft plaatsgevonden.

Risico's scope, planning, financiën

- Het projectbudget is ontoereikend waardoor niet alle passages kunnen worden aangelegd en een lagere ecologische waarde wordt bereikt.
- De beheerkosten zijn niet gedekt in het project en er wordt geen budget voor gevonden. Hierdoor worden het benodigde beheer en onderhoud niet uitgevoerd en kan geen beheerplan worden opgesteld.
- Aanwezige kabels en leidingen kunnen (financieel of technisch) niet worden verlegd en maken de aanleg van een faunapassage onder de weg onmogelijk. Dit levert een lagere ecologische waarde op.

Project 2.3 Verbeteren waterkwaliteit

Projecttrekker(s)	Waterschap Amstel, Gooi en Vecht		
Projectraming volgens UVP	€ 4.350.000		
Fase project	Planuitwerking en realisatie		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	12 december 2018		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Met een maatregelpakket is het waterschap op weg om de waterkwaliteit te verbeteren en daarmee de doelen van de Kaderrichtlijn Water te behalen. De planning van de maatregelen geeft aan dat de meeste projecten voor eind 2027 gerealiseerd zijn, waarbij enkele projecten een langere doorlooptijd hebben in de realisatiefase, tot uiterlijk 2030 (bron: Jaarrapportage KRW maatregelen 2024).		
Betrokken partijen	Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, gemeente Wijdmeren, gemeente Hilversum, Natuurmonumenten en diverse bewonersverenigingen.		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: Aanpak zwevend slib (1.7.2), Herstel legakkerlandschap (1.8) en Natuurontwikkeling (2.1).		

Resultaatbereik 2024

Beoogd resultaat

- Er is een besluit genomen over de meest doelmatige maatregel voor vermindering van de fosfaatbelasting vanuit het Hilversums Kanaal naar Kortenhoef.
- De planvormingsfase voor de drie defosfateringsinstallaties is afgerond.
- De werkzaamheden voor herstel van het kwelwater in Het Hol zijn gestart.
- In de Hollands Ankeveense Plassen is een gemaal geopend en in gebruik genomen.

Bereikt resultaat

- Er is nog geen besluit genomen over de maatregel die zorgt voor verminderde fosfaatbelasting vanuit het Hilversums Kanaal naar Kortenhoef. Dit komt doordat er onvoldoende inzicht in de effectiviteit en haalbaarheid bestaat.
- De realisatie van de drie zuiveringsinstallaties is in voorbereiding.
- De waterkwaliteitsmaatregel voor Het Hol en de Suikerpot (herstel invloed kwelwater) is opgenomen in het inrichtings- en herstelplan voor Het Hol. De werkzaamheden zijn gestart.
- De waterkwaliteitsmaatregel in Hollands Ankeveen 'omleiden waterstroom vanuit het achterland Hollands Ankeveense Plassen: gemaal Loodijk' is gerealiseerd. Deze zorgt ervoor dat fosfaatrijk water niet meer in de plassen terechtkomt, maar naar een andere plek in de polder wordt afgevoerd.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting
Huidige fase				
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 0	€ 4.350.000	
Herzien projectbudget				
Totaal besteed	T/m 2023	€ 0	€ 0	De uitvoering van de in het uitvoeringsprogramma opgenomen KRW-maatregelen ligt bij het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Om deze reden blijven de financiën bij het waterschap i.p.v. dat zij via de gezamenlijke rekening bij het Groenfonds lopen.
	In 2024	€ 0	€ 0	
	Totaal	€ 0	€ 0	
Resterend budget		-	€ 4.350.000	

Doorkijk 2025

Verwacht resultaat 2024

- Er is besloten over een maatregel die de fosfaatbelasting vanuit het Hilversums Kanaal naar Kortenhoef vermindert.
- Designs voor de drie zuiveringsinstallaties zijn uitgewerkt.
- De werkzaamheden in Het Hol zijn gevorderd tot baggeren en het maken van een nieuwe waterroute.

Risico's scope, planning, financiën

De KRW is een Europese Richtlijn die alle lidstaten moeten naleven. Op Europees en nationaal niveau zijn afspraken gemaakt over de invulling van de verplichtingen die uit de richtlijn voortvloeien. Zo moeten in 2027 alle maatregelen genomen zijn om de wateren in 'goede toestand' te krijgen. Bij oppervlaktewateren gaat dit zowel over een 'goede chemische toestand' als een 'goede ecologische toestand'.

Project 2.4.3a Planuitwerking natuurmaatregelen voor moerasvogels

Projecttrekker(s)	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 2.600.000		
Fase project	Planuitwerking		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	28 juni 2023		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Op basis van uitvoerbaarheid, beheerbaarheid, risico's en de hoogste potentie voor moerasvogels zijn de gebieden Hollands Ankeveen, Kortenhoef West en de Loosdrechtse Plassen geselecteerd. De Stuurgroep OVP heeft op 28 juni 2023 de keuze van maatregelen voor de moerasvogels voor deze drie deelgebieden bekrachtigd. Inrichtingsfase Ingenieursbureau RHDHV heeft de definitieve ontwerpen in een RAW-bestek uitgewerkt. Middels een aanbestedingsprocedure is de aannemer voor de uitvoering van het werk (voorlopig) gegund. Tevens zijn middels een aanbestedingsprocedure de directievoerder en toezichthouder gegund. Zij controleren namens de opdrachtgever Provincie Noord-Holland of de aannemer het werk goed en volgens de geldende regelgeving uitvoert. Vergunningen De gemeente Wijdmeren heeft de omgevingsvergunning verstrekt en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de Watervergunning. Realisatiefase Er is ruim een jaar vertraging ontstaan in de realisatie omdat de Provincie Noord-Holland en Natuurmonumenten een uitvoeringsovereenkomst moeten opstellen en ondertekenen vóór aanvang van de realisatie. De onderhandelingen hierover werden te complex. De provincie heeft de aanbesteding stopgezet en de werkzaamheden in de gebieden Hollands Ankeveen en Kortenhoef West overgedragen aan Natuurmonumenten (grondeigenaar). De provincie blijft opdrachtgever voor de werkzaamheden op de Loosdrechtse Plassen De werkzaamheden in Hollands Ankeveen en Kortenhoef West zijn in opdracht van Natuurmonumenten in november 2024 gestart. De uitvoering duurt tot het voorjaar van 2026. De aanbesteding om een aannemer, directievoerder en toezichthouder voor de realisatie te contracteren voor de Loosdrechtse Plassen lopen. De realisatie start begin februari en wordt half april 2025 afgerond.		
Betrokken partijen	Vereniging Natuurmonumenten, provincie Noord-Holland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Wijdmeren.		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: Baggeren (1.7), Verstreken ecologie (2.1), Verbeteren van de waterkwaliteit (2.3), Ganzenvraat en ganzenbeheer (2.5) en Bestrijding van exoten (2.6).		

Resultaatbereik 2024

Beoogd resultaat

- De provincie Noord-Holland en Natuurmonumenten hebben de uitvoeringsovereenkomst ondertekend.
- De werkzaamheden zijn gegund aan de aannemer, directievoerder en toezichthouder.
- De realisatie is najaar 2024 gestart.

Bereikt resultaat

- De werkzaamheden in de gebieden Hollands Ankeveen en Kortenhoef West zijn overgedragen aan Natuurmonumenten, inclusief de uitgewerkte bestekken en € 2,5 miljoen SPUK-gelden voor de realisatie.
- De werkzaamheden in de gebieden Hollands Ankeveen en Kortenhoef West zijn eind 2024 gestart.
- De werkzaamheden van aannemer, directievoerder en toezichthouder Loosdrechtse Plassen zijn voorlopig gegund.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting
Huidige fase		Planuitwerking		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 2.600.000	€ 2.600.000	
Herzien projectbudget		€ 2.401.804	€ 2.401.804	Het projectbudget is verlaagd t.b.v. dekking van de programma-kosten en Quickscan Nieuwe Polderplas.
Totaal besteed	T/m 2023	€ 534.290	€ 534.290	
	In 2024	€-11.033	€-11.033	
	Totaal	€ 660.823	€ 660.823	
Resterend budget		€ 1.752.014	€ 1.752.014	

Doorkijk 2025

Verwacht resultaat

- De uitvoering van de maatregelen voor moerasvogels in de Loosdrechtse Plassen heeft plaatsgevonden in februari tot half april 2025.
- De werkzaamheden in de gebieden Hollands Ankeveen en Kortenhoef West lopen door tot 2026. Er vinden geen werkzaamheden plaats in het broedseizoen van de moerasvogels.

Risico's scope, planning, financiën

- De aannemer heeft te maken met onwerkbaar weer waardoor hij uit de planning loopt en pas na het broedseizoen de werkzaamheden kan afronden.
- Er wordt bijzondere flora en/of fauna aangetroffen waardoor de aannemer de werkzaamheden moet staken, uitstellen of mitigerende maatregelen moet nemen.
- Er vindt een (menselijk) ongeluk plaats tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
- De verwachting is dat in 2025 geen uitgaven worden gedaan vanuit OVP. Eerst wordt de € 2,9 mln (inclusief BTW) vanuit de regeling Specifieke Uitkering Uitvoeringsprogramma Natuur (SPUK) aangesproken. De werkzaamheden dienen uiterlijk 15 maart 2026 gereed te zijn.

Overige bijzonderheden

Met het overdragen van de verantwoordelijkheden en het opdrachtgeverschap voor de werkzaamheden aan Natuurmonumenten voor Kortenhoef West en Hollands Ankeveen veranderen projectdoelstellingen of -resultaten niet.

Er vindt geen overschrijding plaats van het beschikbaar gestelde budget. Er blijft budget uit het programma OVP over. Voor de € 1.600.000 die terugvalt naar de Reserve OVP kan een alternatieve besteding worden gezocht buiten het project. Een andere mogelijkheid is dat het resterende budget wordt ingezet op de niet-gerealiseerde gebieden (of delen daarvan) project habitatherstel moerasvogels, zoals:

- het herstel van de ondergedoken legakkers en het realiseren van de verlengde aanvoerroute in Hollands Ankeveen, die buiten de scope van dit project zijn gehouden;
- het nader uitwerken en inrichten van de in de eerdere planuitwerkingen (totaal 8 deelgebieden) de gebieden Stichts Ankeveen, Loenderveense Plassen en/of Stille Plas;
- het aanvullen van de mogelijke tekorten in de te realiseren gebieden Hollands Ankeveen, Kortenhoef West en Loosdrechtse Plassen wanneer blijkt dat het geraamde budget ontoereikend is.

Project 2.4.3b Moerasvogels (vh Natuureilanden) - Quickscan Nieuwe Polderplas (Moeraseiland van baggerspecie)

Projecttrekker(s)	Gemeente Wijdmeren is bestuurlijk kartrekker. Het bagger-team van het OVP heeft een casus voor een onderwatereiland uitgevoerd.		
Projectraming volgens UVP	€ 0		
Fase project	Verkenning		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	17 december 2019		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	De plas heeft potentie om ingezet te worden voor recreatieve doelen, maar is volgend.		
Betrokken partijen	Provincie (eigenaar NPP), Gemeente Wijdmeren, Waternet/AGV, bewoners.		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: Baggeren (1.), Integreren recreatie en natuur (3.3).		

Resultaatbereik 2024

Beoogd resultaat

Er is een besluit genomen over de Nieuwe Polderplas (NPP) zodat we weten hoe we deze kunnen inzetten voor het bereiken van de doelen van het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen.

Bereikt resultaat

In 2024 is onderzocht of de Nieuwe Polderplas een bijdrage kan leveren aan de recreatieve routes. Daaruit blijkt dat deze plas onvoldoende kan toevoegen aan de recreatieve routes.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting
Huidige fase		Verkenning		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 0	€ 0	
Herzien projectbudget		€ 62.000	€ 62.000	€ 31.000 budget uit project baggeren + € 31.000 budget uit project Moerasvogels.
Totaal besteed	T/m 2023	€ 23.800	€ 23.800	
	In 2024	€ 0	€ 0	
	Totaal	€ 23.800	€ 23.800	
Resterend budget		€ 38.200	€ 38.200	

Doorkijk 2025

Verwacht resultaat

De Nieuwe Polderplas blijft beschikbaar om bij te dragen aan doelen uit het programma OVP. Ontwikkeling van deze plas is geen doel op zich.

Risico's scope, planning, financiën

- Het ontbreekt binnen het programma OVP aan raagvlak voor recreatieve ontwikkeling van de Nieuwe Polderplas.
- Er is nog geen financiering voor een initiatief. Binnen de bestaande projecten Baggeren en Maatregelen moerasvogels is onvoldoende resterend budget om een natuureiland te realiseren (studie 2022).

Project 2.5.2 (Nood)maatregelen ganzenvraat

Projecttrekker(s)	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 50.000		
Fase project	Afgesloten		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)			
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Het onderhoudscontract is per 31 december 2024 afgerond en afgesloten. De provincie Noord-Holland heeft het beheer en onderhoud (inclusief subsidie) overgedragen aan Natuurmonumenten.		
Betrokken partijen	Natuurmonumenten		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: Maatregelen voor moerasvogels (2.4).		

Resultaatbereik 2024

Beoogd resultaat

Eind 2024 heeft de provincie Noord-Holland het onderhoud aan Natuurmonumenten overgedragen.

Bereikt resultaat

In 2024 is de schade aan de rasters gerepareerd en is een deel van de nylonnetten vervangen door gaas, dat veel robuuster is. Dat gebeurt met name op de meest kwetsbare locaties die regelmatig beschadigd worden.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting
Huidige fase				
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 50.000	€ 50.000	
Herzien projectbudget		€ 137.000	€ 137.000	Het budget is opgehoogd ten behoeve van monitoring en onderhoud van de rasters. Dit budget is afkomstig van 2.5.1 Populatiebeheer ganzen.
Totaal besteed	T/m 2023	€ 114.223	€ 114.223	
	In 2024	€ 24.263	€ 24.263	Kosten worden gedekt uit het budget van 2.5.1 Populatiebeheer ganzen.
	Totaal		€ 138.486	
Resterend budget		€ 0	€ 0	

Doorkijk 2025

Verwacht resultaat

Het onderhoudscontract is eind 2024 afgerond.

Vanaf 2025 voert Natuurmonumenten de maatregelen uit met subsidie van de provincie Noord-Holland.

Project 2.5.3 Bestrijding exoten / Overlastgevende waterplanten

Projecttrekker(s)	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 500.000		
Fase project	Voorbereiding en planuitwerking		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	N.v.t.		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	In 2024 is het project opnieuw opgestart waarbij op 9 september 2024 een plan van aanpak is gepresenteerd aan de regiegroep. Deze heeft verzocht het plan te actualiseren met de voltallige projectgroep. De voorbereiding is daarop gestart met bijeenkomsten met de projectgroep.		
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland, provincie Utrecht, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, gemeente Wijdmeren, gemeente Stichtse Vecht, HISWA-Recron, het Watersportverbond, stichting Kievitsbuurten, Natuurmonumenten, Bewonersfederatie en Plassenschap Loosdrecht.		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: Aanleg luwtestructuren (1.7.2).		

Resultaatbereik 2024

Beoogd resultaat

Een projectgroep gaat aan de slag met een plan van aanpak.

Bereikt resultaat

De projectgroep is geactualiseerd en is bijeengekomen. Met de projectgroep wordt een vervolg plan van aanpak opgesteld. De regiegroep ontvangt hierover regelmatig informatie.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting
Huidige fase				
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 500.000	€ 500.000	
Herzien projectbudget				
Totaal besteed	T/m 2023	€ 387.323	€ 387.323	
	In 2024			
	Totaal			
Resterend budget				

Doorkijk 2025

Verwacht resultaat

- Er vindt een herstart van dit project plaats op basis van een goedgekeurd plan van aanpak.
- De stuurgroep neemt een besluit over de investering in materieel voor het maaien en harken.
- Er wordt een overeenkomst met gebruikers gesloten over de inzet en het onderhoud van materieel.

Risico's scope, planning, financiën

- Het beheer conflicteert met natuurdoelen.
- Er kan binnen pijlers niet worden geschoven met budgetten, waardoor er geen investeringen kunnen worden gedaan.

7

Pijler 3

Transformatie recreatiesector



De derde pijler Transformatie recreatiesector kent sinds de aanvang van het programma vier projecten. Binnen deze projecten ging het voornamelijk om het uitvoeren van onderzoeken en verkenningen. Nadat deze hadden plaatsgevonden, bleek het resterende budget in pijler 3 ontoereikend om vervolgstappen van toegevoegde waarde te kunnen zetten. Daarom ronden we de projecten binnen pijler 3 af en keren deze vanaf dit jaar niet meer terug in de voortgangrapportage. De ervaringen en onderzoeksresultaten worden meegenomen in beleidsontwikkeling en plannen van betrokken overheden.

Project 3.1 Projectleider transformatie

De eerste jaren van het programma fungeerde een gebiedsloots als aanjager van de modernisering van de recreatiesector in samenwerking met ondernemers, initiatiefnemers en exploitanten. Er bleek echter meer nodig om de sector op lange termijn economisch vitaal te houden. Onder andere vanwege het ontbreken aan budget werd de inzet van de gebiedsloots in 2023 stop gezet.

Project 3.2A Transitieteam recreatie en toerisme

Het transitieteam Recreatie en toerisme leverde in het voorjaar van 2021 het rapport [Transitie Recreatiesector Oostelijke Vechtplassen](#) op. Het rapport en ook het transitieteam hebben vanwege gebrek aan financiële middelen geen vervolg gekregen binnen het programma.

Project 3.3 Integreren recreatie en natuur

In samenwerking met bewoners, gebruikers, ondernemers en andere stakeholders kwam het Toekomstbeeld Loosdrechts Plassengebied 2030 tot stand. Het overkoepelend verhaal bevat vier sfeerbeelden die de kernkwaliteiten en merkwaarden van het gebied in combinatie met de wensen en behoeften van beoogde doelgroepen tonen. In de beelden komen bovendien de vier seizoenen terug: het toerisme hoeft zich immers niet te beperken tot de zomermaanden.

Begin 2024 is het rapport gepresenteerd aan de recreatiesector. De stuurgroep roept ondernemers en gebiedspartijen op de sfeerbeelden te gebruiken als inspiratie en leidraad voor toekomstige ontwikkelingen in het gebied. Daarmee is dit project binnen het programma OVP afgerond.

Project 3.4 Verkenning investeringsfonds

Er is een eerste verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van investeringsfonds voor de Aanpak Oostelijke Vechtplassen. Deze heeft helaas onvoldoende aanknopingspunten voor een vervolg opgeleverd.

Resterend budget pijler 3

Het resterende budget van de vier projecten uit pijler 3 bedraagt € 58.882. In 2025 ontvangt de stuurgroep een voorstel voor het vrijgeven van dit resterende budget zodat hierover een besluit kan worden genomen.

8

Organisatiekosten



Projecttrekker(s)	Gemeente Wijdmeren, provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	Er is geen raming opgenomen in het uitvoeringsprogramma. Communicatie OVP-breed Capaciteit totaal € 800.000 • € 300.000 (eerder beschikbaar gesteld) • € 500.000 (herziening programma 2022) Communicatiemiddelen totaal € 418.000 • € 100.000 (eerder beschikbaar gesteld) • € 318.000 (herziening programma 2022) Extra capaciteit gemeente Wijdmeren totaal € 380.000 • € 380.000 (herziening programma 2022) Bureaunkosten totaal € 587.000 • € 180.000 (eerder beschikbaar gesteld) • € 407.000 (herziening programma 2022)		
Fase project	Projectoverstijgend		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	• Stuurgroepbesluit communicatie en capaciteit: 20 november 2019 (notitie) en 30 juni 2021 (intakeformulier). • Stuurgroep-besluit middelen en capaciteit communicatie via voorstel herziening organisatie en inhoud gebiedsakkoord: 3 februari 2022.		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Begin 2022 zijn voorstellen gedaan voor het structureel inregelen van de dekking van de bureaunkosten en programmacommunicatie (ten behoeve van zowel de capaciteit als de communicatiemiddelen). Hiervoor zijn middelen ter beschikking gesteld.		
Betrokken partijen	Partners binnen het programma OVP		
Samenhang andere projecten	Bij de herziening van het programma is dekking verkregen voor de bureau- en communicatiekosten door van de projecten 3,5% af te romen. De eerdere dekking voor budget communicatie komt uit verschuivingen van budgetten voor de vervallen vaarverbindingen (1.2 en 1.3) en Natuurontwikkeling (2.1). De dekking voor de extra capaciteit Wijdmeren komt m.n. uit het budget voor recreatieve verbindingen (1.1) t.b.v. inhuur van een projectleider voor het project Horstermeer Zuid en uit verschuivingen van budgetten voor de vaarverbindingen (1.2 en 1.3), Natuurontwikkeling (2.1), Ontsluiting en toegankelijkheid (1.4) en Van dorpslint tot recreatieboulevard (1.5).		

Resultaatbereik 2024

Beoogd resultaat

Op gebied van communicatie en bureaunkosten:

- Er zijn wekelijks nieuwsberichten gepubliceerd op www.vechtplassten.nl.
- Er zijn 6 reguliere nieuwsbrieven verzonden.
- De jaarlijkse informatiemarkt is voor de vierde keer georganiseerd.
- Er hebben diverse bewonersbijeenkomsten plaatsgevonden waarbij het gesprek met aanwezigen is aangegaan over projecten.

Voor wat betreft capaciteit Wijdmeren: de capaciteit is ingezet conform afspraken (t.b.v. NNN, recreatie en Horstermeer Zuid).

Bereikt resultaat

- De jaarlijkse informatiemarkt heeft plaatsgevonden.
- Er zijn 98 nieuwsberichten geplaatst op www.vechtplassten.nl.
- Er zijn 6 nieuwsbrieven (aan 867 abonnees) verstuurd.
- Er hebben bewonersbijeenkomsten plaatsgevonden voor de projecten Faunapassages, Natuurontwikkeling Kortenhoef Oost en Legakkersherstel (online).

Projectcijfers per fase

		Totaal project	Toelichting
Huidige fase		Projectoverstijgend (geen fases)	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		Communicatie capaciteit € 300.000 Communicatie middelen € 100.000 Capaciteit Wijdmeren € 380.000 Bureaunkosten € 180.000	
Herzien projectbudget		Communicatie Capaciteit € 800.000 Communicatie Middelen € 418.000 Capaciteit Wijdmeren € 380.000 Bureaunkosten € 599.264	In februari 2022 heeft de stuurgroep besloten extra middelen beschikbaar te stellen. Dit betrof: - inhuur communicatie manager € 500.000; - communicatiemiddelen € 318.000 voor 6 jaar; - bureaunkosten € 407.000 voor 6 jaar. Van de € 407.000 was een deel niet gedekt, deze dekking is terug naar betreffende projecten.
Totaal besteed	T/m 2023	Communicatie capaciteit: € 395.893 Communicatie: € 72.691 Capaciteit Wijdmeren: € 349.556 <u>Bureaunkosten: € 278.794</u> Totaal: € 1.096.934	
	In 2024	Communicatie capaciteit: € 108.201 Communicatie: € 3.687 Bureaunkosten: € 3.087 <u>Bureaunkosten PNH: € 168</u> Communicatiekosten PNH: € 18.508 Totaal: € 133.651	Onder communicatie valt o.a. zaalhuur. Onder Bureaunkosten zijn de kosten voor de website opgenomen.
	Totaal	Communicatie capaciteit: € 504.094 Communicatie: € 94.886 Capaciteit Wijdmeren: € 349.556 <u>Bureaunkosten: € 282.049</u> Totaal: € 1.230.585	
Resterend budget		Communicatie capaciteit: € 295.906 Communicatie: € 323.114 Capaciteit Wijdmeren: € 30.444 <u>Bureaunkosten: € 277.215</u> Totaal: € 926.679	

Doorkijk 2025

De communicatiewerkgroep zet onder voorzitterschap van de communicatiemanager OVP de ingezette werkwijze voort met de jaarkalender als planningsinstrument.

- In het voorjaar wordt bekeken of het organiseren van een vijfde informatiemarkt in het najaar toegevoegde waarde heeft voor het programma.
- Wanneer projecten tot uitvoering komen of worden afgerond, benutten we deze als feestelijke communicatiemomenten met zowel bestuurders als de omwonenden en andere betrokken partijen.
- We organiseren een voorjaarsexcursie voor de regiegroep ipv een meerdaagse training Mutual Gains Approach.
- Naast de jaarlijkse voortgangsrapportage maken we een samenvatting met de belangrijkste cijfers en beknopte kwartaalberichten.

COLOFON

De voortgangsrapportage is een jaarlijks terugkerende uitgave verzorgd door het programmabureau Oostelijke Vechtplassen in nauwe samenwerking met de diverse projecttrekkers. De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen heeft dit rapport op 9 april 2025 vastgesteld.

Aanpak Oostelijke Vechtplassen

p/a secretariaat OVP
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

T: 023-5143098

E: secretariaat_OVP@noord-holland.nl

Partners:

provincie Noord-Holland | provincie Utrecht |
gemeente Wijdmeren | gemeente Stichtse Vecht |
gemeente Hilversum | Waternet | Waterschap Amstel,
Gooi en Vecht | Plassenschap Loosdrecht e.o. |
Regio Gooi en Vechtstreek | Natuurmonumenten |
LTO Noord | HISWA-Recron | Koninklijk Nederlands
Watersportverbond | Verenigde bedrijven Boomhoek |
Vechtplassencommissie | Platform Recreatie en Toerisme
Wijdmeren | Toeristische Kano Bond Nederland |
Vereniging Kievitsbuurten | ANWB | Bewonersfederatie OVP

Vormgeving:

Pier 19 Grafisch ontwerpers

Fotografie:

Anja Brands: 1, 2,6, 10, 11, 14, 15, 20, 68
Arno Peene: 17
Marco Krijthe: 37
Provincie Noord-Holland: 3
VdMarel.com: 2
Wilma Straathof: 66
