


Voortgangsrapportage Oostelijke vechtplassen 2025



Inhoudsopgave

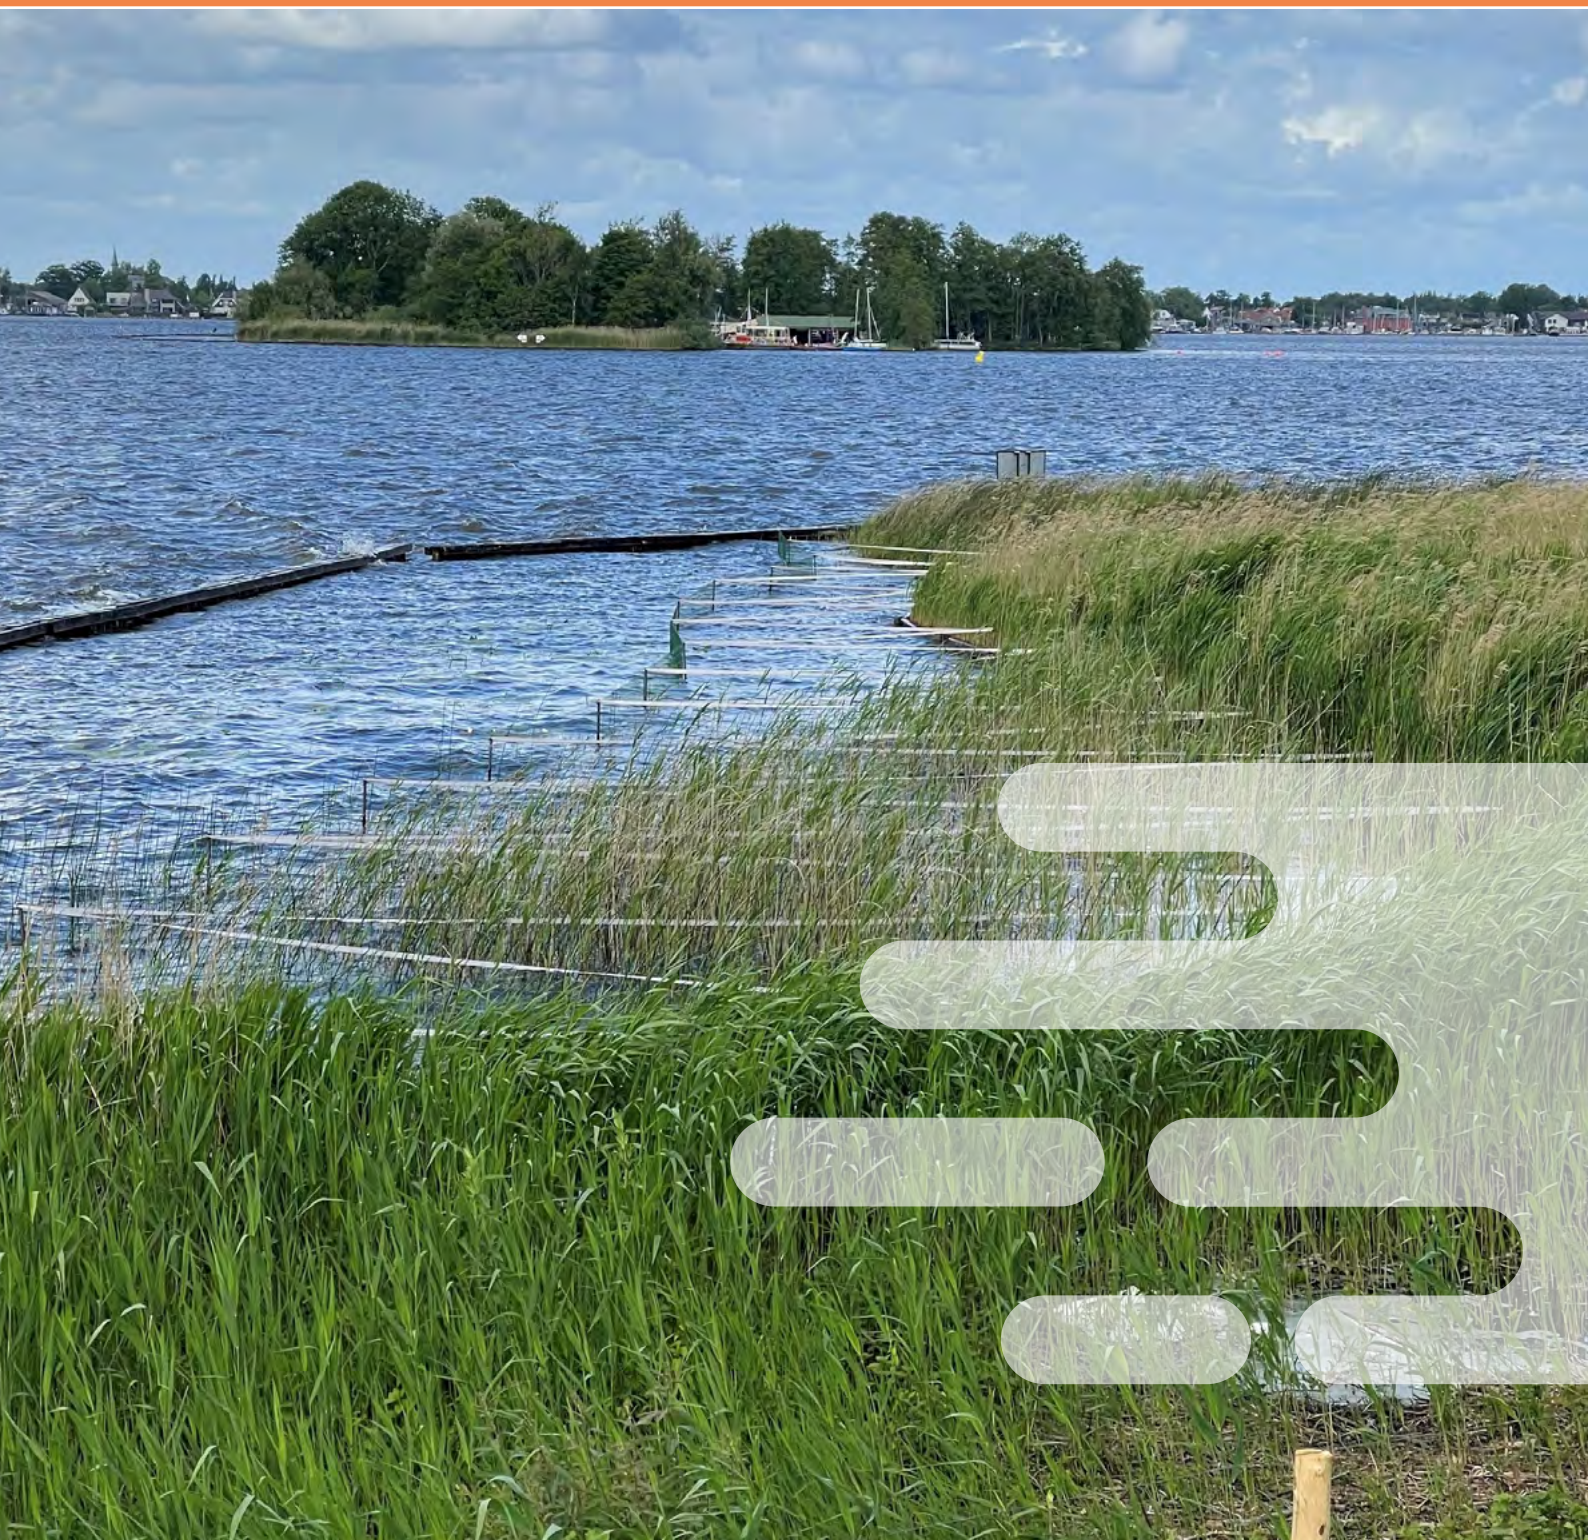

Voorwoord



We reiken elkaar de hand en pakken complexe problemen aan

In november 2025 nam ik het voorzitterschap van de stuurgroep Aanpak Oostelijke Vechtplassen (OVP) over van Rosan Kocken. Een maand later vond mijn eerste Stuurgroep-vergadering plaats waarbij meteen twee belangrijke onderwerpen op de agenda stonden: beheer waterplanten en de aanleg van luwtestructuren in de Loosdrechtse Plassen. Beide onderwerpen zorgden voor een levendige discussie. Begrijpelijk; want juist bij deze twee onderwerpen raken de belangen van natuur en recreatie elkaar. En het laat ook zien hoe

moeilijk het soms is een evenwicht hiertussen te vinden. De opgaven voor natuur zijn groot, de belangen van de recreatiesector ook. En toch moeten we er samen zien uit te komen.

Het programma OVP loopt eind 2027 af. Met nog twee jaar voor de boeg, is het vooral belangrijk dat we de programmadoelen voorop blijven zetten en het gesprek daarover met elkaar voeren. En dat we samen naar oplossingen zoeken voor de uitdagingen die dit gebied kent. De natuur en waterkwaliteit scoren onvoldoende. Maar met gerichte maatregelen kunnen we dit ombuigen. Dat vraagt soms offers, dat realiseer ik me heel goed. Ik geloof er echter in dat we samen stappen vooruit kunnen zetten. Zodat uiteindelijk niet alleen de natuur, maar ook de recreatiesector en bewoners hiervan profiteren.

De besluiten die de stuurgroep eind 2025 nam over de projecten Beheer waterplanten en Luwtestructuren zijn hiervan mooie voorbeelden en betekenen veel voor de voortgang in het programma. We reiken elkaar de hand en pakken complexe problemen aan, al weten we dat onderdelen nader moeten worden ingevuld, uitgewerkt en afgestemd. Dit doen we samen met belangenpartijen, ondernemers en bewoners. Zij worden nauw betrokken bij de verdere uitwerking.

Waar mogelijk maken we bij aanvang van de projecten afspraken over het toekomstig beheer; oorspronkelijk geen onderdeel van het programma. Het is goed dat we ons hiervan bewust zijn zodat partners in de toekomst niet voor verrassingen komen te staan. Zo deden we dat ook bij het herstel van de vaarverbinding de Heul begin 2025. Een mooi resultaat, waarbij we de vaarverbinding tussen de Vuntus en de Loosdrechtse Plassen hebben hersteld en tegelijkertijd afspraken hebben gemaakt over eigenaarschap en toekomstig beheer.

In 2025 maakten de eerste haveneigenaren gebruik van de subsidieregeling voor het transporteren, verwerken en accepteren van verontreinigde bagger. Het verwijderen van bagger is van belang voor de bevaarbaarheid van de plassen, en een stimulans voor de natuur en de waterkwaliteit. Ook troffen we de voorbereidingen voor de volgende stap, namelijk het baggeren van de Vuntus en Stille Plas. Daarvoor laten we eerst onderzoek uitvoeren naar de kwaliteit van de waterbodem. Op basis daarvan beoordelen we of en zo ja, waar baggerwerkzaamheden nodig zijn.

Eind van het jaar kwam gelukkig duidelijkheid over de projecten natuurontwikkeling; een van de grootste opgaven binnen het programma. Na een periode van stilstand pakken we de restantopgaven voor het afronden van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in alle deelgebieden weer op. Dit biedt helderheid voor grondeigenaren, inwoners en andere betrokkenen. In het voorjaar 2026 starten we met keukentafelgesprekken met grondeigenaren in de gebieden Het Hol, Ster van Loosdrecht, Weersloot en Kortenhoef Oost. Vanaf 2029 volgen de gebieden Kortenhoef West, Ankeveen en Vuntus. De gebiedsprocessen nemen enkele jaren in beslag en lopen door na afronding van het programma OVP.

Meer projecten uit de pijler Versterken natuurwaarden van het programma boekten vooruitgang in 2025. Zo werden onder de Kooibrug in Ankeveen en de Kattenbrug in Kortenhoef planken gelegd die de oversteek voor otters en andere marterachtigen veiliger maken. Vanaf 2026 volgen meer faunapassages in het Oostelijk Vechtplassen-gebied. De maatregelen voor een beter leefgebied voor moerasvogels gingen in 2025, met een onderbreking tijdens het broedseizoen, door. In zowel Kortenhoef-West en Hollands Ankeveen als in de Loosdrechtse Plassen werd het landschap weer open gemaakt door begroeiing te verwijderen. Ganzenrasters en –linten zorgen ervoor dat ganzen het jonge riet niet aanvreten. Door nestvlotjes voor de zwarte stern te plaatsen nemen de broedmogelijkheden voor deze soort toe.

Al deze projecten dragen bij aan een mooier Oostelijk Vechtplassen-gebied. Nu we langzaam richting het einde van het programma gaan, proberen we projecten te versnellen en af te ronden. Tegelijkertijd denken we na over de periode na 2027, want niet alle vraagstukken kunnen we oplossen binnen het huidige programma. De ervaringen van de afgelopen jaren nemen we daarin uiteraard mee. We weten dat we samen meer kunnen, maar realiseren ons ook dat dit soms zorgt voor vertraging en frustratie. Zolang elke partij vanuit eigen verantwoordelijkheid een bijdrage wil leveren aan het gezamenlijke belang, blijven we stappen zetten. Met als doel een aantrekkelijk en toegankelijk landschap waar natuur en recreatie elkaar versterken.

Anouk Gielen

voorzitter Stuurgroep Aanpak Oostelijke Vechtplassen

Voortgang in vogelvlucht

2025




Overzicht budget en uitgaven

De uitgaven van de afgelopen jaren (tot 31 dec 2025) zijn als volgt verdeeld:

Uitgaven per programma onderdeel in procenten ten opzichte van herzien budget (inclusief absoluut restant)

Budget (herijkt)

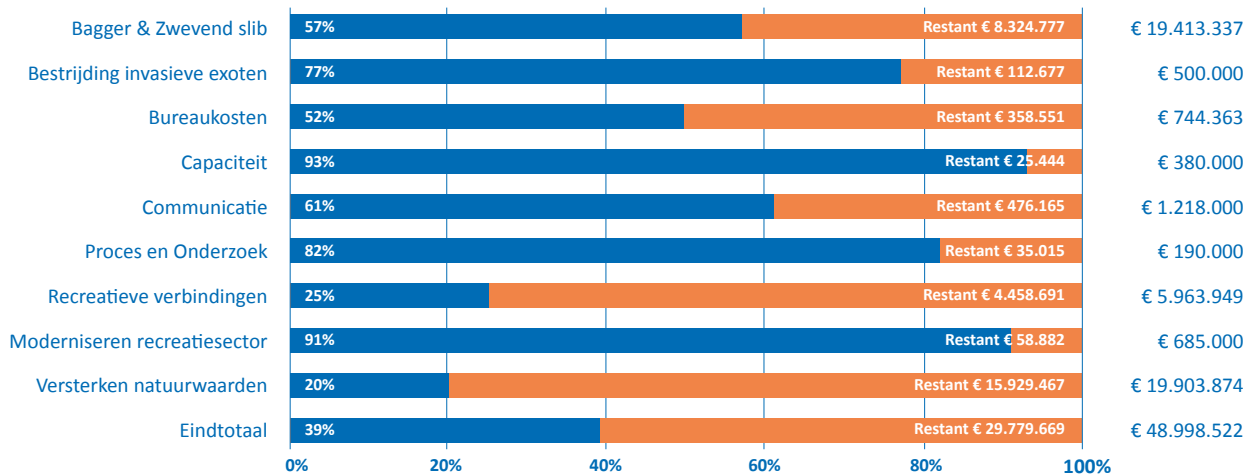

3 pijlers


Ontwikkelen
vrijtijdslandschap

Moderniseren
recreatiesector


Versterken
natuurwaarden

Status projecten

Scope



Planning



Financiën



- Project verloopt niet volgens goedgekeurd PvA, ingreep stuurgroep nodig
- Project verloopt niet volgens goedgekeurd PvA, géén ingreep stuurgroep benodigd
- Project verloopt volgens goedgekeurd PvA

Budget en uitgaven (in mln.)



- Uitvoeringsprogramma
- Huidige dekking
- Uitgegeven
- Restbudget

* De huidige dekking is gewijzigd ten opzichte van 2024. De pijler Versterking natuurwaarden is verlaagd met € 3,5 miljoen doordat de onteigeningsvergoeding in 2025 uit het budget is gehaald. Daarnaast is er € 152.000 toegevoegd bij Moderniseren recreatiesector voor natuurbeleving.

Communicatie (in aantallen)


9200 bezoekers website

5 nieuwsbrieven OVP

82 nieuwsberichten website

895 abonnees nieuwsbrief OVP

Fasering lopende (deel)projecten



- Verkenning
- Planuitwerking
- Realisatie
- Afgerond/Gestopt

1

Organisatie en draagvlak



De uitvoering van het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen (OVP) loopt van 2017 tot en met 2027. De programma-organisatie bestaat uit een stuurgroep, regiegroep, kernteam en programmabureau. Ieder heeft daarin eigen taken en verantwoordelijkheden.

Taken en verantwoordelijkheden

Stuurgroep

De stuurgroep is verantwoordelijk voor het behalen van de programmadoelstellingen. Vier keer per jaar komt de stuurgroep bij elkaar. In de stuurgroep zitten bestuurders van de provincies Noord-Holland en Utrecht, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), de gemeenten Wijdmeren, Hilversum en Stichtse Vecht, het Plassenschap Loosdrecht e.o., Regio Gooi en Vechtstreek, LTO Noord, een vertegenwoordiging namens de recreatiesector, Natuurmonumenten en de Bewonersfederatie Oostelijke Vechtplassen. De gemeente Wijdmeren vertegenwoordigt Plassenschap Loosdrecht e.o. en Regio Gooi en Vechtstreek in de stuurgroep. In november nam gedeputeerde Anouk Gielen (GroenLinks) namens de provincie Noord-Holland het voorzitterschap over van Rosan Kocken, die werd aangesteld als burgemeester van de gemeente De Ronde Venen. Namens de recreatie-sector nam Michel Roché de plek over van Henk Bergsma, die de overstap maakte naar de regiegroep.

Regiegroep

De regiegroep toetst plannen en voorstellen, ziet toe op de voortgang en samenhang van de projecten en bewaakt het programmabudget. Ook bepaalt de regiegroep of voorstellen voor besluitvorming worden voorgelegd aan de stuurgroep. In de regiegroep zitten de vertegenwoordigers van de provincies Noord-Holland en Utrecht, Waterschap AGV, de gemeenten Wijdmeren, Hilversum en Stichtse Vecht, Natuurmonumenten, Watersportverbond, Bewonersfederatie, Vereniging Loendeveense Plas (VBLP), Ondernemers waterrecreatie/HISWA-RECRON, Plassenschap Loosdrecht e.o. Vereniging Verenigde Bedrijven Boomhoek, Regio Gooi en Vecht. De regiegroep vergadert vijf keer per jaar. In 2025 was dat vier keer vanwege het gebrek aan agendapunten. Daarnaast vindt er een jaarlijkse evaluatie plaats. Tijdens deze evaluatie kijkt de regiegroep terug op het voorgaande jaar en formuleert zij aandachtspunten voor het komende jaar. Naar aanleiding van de evaluatie van 2024 heeft het programmabureau in het voorjaar van 2025 een gebiedsexcursie georganiseerd. Deze is in de plaats gekomen van een dag training over de werkwijze van de Mutual Gains Approach. Tijdens deze excursie stonden de onderwerpen Beheer waterplanten en luwtestructuren centraal. Projectleiders en andere deskundigen gaven uitleg over de plannen voor verbetering van de waterkwaliteit en tegelijkertijd het behoud van recreatie. In het najaar bracht de regiegroep samen met de stuurgroep een bezoek aan de projecten Kwaliteitsimpuls Wijde Blik en Natuurontwikkeling Het Hol. Ook ontvingen ze informatie over het project Recreatieve Routes.

Vanaf juni vertegenwoordigt Rianne van Dusseldorp de Vereniging Verenigde Bedrijven Boomhoek in de regiegroep, nadat deze vacature al een aantal jaren vacant was. In oktober kregen we het verdrietige bericht dat Jan Willem Bouman na een ziekbed was overleden. Hij vertegenwoordigde het Watersportverbond sinds begin 2024 in de regiegroep. Daarvoor was hij enige tijd deelnemer van het Baggerplatform. Hij heeft zich met name ingezet voor het baggeren van de Loosdrechtse Plassen en de subsidieregeling voor het baggeren van de havens. We zijn Jan Willem dankbaar voor zijn bijdrage aan het programma. Sinds december 2025 vertegenwoordigt Henk Bergsma het Watersportverbond in de regiegroep.

Kernteam

Het kernteam bespreekt wekelijks de voortgang van projecten en actuele ontwikkelingen die invloed hebben op het programma. Ook bereidt dit team de voorstellen voor de regie- en stuurgroep voor. In het kernteam zitten de programmamanagers van de betrokken provincies, gemeenten en Waterschap AGV.

Programmamateam

In het programmamateam bereiden programmamanager, -secretaris, -controller, -ondersteuner en communicatiemanager wekelijks de programmabrede werkzaamheden voor zoals: vergaderingen, werkbezoeken, bijeenkomsten en de jaarlijkse voortgangsrapportage. De programmamanager coördineert de realisatie van het uitvoeringsprogramma, geeft leiding aan het programmabureau en zit de regiegroep voor.

Projectleidersoverleg

In het maandelijkse (online) projectleidersoverleg bespreken projectleiders de voortgang van projecten en wisselen zij informatie en ervaringen met elkaar uit. De projectleiders dragen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de projecten. Sinds 2024 vindt er jaarlijks ook een fysiek projectleidersoverleg plaats

Overlegstructuur

In 2025 heeft het programmabureau aan de hand van een behoeftepeiling onder projectleiders en -medewerkers een aantal wijzigingen doorgevoerd in de overlegstructuur. Vanaf 1 januari 2026 is het online projectleidersoverleg teruggebracht naar een keer per kwartaal, terwijl het fysiek projectleidersoverleg is aangepast van een naar twee keer per jaar. Het informele OVP-café voor alle projectleiders en -medewerkers en regiegroepleden vindt vanaf 2026 twee keer per jaar plaats. Het is een laagdrempelige manier om meer achtergrondinformatie over de projecten te delen en elkaar beter te leren kennen.

Capaciteit en middelen

In het opdrachtgeversoverleg bespreken de overheidspartijen de benodigde capaciteit en middelen voor het uitvoeren van de projecten. De stuurgroep heeft in 2025 ingestemd met een onderzoek naar de wijze waarop de partijen vanaf 2028 (na afloop van het gebiedsakkoord) willen samenwerken aan de opgaven op het gebied van natuur, waterkwaliteit en recreatie in het gebied. Het onderzoeksbureau Ardis heeft hiervoor alle overheidspartijen geïnterviewd. De overige partijen hebben via een groepsinterview input geleverd. Begin 2026 vindt de presentatie van de resultaten plaats en worden de vervolgstappen bepaald. Doel is om ruim voor het einde van het programma afspraken te maken over toekomstige samenwerking voor opgaven in het Oostelijk Vechtplassen-gebied.

Wettelijke kaders

Eind 2025 kwam een einde aan een periode van onzekerheid over de projecten natuurontwikkeling. Deze was ontstaan na het wegvallen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en het Transitiefonds in het voorjaar van 2024. De provincie Noord-Holland stelde geld beschikbaar voor het afronden van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Daarbij werden de Oostelijke Vechtplassen als één van de vijf focusgebieden aangewezen om de restantopgaven van het NNN te realiseren.

Waterschap AGV werkt aan het verbeteren van de waterkwaliteit. De maatregelen in het Vechtplassengebied vormen onderdeel van het KRW-maatregelen-pakket voor de uitvoeringsperiode 2022-2027. Net zoals de natuurontwikkelingsprojecten dragen de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) maatregelen bij aan de doelstellingen die de provincies moeten verantwoorden.

Voortgang in de projecten

Recreatieve routes

Vertegenwoordigers van Waterschap AGV, Natuurmonumenten, de gemeente Wijdmeren en bewoners maakten in de zomer van 2025 afspraken over maatregelen die de bestaande recreatieve fiets- en wandelroutes in Ankeveen aantrekkelijker maken. Onderdeel van de maatregelen zijn onder andere het opknappen van het uitzichtpunt op de Stichtse Kade en afspraken met de vrijwilligers van Natuurrijk Ankeveen over jaarlijks groenonderhoud langs het Bergse Pad. De gemeente Stichtse Vecht werkt aan het Legakkerfortenpad. Dit pad loopt van Fort Tienhoven naar Fort Spion, beide locaties zijn onderdeel van de Hollandse Waterlinie. Landschap Erfgoed Utrecht kreeg in de zomer opdracht om voorbereidingen te treffen voor het nieuwe deel van het pad. Daarvoor voert de organisatie gesprekken met grondeigenaren om zo uiteindelijk de definitieve route te kunnen bepalen.

Besteding overgebleven gelden niet-realiseerbare projecten waterrecreatie

Eind juni 2025 besloot de Stuurgroep Aanpak OVP de gelden die niet zijn uitgegeven aan de 2 vaarverbindingen (1.2 Waterrecreatie 's-Graveland en Kortenhoef en 1.3 Vaarverbinding Loosdrechtse Plassen – Hilversums kanaal) vrij te maken voor het financieren van duurzame projecten ten behoeve van de waterrecreatie. Onafhankelijk onderzoek onder de gebiedspartners wees uit dat er geen behoefte is aan een recreatiefonds, maar aan het honoreren van voorstellen die de waterrecreatie ten goede komen. Deze moeten passen bij de uitgangspunten van het gebiedsakkoord en visie 2030. Het gaat om een totaalbedrag van € 2,77 miljoen. Om aanspraak te kunnen maken op deze gelden, dienen partners een projectvoorstel ter goedkeuring aan de stuurgroep voor te leggen voor eind 2027.

Ontwikkeling Scheendijk

De gemeente Stichtse Vecht heeft een startnotitie en de eerste versie van de concept ruimtelijke pijlers voor het omgevingsprogramma voor de Scheendijk vastgesteld. Het gebied blijft in de basis een recreatiegebied. Het Omgevingsprogramma Scheendijk bevindt zich nu in een vergevorderd stadium. De kaders voor recreatie zijn grotendeels uitgewerkt, maar over wonen is nog overleg nodig met de Provincie Utrecht. Omdat de Scheendijk onderdeel is van een UNESCO-gebied, wordt een Heritage Impact Assessment uitgevoerd. Dit is half maart gereed. De uitkomsten van het overleg met de provincie en van de Impact Assessment bepalen wanneer het programma in 2026 kan worden vastgesteld. Zodra dat is gebeurd, kunnen initiatiefnemers aan de slag met de herontwikkeling van de legakkers. Daarnaast is gestart met de herinrichting van de Scheendijk. De reconstructie moet zorgen voor verbetering van de verkeersveiligheid, het verminderen van wateroverlast, meer ruimte voor de wandelaar en fietser en meer zicht op het water. In 2025 is de parkeervoorziening aan de zuidkant van de Scheendijk opgeknapt.

Baggeren

Na de afronding van het baggeren van de 1e t/m 5e Loosdrechtse Plassen, is per april 2025 een subsidieregeling voor het baggeren van havens ingesteld. Eigenaren en erfpachters van jachthavens in de Oostelijke Vechtplassen kunnen de subsidieregeling gebruiken voor het transporteren, verwerken en accepteren van verontreinigde bagger. Totaal is vanuit het programma OVP voor deze regeling 1.75 miljoen beschikbaar gesteld. Het verwijderen van bagger belangrijk voor de bevaarbaarheid van de plassen, maar ook een stimulans voor de natuur en de waterkwaliteit. De eerste havens maakten in 2025 gebruik van deze regeling.

De provincie Noord-Holland heeft eind december een bureau opdracht gegeven voor het uitvoeren van onderzoek naar de kwaliteit van de waterbodem in de Vuntus en de Stille Plas, fase 3 van het project Baggeren. Het bureau brengt onder andere in beeld met welke natuur-, milieu-, water- en andere eisen rekening moet worden gehouden bij het baggeren van deze plassen. Vraag is ook of de bagger ter plaatse kan worden hergebruikt. In eerste instantie gaat de aandacht naar het aanpakken van de knelpunten in beide plassen. Voor de Vuntus wordt ook onderzocht hoe de kwaliteit van de vooroever kan worden verbeterd.

Herstel vaarverbinding De Heul

In opdracht van de gemeente Wijdmeren is voor het vaarseizoen 2025 de beschoeiing van het zuidelijk deel van de Heul vervangen. Het was oorspronkelijk geen project van het uitvoeringsprogramma Aanpak OVP. De Heul vormt samen met het Horregat de enige vaarverbinding met de Vuntus en de Eerste Loosdrechtse Plas. Gemeente, grondeigenaren en de recreatiesector hebben samen een werkbare én toekomstbestendige oplossing gevonden voor het bevaarbaar houden van De Heul. Vanwege het ontbreken van een vaarwegbeheerder én het grote belang voor recreatie in het Plassengebied is het geld voor deze werkzaamheden beschikbaar gesteld vanuit het programma OVP. Onderdeel van de afspraken is dat gemeente Wijdmeren eigenaar is geworden en daarmee de verantwoordelijkheid draagt voor het toekomstig beheer van de vaarverbinding.

Herstel en duurzaam behoud legakkerlandschap Kievitsbuurten

In 2025 hebben de voorbereidingen plaatsgevonden voor het invoeren van de subsidieregeling voor het herstel van legakkers in de Kievitsbuurten vanaf 1 januari 2026. Particuliere eigenaren van legakkers kunnen met subsidie natuuroevers aanleggen voor bescherming van de legakkers en versterking van de natuur. Dit draagt bij aan herstel en duurzaam behoud van de legakkers in de Kievitsbuurten. Eigenaren kunnen de subsidie tot en met eind 2027 aanvragen bij de gemeente Stichtse Vecht.

Kwaliteitsimpuls Wijde Blik

Natuurmonumenten (NM) en de Vereniging Watersport Kortenhoef (VWK) hebben een plan gemaakt dat zowel de recreatieve voorzieningen als de natuurbeleving in de Wijde Blik verbetert. Partijen willen van de eilanden iconen maken, extra steigers aanleggen en de natuur versterken door verlanding en het versterken van rietkragen. De initiatiefnemers werken de maatregelen uit tot definitieve ontwerpen en bijbehorende ramingen. Met deze informatie kan de stuurgroep gericht keuzes maken; waarschijnlijk gebeurt dit in de zomer van 2026.

Beheer waterplanten

De stuurgroep stelde eind 2025 € 1,3 miljoen beschikbaar voor het uitwerken van een plan voor beheer van waterplanten in de Oostelijke Vechtplassen. De programmapartners zetten hiermee een belangrijke stap naar duurzaam waterplantenbeheer van de Oostelijke Vechtplassen. Onderdeel van het plan is het aanwijzen van het Plassenschap Loosdrecht e.o. als beheerder en coördinator van het beheer van waterplanten voor een pilot van vier jaar. Er wordt een kernteam samengesteld met daarin vertegenwoordigers van de Vereniging Samen Cabomba Aanpak (VSCA), de waterrecreatiesector, Natuurmonumenten, Waterschap AGV en daarnaast het Plassenschap, waaraan de provincies Noord-Holland, Utrecht en de gemeenten Wijdemeren en Stichtse Vecht deelnemen. Dit kernteam krijgt een centrale rol in het monitoren, adviseren, evalueren en het aanpassen en vaststellen van het beheer. Het team kan bijsturen op basis van ecologische ontwikkelingen en ervaringen uit de praktijk.

Maatregelen moerasvogels

Om het gebied opener te maken voor moerasvogels zijn bomen en struiken weggehaald zodat er meer licht op de bodem valt. Rietkragen kunnen zich op deze manier herstellen. Rasters houden ganzen op afstand zodat zij het jonge riet niet kunnen aanvreten. Begin van het jaar voerde de provincie Noord-Holland maatregelen uit op de Loosdrechtse Plassen. Deze richten zich op het uitbreiden van het broed- en leefgebied van de grote karekiet en zwarte stern. Natuurmonumenten zette de in 2024 gestarte werkzaamheden voor moerasvogels voort. In Hollands Ankeveen richten de maatregelen zich op het uitbreiden van het broed- en leefgebied van de zwarte stern en de roerdomp. De maatregelen in Kortenhoef-West richten zich op het uitbreiden van de broedhabitat en het leefgebied van de roerdomp, woudaap, porseleinhoen en purperreiger.

Faunapassages

Na enkele jaren van voorbereidingen zijn eind 2025 de eerste faunapassages gerealiseerd. Onder de Kooibrug in Ankeveen en de Kattenbrug in Kortenhoef zijn planken gelegd die de oversteek voor otters en andere marterachtigen veiliger maken. De dieren kunnen via deze loopplanken gemakkelijk van oever naar oever lopen. Dit vergroot hun overlevingskans. Ze hoeven namelijk niet meer omhoog om via de weg over te steken. De provincie Noord-Holland heeft met de gemeente Wijdemeren afspraken gemaakt over de aanleg van de andere fauna-passages. De gemeente combineert de aanleg van de passages zoveel mogelijk met geplande wegwerkzaamheden.

Natuurontwikkeling

Eco- en hydrologisch onderzoek

De provincie Noord-Holland is in 2025 een eco -en hydrologisch onderzoek gestart naar de soorten nieuwe natuur in de Oostelijke Vechtplassen. Het onderzoek helpt bij het afronden van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en richt zich op grondwater, oppervlaktewater en de bodem. Bekeken wordt hoe de natuur kan worden ontwikkeld en beter worden beheerd. De uitkomsten helpen bij het maken van plannen voor de inrichting van de laatste stukken NNN. De resultaten worden begin 2026 verwacht.

Gebiedsprocessen

Eind 2025 werd duidelijk dat de provincie Noord-Holland € 200 miljoen vrijmaakt voor natuurontwikkeling. De Oostelijke Vechtplassen is één van de vijf Natura 2000 gebieden waarvoor geld is gereserveerd. Dat betekent dat de provincie verder kan met het realiseren van het NNN en dus met het voeren van gesprekken met eigenaren van grond binnen de grenzen van het NNN. Gestart wordt in de gebieden de Weersloot, Ster van Loosdrecht en Kortenhoef-Oost. Hiervoor stelt de provincie ongeveer € 60 miljoen beschikbaar om per direct aan de slag te kunnen. Naar verwachting is het NNN afgerond in 2033. De gebieden: de Vuntus, Kortenhoef West en Ankeveen volgen naar verwachting vanaf 2029. De afronding van deze gebieden staat gepland vanaf voor 2036.

Het Hol

In natuurgebied Het Hol werken provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten en Waterschap AGV samen om de karakteristieke laagveennatuur te beschermen en te versterken. Natuurmonumenten is in 2025 verdergegaan met het baggeren van sloten en plassen. De volgende stap bestaat uit het optimaliseren van het watersysteem met dammen en duikers. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot medio 2027. Daarna staat het herstellen van natuur en het ontwikkelen van nieuwe natuur (NNN) op de planning.

Waterkwaliteit

In opdracht van Waterschap AGV is de begroeiing onder water van de Loosdrechtse Plassen 1 t/m 5 in beeld gebracht met een boot die is uitgerust met sonartechnologie. Waterplanten zijn onmisbaar voor gezonde plassen. Ze nemen voedingsstoffen op, zorgen voor helder water, bieden voedsel en schuilplaatsen aan dieren en verstevigen oevers en bodems. Het is daarom belangrijk om inzicht te hebben in de groei van planten, zowel boven als onder water. Begin 2026 verwacht AGV de resultaten van deze metingen te kunnen delen.

Luwe zones

Een van de maatregelen om de waterkwaliteit in de Loosdrechtse Plassen te verbeteren is de aanleg van luwe zones. Dat zijn bijvoorbeeld rijen houten palen of smalle stroken met beschoeiing, die de golfslag verminderen en zorgen voor rustiger, helderder water. Zo ontstaan betere omstandigheden voor onderwaterplanten. In 2025 organiseerde Waterschap AGV verschillende bijeenkomsten over de aanleg van luwe zones voor vertegenwoordigers van de recreatiesector, bewoners en andere belangstellenden. Aan het einde van het jaar besloot de stuurgroep dat Waterschap AGV het vormgevingstraject met de omgeving kan opstarten. Tegelijkertijd wordt op bestuurlijk niveau gewerkt aan het vergroten van draagvlak voor deze maatregelen.

Besluiten stuurgroep

De stuurgroep nam in 2025 een aantal belangrijke besluiten. Zo werd besloten de overgebleven gelden uit de projecten 1.2 en 1.3 te besteden aan toekomstbestendige projecten op het gebied van waterrecreatie. Het gaat totaal om € 2,77 miljoen. In het voorjaar stelde de stuurgroep middelen beschikbaar voor het uitwerken van het plan Kwaliteitsimpuls Wijde Blik. Daarnaast gaf de stuurgroep eind 2025 toestemming voor de uitwerking van een plan en pilot voor het beheer van waterplanten. Hiervoor werd € 1,3 miljoen beschikbaar gesteld. De programmapartners zetten hiermee een belangrijke stap naar duurzaam beheer van de Oostelijke Vechtplassen voor de langere termijn. Het besluit om een omgevingstraject op te starten voor luwe zones in de Oostelijke Vechtplassen en het creëren van draagvlak op bestuurlijk niveau waren eveneens belangrijke onderdelen van het traject naar een betere waterkwaliteit.

2

Communicatie



2.1 Werkwijze

In de communicatiewerkgroep overleggen de communicatieadviseurs van de provincie Noord-Holland, de gemeente Stichtse Vecht, Waterschap AGV en Natuurmonumenten over de communicatie over projecten. In de plannen van aanpak voor projecten vormt communicatie een vast onderdeel. De communicatiemanager OVP zit de werkgroep voor en is verantwoordelijk voor het beleid, regie en afstemming van communicatie binnen het programma en adviseert daarnaast de gemeente Wijdemeren over communicatie over projecten uit het OVP. De communicatiewerkgroep kwam in 2025 vier keer bijeen. Dat gebeurt telkens twee weken voorafgaand aan de vergaderingen van de stuurgroep zodat ook de communicatie over voorliggende bestuursbesluiten kan worden besproken.

Berichtgeving

De belangrijkste besluiten van de stuurgroep verschijnen na de vergadering op de website, worden opgenomen in de nieuwsbrief van het programma OVP en verschijnen op de website of in de nieuwsbrief Gooi en Vechtstreek van de provincie Noord-Holland. Ook de communicatiekanalen van de andere partners worden gebuikt om nieuws te verspreiden of bepaalde onderwerpen onder de aandacht te brengen.

2.2 Programmacommunicatie

Website

De website www.vechtplassen.nl fungeert als het centrale communicatiemiddel van het programma. Hierop staat onder andere uitleg over het programma, de organisatie, de partners en de projecten. Projecten beschikken over een eigen pagina waarop de actuele stand van zaken staat vermeld. In 2025 telde de website 9.200 bezoeken. Het aantal bezoeken steeg met ruim 900 ten opzichte van 2024; toen dit aantal 8300 bedroeg. Hierbij zien we, net zoals voorgaande jaren, een stijging in het aantal bezoeken na het verzenden van de digitale OVP-nieuwsbrief aan de abonnees. Bijna wekelijks verschijnen er nieuwsberichten op de site. Deze gaan met name over de voortgang in projecten, maar ook over relevante provinciale en regionale ontwikkelingen. In totaal werden in 2025 82 nieuwsberichten op de website geplaatst. Dat aantal ligt iets lager dan in 2024. Dit komt waarschijnlijk omdat er in 2025 een nieuwsbrief minder is verstuurd dan in 2024. De nieuwsberichten verschijnen ook vaak op de gemeentepagina's van de gemeenten Wijdemeren en Stichtse Vecht. Daarnaast worden de berichten doorgeplaatst in de nieuwsbrieven en gedeeld op de social mediakanalen van de betrokken gemeenten en de provincie Noord-Holland.

Digitale nieuwsbrief

In 2025 werden vanuit het programma 5 digitale nieuwsbrieven verstuurd met daarin veel aandacht voor de voortgang van projecten. Regelmatig plaatsen we ook een interview of achtergrondartikel in de nieuwsbrief. De nieuwsbrief kende op 31 december 2025 totaal 895 contacten (2024: 867 contacten).

OVP-middelen

Voor communicatie met partners, bewoners en andere belangenpartijen maken we gebruik van OVP-communicatiemiddelen, zoals bijvoorbeeld briefpapier, presentaties, de jaarlijkse voortgangsrapportage en informatieposters (vooral gebruikt tijdens fysieke informatiebijeenkomsten). Het consequent toepassen van de OVP-huisstijl in de communicatiemiddelen draagt bij aan de herkenbaarheid van het programma én benadrukt de samenwerking tussen de partners.



Regionale en lokale media

In 2025 verschenen in lokale en regionale media diverse artikelen over onderwerpen en projecten van het OVP. De lokale media schonken vooral aandacht aan de maatregelen voor moerasvogels, luwe zones, beheer waterplanten en de faunapassages in de Oostelijke Vechtplassen.

2.3 Projectcommunicatie

Het vergroten van de betrokkenheid van partners, stakeholders en de omgeving (lees: bewoners, grondeigenaren, ondernemers, gebruikers en andere belanghebbenden) bij de diverse projecten was ook in 2025 de belangrijkste doelstelling bij projectcommunicatie. Dat gaat vooral over meedenken, -praten en -doen. De programmapartners ondersteunen dit met transparante en regelmatige communicatie over de voortgang van projecten via verschillende kanalen.

3

Financiën; waar staan we nu?



Waar staan we nu?

Vanaf de start in 2017 zien we dat na acht jaar veel projecten uit het uitvoeringsprogramma zijn gestart, afgevallen of afgerond, maar ook dat er deelprojecten zijn bijgekomen of vervangen. De resterende looptijd van het programma zetten de partners vooral in op de uitvoering van projecten. Daarnaast voeren we projecten af wanneer we zeker weten dat deze niet realiseerbaar zijn in de resterende tijd van het uitvoeringsprogramma. Zo houden we een realistische lijst met haalbare projecten over.

Tabel 1 - Deze tabel geeft in het kort weer welk budget uit het uitvoeringsprogramma is gedekt en uitgegeven. Voor meer informatie zie de pagina *Voortgang in vogelvlucht*.

Schematisch (in miljoenen euro's):	
Raming uitvoeringsprogramma	77,2
Totaal huidige dekking	49
Uitgegeven	19,3
Beschikbaar restbudget	29,7

Ontwikkeling kosten

Programmabreed komen de kosten in 2025 uit op een totaal van € 1,36 miljoen. Over de periode 2017-2025 is er € 19,3 miljoen uitgegeven. Dit is 39,4 % van het huidige gedekte programmabudget van € 49 miljoen. De huidige dekking is met € 0,19 miljoen toegenomen door rente-inkomsten op de Groenfonds-rekening.

Verdeling over de pijlers

De uitgaven in de afgelopen jaren zijn als volgt verdeeld over de drie pijlers van het programma:

- 1.1 t/m 1.7 - Ontwikkelen vrijetijdslandschap: € 12,8 miljoen
- 2.1 t/m 2.5 - Versterken natuurwaarden: € 4,4 miljoen
- 3.1 t/m 3.4 - Moderniseren recreatiesector/organisatiekosten: € 0,63 miljoen
- 4.0 - Bureau- en capaciteitslasten: € 1,4 miljoen

Pas aan het einde van de planuitwerkingsfase, waarbij op basis van planning, risico's en raming het kasritme wordt bepaald, kan een realistisch uitgavenpatroon worden vastgesteld. Dan kunnen we ook een realistische meerjarenprognose afgeven.

4

Status projecten



Projecten Aanpak Oostelijke Vechtplassen		Huidige fase	Scope	Planning	Financiën	Toelichting
1: Ontwikkelen vrijetijdlandschap						
1.1	Recreatieve routes	Realisatie				Voor de Kwaliteitsimpuls Ankeveen hebben de programma-partners afspraken gemaakt over onder andere meer beleving en periodiek onderhoud van het Bergse Pad. De voorbereidingen voor de realisatie van het legakkerfortenpad zijn gestart.
1.2	(Water)recreatie 's-Graveland/Kortenhoef	N.v.t.				<i>Project is na verkenning gestopt: niet haalbaar.</i>
1.3	Alternatieven voor de waterrecreatie (voorheen Vaarverbinding Loosdrechtse Plassen - Hilversums Kanaal)	N.v.t.				<i>Project is na verkenning gestopt: niet haalbaar.</i>
1.5a	Van dorpslint naar recreatieboulevard	N.v.t.				Naar verwachting volgt in 2026 een voorstel voor besteding van het resterend budget.
1.7.1a	Aanpak baggerproblematiek (fase 1)	Realisatie				Na het indrogen van het depot kan fase 1 voorjaar 2026 officieel worden afgesloten.
1.7.1b	Aanpak baggerproblematiek (fase 2-3)	Realisatie				De subsidieregeling voor het baggeren van havens is in april 2025 ingevoerd. Waterbodemonderzoek in de Vuntus en Stille Plas moet uitwijzen of en zo ja waar baggeren nodig is.
1.7.1c	Aanpak baggerproblematiek (beheer)	Planuitwerking				Een voorstel voor de beheerfase baggeren moet nog worden gemaakt.
1.7.2	Aanpak zwevend slib: helder water en ontwikkeling waterplanten (luwe zones)	Planuitwerking				De stuurgroep heeft besloten dat Waterschap Amstel, Gooi en Vecht kan starten met een omgevingstraject begin 2026.
1.8	Herstel en duurzaam behoud legakkerlandschap Kievitsbuurten	Planuitwerking				De stimuleringsregeling voor herstel van legakkers in de Loosdrechtse Plassen geldt vanaf 1 januari 2026.
1.9	Kwaliteitsimpuls De Wijde Blik	Verkenning				De verwachting is dat in 2026 een voorlopig en definitief ontwerp kunnen worden vastgesteld.
1.10	Herstel vaarverbinding de Heul	Realisatie				Het project is in maart 2025 succesvol uitgevoerd. De administratieve afhandeling loopt door in 2026.
2: Versterken natuurwaarden						
2.1	Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Kortenhoef Oost	Verkenning				De provincie Noord-Holland zet in 2026 de natuurontwikkeling in dit gebied weer door na een periode van stilstand.
2.1	Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Kortenhoef West	Verkenning				De provincie Noord-Holland zet in 2029 de natuurontwikkeling in dit gebied weer door na een periode van stilstand.
2.1	Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Ankeveen (HAP/SAP)	Verkenning				De provincie Noord-Holland zet in 2029 de natuurontwikkeling in dit gebied weer door na een periode van stilstand.
2.1	Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Weersloot	Verkenning				De provincie Noord-Holland zet in 2026 de natuurontwikkeling in dit gebied weer door na een periode van stilstand.
2.1	Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Ster van Loosdrecht	Verkenning				De provincie Noord-Holland zet in 2026 de natuurontwikkeling in dit gebied weer door na een periode van stilstand.
2.1	Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Vuntus	Verkenning				De provincie Noord-Holland zet in 2029 de natuurontwikkeling in dit gebied weer door na een periode van stilstand.
2.1	Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Het Hol	Realisatie				Fase 1 is in uitvoering, fase 2 volgt in 2027-2029.
2.2a	Realiseren Ecologische verbindingen – N201	Planuitwerking				Deze werkzaamheden worden meegenomen bij de uitvoering bij wegwerkzaamheden aan de N201.

Projecten Aanpak Oostelijke Vechtplassen		Huidige fase	Scope	Planning	Financiën	Toelichting
2: Versterken natuurwaarden (vervolg)						
2.2b	Realiseren Ecologische verbindingen - Faunapassages	Planuitwerking				De eerste faunapassages zijn gerealiseerd in november 2025. Voor 2026 staat de realisatie van nog 3 faunapassages op de planning.
2.3	Verbeteren waterkwaliteit	Planuitwerking				Het maatregelenpakket is in uitvoering en loopt door na 2027.
2.4.3a	Planuitwerking natuurmaatregelen voor moerasvogels	Realisatie				De maatregelen in Ankeveen en Kortenhoef Oost lopen door tot voorjaar 2026. De maatregelen op de Loosdrechtse Plassen zijn in mei 2025 afgerond.
2.4.3b	Quickscan Nieuwe Polderplas	Verkenning				Wachten op een besluit van de provincie Noord-Holland over de toekomst van deze plas.
2.5.2	Maatregelen ganzenvraat	Realisatie				Jaarlijks wordt de eventuele schade aan de rasters gerepareerd en een deel van de nylonnetten vervangen door gaas als verbetermaatregel.
2.5.3	Bestrijding exoten / overlastgevende waterplanten	Planuitwerking				De stuurgroep heeft het voorstel Beheer waterplanten in december 2025 goedgekeurd en € 1,3 miljoen vrijgemaakt voor de uitwerking.

3. Moderniseren recreatiesector						
3.1	Gebiedsloods	N.v.t.				Er vinden geen inspanningen meer plaats voor dit project vanwege het ontbreken van budget.
3.2a	Transitieteam Recreatie en Toerisme	N.v.t.				Er vinden geen inspanningen meer plaats voor dit project.
3.2b	Toekomstbeeld Recreatie 2030	N.v.t.				Het rapport is opgeleverd en dient als inspiratie voor ontwikkelingen in het gebied.
3.4	Verkenning bedrijveninvesteringszone / investeringsfonds	N.v.t.				Uit de verkenning bleek dat er geen mogelijkheden zijn, waarmee dit project is afgerond.

	Scope	Planning	Budget/Financiën	Toelichting
Groen	Het project loopt volgens de vastgestelde scope (Geen aandachtspunten)	Het project verloopt volgens de vastgestelde/huidige planning (Geen aandachtspunten)	Het project blijft binnen het budget (Geen aandachtspunten)	N.v.t.
Oranje (vereist een toelichting)	Project blijft niet binnen scope (Vraagt aandacht projectteam)	Het project verloopt niet volgens planning maar is wel in 2027 uitgevoerd (Vraagt aandacht projectteam)	Project blijft niet binnen budget maar kan nog wel uitgevoerd worden (Vraagt aandacht projectteam)	Toelichting verplicht
Rood (vereist een toelichting)	Project blijft niet binnen scope (Aandacht gevraagd (RG/SG) of extra mandaat nodig)	Project is niet in 2027 uitgevoerd (Aandacht gevraagd (RG/SG) of extra mandaat nodig)	Project kan niet worden uitgevoerd door financiën. (Aandacht gevraagd (RG/SG) of extra mandaat nodig)	Toelichting verplicht
Grijs	Project is gestopt	Project is gestopt	Project is gestopt	Toelichting verplicht

5

Pijler 1

Ontwikkelen
vrijetijdslandschap



Project 1.1 Recreatieve verbindingen

Projecttrekker(s)	Gemeente Wijdmeren en gemeente Stichtse Vecht		
Projectraming volgens UVP	€ 2.621.000		
Fase project	Realisatie		
Datum goedkeuring huidig PVA (SG/RG)	18 december 2024		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Betrokken partijen	Gemeente Wijdmeren, gemeente Stichtse Vecht, gemeente Hilversum, provincie Noord-Holland, provincie Utrecht, Natuurmonumenten, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Plassenschap Loosdrecht e.o. en private partijen.		
Samenhang overige projecten	Er bestaat samenhang met: diverse projecten Natuurontwikkeling (2.1), Van dorpslint naar recreatieboulevard (1.5), Aanleg van nieuwe vaarverbindingen (1.3), Alternatieve projecten waterrecreatie (1.2), Ontwikkeling van de Nieuwe Polderplas en Transitieteam recreatie en toerisme (3.2).		

Resultaatbereik 2025

Beoogd resultaat

- De gemeente Wijdmeren zet in op realisatie van het Uitvoeringsprogramma Kansrijke Recreatieve Routes voor 2028, met uitzondering van de kanoroutes.
- In 2025 start de gemeente met de onderdelen:
 - Kwaliteitsimpuls Ankeveen - De verwachting is dat in 2025 de uitvoering van concrete maatregelen kan starten.
 - Wandelpad Stichtse Vecht – Legakker Fortenpad – De gemeente Wijdmeren draagt de uitvoering over aan de gemeente Stichtse Vecht en maakt afspraken over realisatie voor 2028.
 - Wandelpad Nieuw-Loosdrecht doorsteek Weersloot – De gemeente Wijdmeren start het participatie- en vergunningenproces.
 - Wandelpad Nieuw-Loosdrecht, doorsteek Ster van Loosdrecht – Er wordt verkend hoe de oversteek van de Drecht kan worden gerealiseerd.
- Er is een goede financiële borging en inrichting voor de beheergelden.
- In 2026 starten de overige 2 processen voor de realisatie van wandelpad Horstermeer Radioweg in Nederhorst den Berg en het wandelpad Korremofpad in Kortenhoef.

Bereikt resultaat

- Er is een plan gemaakt voor realisatie van de routes, waarna een wijziging in de oorspronkelijke planning is aangebracht. Zo is het Korremofpad in de planning naar voren gehaald omdat de realisatie van dit pad hand in hand gaat met de realisatie van een defosfateringsinstallatie (DFI) van het Waterschap AGV.

A. Kwaliteitsimpuls Ankeveen

Er is een werkgroep met vertegenwoordigers van Natuurmonumenten, Waterschap AGV, bewoners en gemeente opgericht. Deze werkgroep heeft onderzocht en vastgesteld welke maatregelen getroffen kunnen worden om bestaande recreatieve routes in Ankeveen een impuls te geven. De uitvoering van deze maatregelen is op 1 november gestart met een aftrap tijdens de natuurwerkdag. Vrijwilligers hebben samen met de gemeente Wijdmeren en Natuurmonumenten een grote onderhoudsslag gemaakt bij het Bergse Pad.

B. Wandelpad Stichtse Vecht – Legakker Fortenpad

De gemeente Stichtse Vecht heeft Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) opdracht gegeven onderzoek te doen naar het Legakker Fortenpad als klompenpad in beheer en onderhoud van LEU. Uit de eerste inventarisatie blijkt dat Staatsbosbeheer geen voorstander is van de realisatie van een klompenpad. Staatsbosbeheer is een cruciale partner omdat het pad deels over hun grondgebied zou moeten lopen. Omdat hier geen voortgang wordt geboekt, heeft het LEU de opdracht teruggegeven. Dit onderwerp wordt nog besproken binnen het gebiedsproces Polder Mijnden, waaraan ook Staatsbosbeheer deelneemt. Als laatste optie kan een alternatief pad worden verkend. Dit pad loopt niet naar fort Spion, maar biedt wel uitzicht over het legakkerlandschap.

C. Wandelpad Nieuw-Loosdrecht doorsteek Weersloot

Er is met alle eigenaren en pachters van deze route gesproken. Gemeente Wijdemeren voert onderhandelingen met een particuliere grondeigenaar over verwerving van een perceel. Met andere grondeigenaren wordt een overeenkomst ten behoeve van het wandelpad uitgewerkt.

D. Wandelpad Nieuw-Loosdrecht, doorsteek Ster van Loosdrecht

Doordat de ontwikkelingen rond de DFI Kortenhoef in een stroomversnelling zijn gekomen, is besloten het Korremofpad eerder op te pakken dan de doorsteek Ster van Loosdrecht. In december 2025 is contact opgenomen met de vereniging Ster van Loosdrecht als belangrijkste gebiedspartij.

E. Korremofpad

Waterschap AGV treft voorbereidingen om een DFI te realiseren langs het Korremofpad. Hiertoe heeft Waterschap AGV percelen van de gemeente nodig en worden inrichtingsmaatregelen getroffen. Waterschap AGV en de gemeente werken aan een afspraak over het gebruik van de gemeentelijke percelen en de wandelroute. In de voorbereiding is ook met de pachter van het perceel gesproken.

F. Horstermeer Radioweg

Samen met de gemeente Hilversum is gesproken met de pachter van percelen langs een deel van deze route. De afspraken met deze pachter moeten nog uitgewerkt worden. De gemeente Wijdemeren, Waterschap AGV en Natuurmonumenten werken aan een overeenkomst voor het vestigen van de route. In afwachting van het definitief ontwerp van het gebiedsproces is afgesproken nu alleen het westelijk deel van deze route te realiseren. Het oostelijk deel krijgt na vaststelling van het definitief ontwerp een vervolg.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting
Huidige fase		Realistatie	.	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 1.499.173	€ 2.621.000	2024 – Alle overgebleven middelen zijn geoormerkt voor het Uitvoeringsprogramma Kansrijke Recreatieve Routes.
Herzien projectbudget		€ 1.499.173	€ 1.519.173	Er is € 80.000 overgeheveld t.b.v. inhuur projectleiding Horstermeer-Zuid. Ten behoeve van de dekking van de algemene programmakosten is 3,5 % van het budget afgeroomd. Er is geen dekking voor project Fort Spion € 650.000. Een bedrag van € 20.000 is gelabeld voor Nera-investeringen.
Totaal besteed	T/m 2024	€ 88.353	€ 88.353	
	In 2025	€ 4.691	€ 4.691	De kosten zijn gemaakt voor project Kwaliteitsimpuls Ankeveen en Doorsteek Weersloot.
	Totaal	€ 93.044	€ 93.044	
Resterend budget		€ 1.317.776	€ 1.317.776	

Doorkijk 2026

Beoogd resultaat

- De maatregelen van de Kwaliteitsimpuls Ankeveen worden opgeleverd.
- Afspraken met grondeigenaren en pachters rond de doorsteek Weersloot en het wandelpad Horstermeer-Radioweg worden vastgelegd.
- De doorsteek Weersloot en Horstermeer-Radioweg in niet permanente vorm worden gerealiseerd.
- Afspraken over de doorsteek Ster van Loosdrecht worden vastgelegd met de Vereniging Ster van Loosdrecht.
- Met Waterschap AGV worden afspraken gemaakt en vastgelegd rond deelgebruik van voorzieningen en grond rond de DFI en het Korremofpad.

Risico's scope, planning, financiën

- Medewerking aan de wandelpaden wordt soms gebruikt als drukmiddel om op andere dossiers zaken voor elkaar te krijgen. De praktijk van het realiseren van wandelpaden is hierdoor stroperig en complex.
- Sinds het onderzoek van Hofstra Heersche naar de haalbaarheid van de routes hebben betrokken partijen als grondeigenaren en pachters hun standpunten veranderd. Daardoor kunnen we niet automatisch op medewerking rekenen.
- Een particuliere grondeigenaar bij de doorsteek Weersloot wenst enkel mee te werken door zijn perceel aan de gemeente te verkopen. Voor de aankoop van dergelijke percelen is geen budget opgenomen in de raming. We proberen dit op te vangen door aanpassing van inrichtingskosten, beheer en onderhoud.

Project 1.5a Van dorpslint naar recreatieboulevard

Projecttrekker(s)	Gemeente Wijdmeren		
Projectraming volgens UVP	€ 60.000 voor totaal project 1.5, waarvan € 45.000 voor de gemeente Wijdmeren		
Fase project	Verkenning		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	31 maart 2021 (intakeformulier)		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Betrokken partijen	Gemeente Wijdmeren, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, recreatiesector, VVBB, bewoners en eigenaren belendende percelen.		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: NNN-realiseatie in Weersloot en in Ster van Loosdrecht (2.1), Maatregelen voor moerasvogels (2.4), Transitieteam recreatie en toerisme (3.2), Onderzoek Ontsluiting en Toegankelijkheid (1.4) en Faunapassages (2.2).		

Resultaatbereik 2025

Beoogd resultaat

- De gemeente Wijdmeren voert overleg met de bewonersverenigingen over de vervolgstappen.
- De inzet is het resterende budget van € 25.620 in te zetten voor enkele praktisch uitvoerbare maatregelen die de dijk(en) verfraaien. Te denken valt aan bloembakken, extra verlichting en andere aankleding die de beleving vergroot.

Bereikt resultaat

- In 2025 heeft het project stilgelegen door gebrek aan capaciteit.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting
Huidige fase		Verkenning Planuitwerking	-	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 30.000	€ 45.000	Dit betreft het deel van de gemeente Wijdmeren.
Herzien projectbudget			€ 30.000	Totaal is € 15.000 overgeheveld naar inzet van capaciteit.
Totaal besteed	T/m 2024	€ 4.380	€ 4.380	
	In 2025	€ 0	€ 0	
	Totaal	€ 4.380	€ 4.380	
Resterend budget		€ 25.620	€ 25.620	

Doorkijk 2026

Beoogd resultaat

- De gemeente Wijdemeren voert overleg met de bewonersverenigingen over de vervolgstappen.
- inzet is het resterende budget van € 25.620 in te zetten voor enkele praktisch uitvoerbare maatregelen die de dijk(en) verfraaien. Te denken valt aan bloembakken, extra verlichting en andere aankleding die de beleving vergroot.

Risico's scope, planning, financiën

- Voor het vervolg is zeer beperkt budget beschikbaar. Dit kan de animo van partijen om deel te nemen beperken.

Project 1.7.1a Baggeropgave fase 1

Projecttrekker(s)	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 6.876.315		
Fase project	Nazorgfase, baggeropgave is afgerond.		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)			
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Alleen de betrokken agrariër, verhuurder van de depotlocatie.		
Samenhang andere projecten	Geen		

Resultaatbereik 2025

Beoogd resultaat

- Het depot wordt opgeschoond in Q4 2025.

Bereikt resultaat

- Depot is opgeschoond in 2025.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting
Huidige fase		Nazorg		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP			€ 6.273.315	Statusrapport 567
Herzien projectbudget			€ 6.876.315	
Totaal besteed	T/m 2024		€ 5.109.168	
	In 2025		€ 333.619	
	Totaal		€ 5.442.787	excl. bijdrage van derden TS
Resterend budget			€ 1.433.528	

Doorkijk 2026

Beoogd resultaat

- De financiële afwikkeling met de agrariër is afgerond.

Risico's scope, planning, financiën

- Het depot is in Q4 2025 opgeschoond.
- De Nazorgfase is in Q3 2026 gereed.
- Het project blijft binnen het budget.

Project 1.7.1b Aanpak baggerproblematiek (fase 2-3)

Projecttrekker(s)	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 7.223.685		
Fase project	Voorbereiding en planuitwerking		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	9 oktober 2004		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	<p>Sinds april 2025 is de uitvoeringsregeling voor baggeren havens operationeel. De stuurgroep heeft € 1.750.000 beschikbaar gesteld voor de afvoer en acceptatie van vervuilde bagger uit de havens.</p> <p>In totaal hebben 5 havens gebruik gemaakt van de regeling in 2025, waarbij voor 4.318 m³ bagger subsidie is aangevraagd. Twee havens hebben de subsidie ontvangen. Meer havens willen gebruik maken van de regeling.</p> <p>In afstemming met bewoners is waterbodemonderzoek uitgevoerd in de Vuntus en Stille Plas. Verder is een ontwerp gemaakt voor een vooroever van een afkalvende oever in de Vuntus en is voor drie locaties een natuurtoets uitgevoerd. Deze is voor twee locaties nodig als onderbouwing van het gebruik van deze locaties als depot en voor één locatie voor een vooroever in de Vuntus.</p>		
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland, provincie Utrecht, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, gemeente Wijdemeren, gemeente Stichtse Vecht, gemeente Hilversum, HISWA-Recron, het Watersportverbond, stichting Kievitsbuurten, Natuurmonumenten, Bewonersfederatie OVP		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: Zwevend slib en Waterplanten (1.7.2), Herstel legakkerlandschap (1.8).		

Resultaatbereik 2025

Beoogd resultaat

- De eerste havens zijn gestart met baggeren (ambitie is 15.000 m³).
- De depotlocatie(s) in het Plassengebied zijn bekend.
- De stuurgroep heeft een besluit genomen over de bijdrage aan oeverherstel op verschillende plekken in het gebied, onder andere in de Vuntus.
- De stuurgroep heeft een besluit genomen over de bijdrage aan en de afwerking van het depot in de Stille Plas.
- De stuurgroep heeft een besluit genomen over de ondersteuning van private baggerinitiatieven in het Plassengebied.

Bereikt resultaat

- Vijf havens hebben het baggeren afgerond. De hoeveelheid bagger komt lager uit dan is berekend. De voorbereiding voor havens neemt meer tijd in beslag dan gedacht en de urgentie bij de havens lijkt minder dan verwacht.
- Twee depotlocaties zijn bekend en kunnen worden gebruikt.
- De stuurgroep heeft besloten een ontwerp te laten maken voor een vooroever in de Vuntus. Dit onderzoek is in 2025 uitgevoerd.

- Voor het depot in de Stille Plas is een natuurtoets uitgevoerd. Verder is overleg gevoerd met de eigenaar Natuurmonumenten en bewoners aan de plas. Een herinrichting van het depot kent een lange aanloop. Vooral nog wordt niet voorgesorteerd op een besluit hierover in de stuurgroep.
- Een baggerscope voor de Vuntus en de Stille Plas kan worden opgesteld nu de waterbodemonderzoeken zijn uitgevoerd. Bewoners aan de plassen stemmen met de buurt af in hoeverre zij initiatief nemen om vanuit het programma OVP ondersteuning te krijgen in de vorm van subsidie.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting
Huidige fase				
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 4.209.200	€ 6.967.086	
Herzien projectbudget		€ 4.712.230	€ 6.367.086	
Totaal besteed	T/m 2024	€ 2.491.983	€ 2.491.983	
	In 2025	€ 181.172	€ 181.172	
	Totaal	€ 2.673.156	€ 2.673.156	
Resterend budget		€ 2.039.074	€ 3.693.930	

Doorkijk 2026

Verwacht resultaat

- Nog vijf havens zijn gebaggerd waarbij in totaal 10.000 m3 bagger is afgevoerd.
- Er is gebruik gemaakt van een van de depots in het gebied voor het bergen van bagger.
- De stuurgroep besluit over het realiseren van de vooroever in de Vuntus.
- Er is een baggerscope voor de Vuntus en de Stille plas voorgelegd aan de Stuurgroep met verzoek middelen voor de uitvoering ter beschikking te stellen.

Risico's scope, planning, financiën

- De jachthavens baggeren minder omdat zij de kosten, met inachtneming van de subsidie, te hoog vinden. In 2025 geldt er ook een km-heffing voor transport waardoor de afvoerkosten hoger uitvallen.
- Er zijn onvoldoende resterende middelen om knelpunten in de Stille Plas en de Vuntus op te lossen.

Project 1.7.2 Aanpak zwevend slib: helder water en ontwikkeling waterplanten

Projecttrekker(s)	Waterschap Amstel, Gooi en Vecht		
Projectraming volgens UVP	€ 6.050.000		
Fase project	Planuitwerking		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	Regiegroep 20 april 2023		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	De voortgang wijkt af van de planning uit het in april 2023 vastgelegde PvA (dat uitging van besluitvorming en realisatie van luwe zones in 2024). In 2025 lag de focus op het aanscherpen van randvoorwaarden op het gebied van veiligheid, beheer en participatie. Dit heeft geleid tot besluitvorming in de stuurgroep van 17 december 2025. Daarmee is de planvormingsfase afgerond en is de volgende stap ingezet: ontwerpfase.		
Betrokken partijen	Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, provincie Noord-Holland, gemeente Wijdmeren, Plassenschap e.o.		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: Aanpak baggerproblematiek (1.7.1), Verbeteren waterkwaliteit (2.3), Herstel legakkerlandschap (1.8), Maatregelen voor moerasvogels (2.4) en Bestrijden van exoten (2.6)		

Resultaatbereik 2025

Beoogd resultaat

- Er ligt een vernieuwd plan voor de aanpak van de realisatie van luwe zones.
- Er ligt een beheerplan voor de luwe zones.
- De aanleg van de luwe zones is gestart.

Bereikt resultaat

- De ontwerpvarianten en locaties uit het uitvoeringsplan zijn in 2025 in meerdere participatiesessies besproken en waar nodig aangepast.
- De stuurgroep heeft op 17 december 2025 ingestemd met het opstarten van de ontwerpfase waarin Waterschap AGV samen met een landschapsarchitect en de omgeving een traject doorlopen om luwe zones binnen de kansrijke locaties in de Loosdrechtse Plassen vorm te geven, met inachtneming van veiligheidsaspecten, beheerafspraken en participatie.
- Keuzes over waterplantenbeheer zijn belegd bij het Kernteam Beheer waterplanten (integraal en gebiedsbreed).

Projectcijfers per fase

		Huidig fase	Totaal project	Toelichting
Huidige fase		Planuitwerking		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 1.050.000	€ 3.650.000	
Herzien projectbudget			€ 1.651.661	De subsidie van € 1.880.000 is uit het budget gehaald; deze subsidie wordt elders verantwoord. Het projectbudget is verlaagd met € 118.339 t.b.v. dekking programma-kosten.
Totaal besteed	T/m 2024	€ 601.678	€ 601.678	
	In 2025	-	-	
	Totaal	€ 601.678	€ 601.678	
Resterend budget		€ 448.322	€ 1.049.983	

Doorkijk 2025

Verwacht resultaat

- Er zijn een definitief ontwerp en bestek opgesteld, in samenwerking met een landschapsarchitect.
- De nautische en veiligheidstoets zijn uitgevoerd.
- De benodigde vergunningen zijn aangevraagd.
- Het beheer en onderhoudstaken zijn afgestemd met betrokken partijen.
- Het participatietraject is conform het KRW-participatieplan uitgevoerd.

Risico's scope, planning, financiën

- Inpassing van zorgpunten (recreatie, veiligheid en beheer) kan leiden tot aanpassingen in ontwerp en locatie.
- De doorlooptijd kan oplopen door aanpassingen in het ontwerp en/of vergunningverlening en participatietraject.
- De kosten blijven afhankelijk van het nog vast te stellen ontwerp (inclusief landschappelijke inpassing, demping stroming en golfslag, nautische veiligheid).

Project 1.8 Herstel en duurzaam behoud legakkerlandschap Kievitsbuurten

Projecttrekker(s)	Gemeente Stichtse Vecht		
Projectraming volgens UVP	€ 1.200.000 (uitvoering) Totaal € 2.100.000		
Fase project	Stimuleringsregeling Uitvoering Legakkerherstel particulieren		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	April 2019		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	De methodieken die eigenaren kunnen toepassen zijn bekend. De verwachting was dat voor de zomer 2025 de regeling 'open' zou gaan. Dit is half jaar later geworden door het opstellen van de subsidieregeling, de goedkeuring door het college en de selectie van de aannemer voor uitvoering van de werkzaamheden. De regeling is opengegaan per 1-1-2026.		
Betrokken partijen	Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Plassenschap Loosdrecht e.o, Vereniging Kievitsbuurten.		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: Baggeren (1.7), Betere waterkwaliteit (2.3), Maatregelen voor moerasvogels (2.4).		

Resultaatbereik 2025

Beoogd resultaat

- De methodieken die in de stimuleringsregeling mogen worden uitgerold, zijn nader gespecificeerd.
- De stimuleringsregeling is voor de zomer 2025 uitgewerkt en opengesteld.
- In het najaar vindt beoordeling en vervolgens vergunning plaats van de aanvragen.
- Particulieren kunnen met vooraf geselecteerde aannemers de uitvoering opstarten vanaf november 2025.

Bereikt resultaat

- De stimuleringsregeling voor herstel en duurzaam behoud legakkerlandschap voor particulieren is voorbereid.
- De methode is vastgesteld en afgestemd met het bevoegd gezag voor de vergunning.
- Het subsidiereglement is opgesteld en vastgesteld door het college.
- De aannemer is geselecteerd via een meervoudig onderhandse aanbesteding.
- De subsidieregeling is open gegaan op 1-1-2026.
- De ecologische monitoring heeft in 2025 plaatsgevonden.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting
Huidige fase		Realisatie		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 1.200.000	€ 2.100.000	In totaal is € 2.100.000 beschikbaar voor dit project. Het budget voor fase 1 en 2 is € 1.200.000. Voor fase 3, de stimuleringsregeling zelf, was oorspronkelijk € 900.000 begroot. Dit bedrag is bijgesteld naar € 868.320.
Herzien projectbudget		€ 1.218.275	€ 2.118.275	Het projectbudget is met € 31.725 verlaagd t.b.v. dekking van de programmakosten. In 2024 is het budget met € 50.000 verhoogd voor een langere periode van het project en extra monitoring in 2025.
Totaal besteed	T/m 2024	€ 1.160.770	€ 1.160.770	
	In 2025	€ 89.230	€ 89.230	
	Totaal	€ 1.250.000	€ 1.250.000	
Resterend budget		-	€ 868.320	Voor de stimuleringsregeling is € 868.320 beschikbaar.

Doorkijk 2026

Verwacht resultaat

- Er melden zich vele eigenaren voor de subsidie.
- Er wordt voldaan aan de voorwaarden zodat de subsidie wordt goedgekeurd.
- Particulieren vragen in samenwerking met de aannemer de benodigde vergunningen aan.
- De eerste uitvoering van de werkzaamheden start in najaar 2026.
- In de maand januari zijn de eerste 14 subsidieaanvragen ontvangen.

Risico's scope, planning, financiën

- Het grootste risico is de beschikbaarheid van bagger voor de verondieping van de natuuroever en het herstel van de legakkers. Dat betreft niet alleen voldoende bagger van de juiste kwaliteit en op het juiste moment (afstemming met de uitvoering). Dit kan ook financieel een groot risico vormen.

Project 1.9 Kwaliteitsimpuls de Wijde Blik

Projecttrekker(s)	Natuurmonumenten		
Projectraming volgens UVP	€ 120.000 (Incl. btw)		
Fase project	orlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp		
datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	9 april 2025		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Na toekenning van € 51.000 (50% financiering) vanuit het programma OVP, is in 2025 de overige 50% cofinanciering gezocht en toegekend (gemeente Wijdmeren Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Natuurmonumenten). In augustus 2025 is een externe projectleider gestart met voorbereidende werkzaamheden, waaronder het schrijven van een plan van aanpak en het uitvragen van offertes. Vervolgens is verkend hoe de werkzaamheden binnen de scope en het budget kunnen worden uitgevoerd.		
Betrokken partijen	Ondernemers Wijde Blik, Natuurmonumenten, gemeente Wijdmeren, bewonersvereniging, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: Integreeren recreatie en natuur (3.3) en Maatregelen voor Moerasvogels (2.4).		

Resultaatbereik 2025

Beoogd resultaat

- De financiering van het project is rond.
- De actuele kosten van het realiseren van het project zijn op basis van offertes helder.
- Een extern projectleider, landschapsarchitect en ecooloog zijn verbonden aan het project.
- Er is een plan van aanpak opgesteld.

Bereikt resultaat

- De financiering van het project is rond.
- De actuele kosten van het realiseren van het project zijn op basis van offertes helder.
- Een extern projectleider en ecooloog zijn verbonden aan het project. N.a.v. verkennende gesprekken met een landschapsarchitect is geconcludeerd dat zijn inzet zeer beperkt is. Een aannemer kan de resterende werkzaamheden uitvoeren.
- Er is een plan van aanpak opgesteld.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting
Huidige fase				
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 18.000	€ 18.000	
Herzien projectbudget		€ 120.000	€ 120.000	Voor het Voorlopig Ontwerp en het Definitief Ontwerp is € 51.000 van het totaalbudget van € 102.000 vanuit het OVP toegekend. De overige cofinanciering van € 51.000 hebben verschillende betrokken partijen ook toegekend.
Totaal besteed	T/m 2024	€ 4.483	€ 4.483	
	In 2025	€ 1.022	€ 1.022	Dit bedrag is besteed aan de inzet van een projectleider.
	Totaal	€ 5.505	€ 5.505	
Resterend budget		€ 96.494	€ 96.494	

Doorkijk 2026

Verwacht resultaat

- Met de beschikbaar gestelde middelen wordt toegewerkt naar een Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp.
- De financieringsmogelijkheden voor de realisatie zijn onderzocht.

Risico's scope, planning, financiën

- We verkennen of alle maatregelen volgens de scope en binnen het budget en de planning kunnen worden uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp en een Definitief Ontwerp.
- Gezien het aflopen van het programma in 2027 is voortgang van het Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp in 2026 van belang.
- Bij het uitblijven van toekenning van middelen voor de realisatiefase komt het project stil te liggen.

Project 1.10 Herstel vaarverbinding De Heul

Projecttrekker(s)	Gemeente Wijdmeren		
Projectraming volgens UVP	€ 600.000		
Fase project	Voorbereiding en Uitvoering		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	10-04-2024 en 26-06-2024		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Herstel vaarverbinding De Heul is als nieuw project toegevoegd aan het programma OVP. Vanwege het belang van het behoud van deze vaarverbinding voor het recreatief product van de Oostelijke Vechtplassen heeft de stuurgroep besloten een deel van de resterende middelen uit de niet realiseerbare projecten voor de waterrecreatie (1.2 en 1.3) hieraan te besteden. Met deze besteding blijft een belangrijke vaarverbinding in stand.		
Betrokken partijen	Gemeente Wijdmeren, gemeente Stichtse Vecht, gemeente Hilversum, provincie Noord-Holland, provincie Utrecht, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Plassenschap Loosdrecht e.o., Watersportverbond, Hiswa Recron en de Bewonersfederatie.		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang (vanwege financiering) met: Aanleg van nieuwe vaarverbindingen (1.3) en Alternatieve projecten waterrecreatie (1.2)		

Resultaatbereik 2025

Beoogd resultaat

- De vaarverbinding is hersteld voor aanvang van het recreatiesizoen in 2025.

Bereikt resultaat

- De vaarverbinding is hersteld voor aanvang van het recreatiesizoen in 2025.
- De administratieve kant heeft meer tijd nodig gehad en is eind 2025 nagenoeg afgerond.
- Het project is ruim binnen het geraamde budget gebleven. De gemeente Wijdmeren houdt € 10.000 in kas voor onvoorziene kosten omdat nog niet alle notarishandelingen zijn afgerond. Over dit bedrag wordt aan het einde van het programma verantwoording afgelegd.
- Het project is afgerond. Totaal vloeit € 48.083 terug naar project 1.3 Alternatieve projecten waterrecreatie.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting
Huidige fase		Uitvoering		
Budget goedgekeurd		€ 50.000		Vorbereidingskrediet
		€ 550.000	€ 600.000	Uitvoeringskrediet
Totaal besteed	t/m 2024		€ 119.479	
Totaal besteed	In 2025		€ 432.438	Uitvoering € 388.342 Notaris € 13.769 Juridische begeleiding € 327 Projectleiding en toezicht €20.000 Onvoorzien 26/27 € 10.000
	In 2025		€ 551.917	
Resterend budget			€ 48.083	

Doorkijk 2026

Verwacht resultaat

- De laatste administratieve handelingen worden afgerond.

Risico's scope, planning, financiën

- De laatste administratieve handelingen zijn afgerond.

6

Pijler 2

Versterken
natuurwaarden



Project 2.1 Natuurontwikkeling (NNN) Kortenhoef Oost

Projecttrekker(s)	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 1.950.000		
Fase project	Planvorming		
Datum goedkeuring huidig PVA (SG/RG)	11 november 2025 (programmering realisatie strategie)		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	<p>Het gebiedsproces in de Kortenhoef Oost heeft vertraging opgelopen i.v.m. het opheffen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied en het bijbehorende Transitiefonds door het Rijk. GS hebben besloten om uit eigen middelen budget vrij te maken voor NNN-realisatie in een deel van OVP, waaronder Kortenhoef Oost.</p> <p>Er worden nu voorbereidingen getroffen om verder te gaan met het gebiedsproces. De ambitiekaart voor Kortenhoef Oost is medio februari 2026 gereed. Keukentafelgesprekken met de grondeigenaren worden in Q1 2026 opgestart. We zijn bezig met de inkoop voor het inrichtings- en beheerplan en begeleiding bij de planologische procedure en met een plan voor brede participatie en voorlichtingsbijeenkomsten.</p> <p>Het draagvlak voor natuurrealisatie hangt samen met de ontwikkelingen rondom de voormalige vuilstort Groenewoud. Daarom wordt nauw opgetrokken met het projectteam deelsanering Groenewoud.</p> <p>Capaciteit, op alle betrokken afdelingen, blijft een aandachtspunt.</p>		
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland, gemeente Wijdmeren, gemeente Hilversum, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Natuurmonumenten, BAKEN en aangesloten grondeigenaren.		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met de overige natuurontwikkelingsprojecten.		

Resultaatbereik 2025

Beoogd resultaat

- De ambitiekaart is herzien.
- Het eco- en hydrologisch onderzoek is gestart.
- De inkoop wordt gestart voor een overkoepelend inrichtingsplan en planologische procedure. Dit laatste is inclusief participatieplan en bestuurlijke besluitvorming over de startnotitie.
- Ongeveer 20 eigenaren tekenen voor NNN-realisatie. Daarmee zijn 15 inrichtingsplannen gereed.
- Er vindt (her)bevestiging plaats van de scope van het project, inclusief eventuele aanvullende opgaven KRW, stikstof en N2000.

Bereikt resultaat

- De ambitiekaart is herzien en geüpdatet.
- De opdracht voor het eco-en hydrologisch onderzoek is verleend en er is gestart met het uitvoeren van veldonderzoek op enkele percelen in Kortenhoef Oost.
- Er zijn voorbereidingen getroffen voor de planologische procedure om de bestemming van de gronden te wijzigen van agrarisch naar natuur.
- Er zijn voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een inrichtings- en beheerplan voor onder andere Kortenhoef Oost.
- De uitnodigingen voor de keukentafelgesprekken zijn in concept gereed.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting
Huidige fase				
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 1.950.000		
Herzien projectbudget		€ 1.855.314		
Totaal besteed	T/m 2024	€ 156.251		
	In 2025	€ 0		
	Totaal	€ 156.251		
Resterend budget		€ 1.699.063		

Doorkijk 2026**Verwacht resultaat**

- De brieven met uitnodiging voor keukentafelgesprekken zijn verstuurd en er hebben gesprekken plaatsgevonden met grondeigenaren.
- De opdracht voor het opstellen van het inrichtings- en beheerplan voor o.a. Kortenhoef Oost is verleend en de uitvoering is gestart.
- Ongeveer 20 eigenaren tekenen voor NNN-realiseatie. Daarmee zijn 15 inrichtingsplannen gereed.
- De invulling van het planologisch traject is bepaald. De opdracht is verleend en er is een start gemaakt met de procedure om de bestemming van de gronden te wijzigen van agrarisch naar natuur.
- De nieuwe afspraken met Vereniging De Ster van Loosdrecht zijn geformaliseerd en in werking getreden.

Risico's scope, planning, financiën

- Door tijdelijk capaciteitstekort, in het bijzonder het tekort aan rentmeesters, loopt het proces vertraging op.
- Er bestaat onvoldoende (bestuurlijk en/of politiek) draagvlak voor de plannen.
- Er wordt onvoldoende natuurontwikkeling behaald.
- Er doen zich op basis van aanvullend onderzoek milieutechnische risico's voor.
- Er vindt een scopewijziging plaats door aanvullingen uit het PPLG en/of vanuit de Rijksoverheid.

Project 2.1 Natuurontwikkeling (NNN) Kortenhoef West

Projecttrekker(s)	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 588.000		
Fase project	Verkenning		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	Nog geen PvA		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	<p>In de Realisatiestrategie NNN heeft de provincie besloten om NNN realisatie in Kortenhoef West pas op de langere termijn op te pakken (naar verwachting vanaf 2029). Als in Kortenhoef West partijen aan de slag willen met NNN-realisatie, kunnen zij zich in de loop van 2026 melden bij het aanjaagteam. Een optie voor NNN-realisatie is (mits wordt voldaan aan een voortoets op de natuurambities) dan een subsidie kwaliteitsimpuls (SKNL).</p> <p>In delen van Kortenhoef West wordt een eco- en hydrologisch onderzoek uitgevoerd. De resultaten worden in oktober verwacht.</p>		
Betrokken partijen	Natuurmonumenten, gemeente Wijdmeren, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, LTO Noord, Baken (op afstand).		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: Natuurontwikkeling Kortenhoef Oost (2.1.1) en Natuurontwikkeling Ankeveen (2.1.2).		

Resultaatbereik 2025

Beoogd resultaat

Het eco- en hydrologisch onderzoek is gestart. Dit onderzoek moet een goed beeld geven van de natuur- en watermogelijkheden in het gebied.

Bereikt resultaat

- Het eco- en hydrologisch onderzoek is gestart.
- In 2025 is er geen actie ondernomen voor NNN-realisatie in Kortenhoef West.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting
Huidige fase		Verkenning		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 50.000	€ 588.000	
Herzien projectbudget			€ 558.839	Projectbudget is verlaagd t.b.v. de dekking van de programmakosten.
Totaal besteed	T/m 2024	€ 0	€ 0	
	In 2025	€ 0	€ 0	Budget OVP is bestemd voor de realisatiefase.
	Totaal	€ 0	€ 0	
Resterend budget		€ 50.000	€ 558.839	

Doorkijk 2026

Verwacht resultaat

- Het eco- en hydrologisch wordt afgerond.
- Voor NNN-realisatie wordt vanuit de provincie geen actie ondernomen. Als partijen zichzelf melden, bekijkt de provincie (het aanjaagteam) welke mogelijkheden er zijn (SKNL aanvraag bijvoorbeeld).

Risico's scope, planning, financiën

- Verlies van momentum in het gebied door vertraging en het gebrek aan contact.

Project 2.1 Natuurontwikkeling (NNN) Ankeveen (HAP/SAP)

Projecttrekker(s)	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 1.270.500		
Fase project	Verkenning		
Datum goedkeuring huidig PVA (SG/RG)	30 oktober 2021		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	<p>In de Realisatiestrategie NNN heeft de provincie besloten om NNN realisatie in Ankeveen pas op de langere termijn op te pakken (naar verwachting vanaf 2029). Als in Ankeveen partijen aan de slag willen met NNN-realisatie, kunnen zij zich in de loop van 2026 melden bij het aanjaagteam. Een optie voor NNN-realisatie is (mits wordt voldaan aan een voortoets op de natuurambities) dan een subsidie kwaliteitsimpuls (SKNL).</p> <p>In delen van Ankeveen wordt een eco- en hydrologisch onderzoek uitgevoerd. De resultaten worden in oktober verwacht.</p>		
Betrokken partijen	Natuurmonumenten, gemeente Wijdmeren, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, LTO Noord, Bakken.		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: Natuurontwikkeling Kortenhoef Oost (2.1.1) en Natuurontwikkeling Kortenhoef West (2.1.3).		

Resultaatbereik 2025

Beoogd resultaat

- Het eco- en hydrologisch onderzoek is gestart. Dit onderzoek moet een goed beeld geven van de natuur- en watermogelijkheden in het gebied.

Bereikt resultaat

- Het eco- en hydrologisch onderzoek is gestart.
- In 2025 is er geen actie ondernomen voor NNN-realisatie in Ankeveen.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting
Huidige fase		Verkenning	-	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 201.185	€ 1.270.500	
Herzien projectbudget			€ 1.206.622	Het projectbudget is verlaagd t.b.v. dekking van de programmakosten.
Totaal besteed	T/m 2024	€ 19.492	€ 19.492	
	In 2025	€ 0	€ 0	De financiën in de verkennende fase komen vanuit het budget NNN-regiebureau.
	Totaal	€ 19.492	€ 19.492	
Resterend budget		€ 181.693	€ 1.187.130	

Doorkijk 2026

Verwacht resultaat

- Het eco- en hydrologisch is afgerond.
- Voor NNN-realiserie onderneemt de provincie geen actie. Als partijen zich melden, bekijkt de provincie (het aanjaagteam) welke mogelijkheden er zijn (SKNL aanvraag bijvoorbeeld).

Risico's scope, planning, financiën

- Verlies van momentum in het gebied door vertraging en het gebrek aan contact.

Project 2.1 Natuurontwikkeling (NNN) Weersloot

Projecttrekker (s)	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 2.385.500		
Fase project	Planvorming		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	10 april 2021		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Het gebiedsproces Weersloot heeft vertraging opgelopen door onzekerheden die het vervallen van het Transitiefonds met zich meebrengt. Het afgelopen jaar hebben we duidelijkheid gekregen over de beschikbare middelen voor NNN-realiseren en hebben we voorbereidingen getroffen om verder te gaan met het gebiedsproces en de natuurrealisatie. Het komende jaar gaan we in gesprek met de grondeigenaren, werken we de kavelruil uit en sluiten we de eerste overeenkomsten voor zelfrealisatie. Daarnaast starten we met het opstellen van een inrichtings- en beheerplan en een planologische procedure voor de bestemmingswijzigingen. Capaciteit, op alle betrokken afdelingen, blijft een aandachtspunt.		
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland, gemeente Wijdmeren, gemeente Hilversum, Natuurmonumenten, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Vereniging Weersloot en grondeigenaren.		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: NNN-realiseren in Kortenhoef Oost (2.1.1) en de Ster van Loosdrecht (2.1.5).		

Resultaatbereik 2025

Beoogd resultaat

- De opdracht is verleend en er is gestart met het uitvoeren van het eco- en hydrologisch onderzoek op enkele percelen in het gebied.
- De opdracht is verleend en de uitvoering gestart van het opstellen van een overkoepelend inrichtingsplan voor het Weerslootgebied. Dit is inclusief inrichtingsplannen op perceelniveau.
- Er is een start gemaakt met de planologische procedure om de bestemming van de gronden te wijzigen van agrarisch naar natuur. Hierover voert de provincie overleg met de gemeente Wijdmeren.
- De uitvoering van de kavelruil is gestart.
- Er hebben gesprekken plaatsgevonden met grondeigenaren waarbij is gesproken over de natuurontwikkeling op hun percelen.

Bereikt resultaat

- De ambitiekaart is herzien en geüpdatet.
- De opdracht voor het eco-hydrologisch onderzoek is verleend en er is gestart met het uitvoeren van veldonderzoek op percelen in de Weersloot.
- De voorbereiding van de kavelruil in de Weersloot is voorgezet.
- Er zijn voorbereidingen getroffen voor de planologische procedure om de bestemming van de gronden te wijzigen van agrarisch naar natuur.
- Er zijn voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een inrichtings- en beheerplan voor onder andere de Weersloot.
- Met het bestuur van de vereniging Weersloot zijn gesprekken gevoerd over de ontwikkelingen en de voortgang van het gebiedsproces in de Weersloot.
- De brieven met uitnodigingen voor de keukentafelgesprekken zijn in concept gereed.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting
Huidige fase		Verkenning		
Budget goedgekeurd PVA SG / volgens UVP		€ 2.385.000		
Herzien projectbudget		€ 2.275.275		
Totaal besteed	T/m 2024	€ 332.065		
	In 2025	€ 92.493		Natuurinrichting in Egelshoek
	Totaal	€ 424.558		
Resterend budget		€ 1.850.718		

Doorkijk 2026

Verwacht resultaat

- De uitvoering van de kavelruil is gestart.
- De brieven met de uitnodiging voor keukentafelgesprekken zijn verstuurd en er hebben gesprekken plaatsgevonden met grondeigenaren. Dit zowel met diegene die meedoen in de kavelruil als met de grondeigenaren die niet meedoen in de kavelruil. Ook zijn waar mogelijk afspraken gemaakt over de natuurontwikkeling op hun percelen.
- De opdracht voor het opstellen van het inrichtings- en beheerplan voor onder andere de Weersloot is verleend en de uitvoering is gestart.
- De invulling van het planologisch traject is bepaald. De opdracht is verleend en er is een start gemaakt met de procedure om de bestemming van de gronden te wijzigen van agrarisch naar natuur.

Risico's scope, planning, financiën

- Door tijdelijk capaciteitstekort loopt het proces vertraging op.
- Er bestaat onvoldoende (bestuurlijk en/of politiek) draagvlak voor de plannen.
- Er wordt onvoldoende natuurontwikkeling behaald.
- Er doen zich op basis van aanvullend onderzoek milieutechnische risico's voor.

Project 2.1 Natuurontwikkeling (NNN) Ster van Loosdrecht

Projecttrekker(s)	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 2.691.000		
Fase project	Planvorming		
Datum goedkeuring huidig PVA (SG/RG)	11 november 2025 (programmering realisatie strategie)		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	<p>Het gebiedsproces in de Ster van Loosdrecht heeft vertraging opgelopen i.v.m. het opheffen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied en het bijbehorende Transitiefonds door het Rijk. GS hebben besloten om uit eigen middelen budget vrij te maken voor NNN-realisatie in een deel van OVP, waaronder Ster van Loosdrecht.</p> <p>Er worden nu voorbereidingen getroffen om verder te gaan met het gebiedsproject. De ambitiekaart voor de Ster van Loosdrecht is medio februari gereed. Afgelopen jaar hebben we met Vereniging De Ster van Loosdrecht contact onderhouden over de NNN-realisatiestrategie. De keukentafelgesprekken met de grondeigenaren worden in Q1 2026 opgestart. We zijn bezig met de inkoop voor het inrichtings- en beheerplan en begeleiding bij de planologische procedure en met een plan voor brede participatie en voorlichtingsbijeenkomsten.</p> <p>Capaciteit, op alle betrokken afdelingen, blijft een aandachtspunt.</p>		
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland, gemeente Wijdemeren/Gemeente Hilversum, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Natuurmonumenten, Vereniging Ster van Loosdrecht en aangesloten grondeigenaren.		
Samenhang andere projecten	<p>Dit project hangt nauw samen met de NNN-realisatie in Kortenhoef Oost en de Weersloot. Er is ook sprake van gezamenlijke aanpak zoals bij het inrichtings- en beheerplan en de planologische procedure. Beide worden OVP breed opgesteld en uitgevoerd, de Ster van Loosdrecht is onderdeel daarvan.</p> <p>Daarnaast is er samenhang met andere programma's en opgaven, waaronder het Programma Natuurherstel, het Programma Stikstof en de Kaderrichtlijn Water. Deze programma's dragen gezamenlijk bij aan het behalen van de instandhoudingsdoelen voor Natura 2000.</p>		

Resultaatbereik 2025

Beoogd resultaat

- De ambitiekaart is herzien.
- Het eco- en hydrologisch onderzoek is gestart.
- De inkoop wordt gestart voor een overkoepelend inrichtingsplan en planologische procedure. Dit laatste is inclusief participatieplan en bestuurlijke besluitvorming over de Kennisgeving Projectbesluit.
- Er is een akkoord bereikt met de Vereniging Ster van Loosdrecht over een nieuw uitvoeringsprogramma (2024 en verder).

- Ongeveer 20 eigenaren tekenen voor NNN-realiserie. Daarmee zijn 15 inrichtingsplannen gereed.
- Er vindt (her)bevestiging plaats van de scope van het project, inclusief eventuele aanvullende opgaven KRW, stikstof en N2000.

Bereikt resultaat

- De ambitiekaart is herzien en geüpdatet.
- De opdracht voor het eco-hydrologisch onderzoek is verleend. Het veldonderzoek op enkele percelen in de Ster van Loosdrecht is gestart.
- Er zijn voorbereidingen getroffen voor de planologische procedure om de bestemming van de gronden te wijzigen van agrarisch naar natuur.
- Er zijn voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een inrichtings- en beheerplan voor onder andere de Ster van Loosdrecht.
- Met het bestuur van de Vereniging de Ster van Loosdrecht is afgesproken de samenwerkingsovereenkomst te vernieuwen, gericht op kennisdeling over natuurbeheer en faciliteren van gezamenlijk beheer.
- De uitnodigingen voor de keukentafelgesprekken zijn in concept gereed.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting
Huidige fase		Verkenning		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 2.691.000		
Herzien projectbudget		€ 2.246.809		
Totaal besteed	T/m 2024	€ 107.992		
	In 2025	€ 0		
	Totaal	€ 107.992		
Resterend budget		€ 2.138.817		

Doorkijk 2026

Verwacht resultaat

- De brieven met uitnodiging voor keukentafelgesprekken zijn verstuurd en er hebben gesprekken plaatsgevonden met grondeigenaren.
- De opdracht voor het opstellen van het inrichtings- en beheerplan voor o.a. de Ster van Loosdrecht is verleend en de uitvoering is gestart.
- Ongeveer 15 eigenaren tekenen voor NNN-realiserie. Daarmee zijn 15 inrichtingsplannen gereed.
- De invulling van het planologisch traject is bepaald. De opdracht is verleend. Er is gestart met de procedure om de functie van de gronden te wijzigen van agrarisch naar natuur.
- De nieuwe afspraken met Vereniging De Ster van Loosdrecht zijn geformaliseerd en in werking getreden.

Risico's scope, planning, financiën

- Door tijdelijk capaciteitsstekort, in het bijzonder een tekort aan rentmeesters, loopt het proces vertraging op.
- Er bestaat onvoldoende (bestuurlijk en/of politiek) draagvlak voor de plannen.
- Er wordt onvoldoende natuurontwikkeling behaald.
- Er doen zich op basis van aanvullend onderzoek milieutechnische risico's voor.
- Er vindt een scopewijziging plaats door aanvullingen uit het PLG en/of vanuit de Rijksoverheid.

Project 2.1 Natuurontwikkeling (NNN) Vuntus

Projecttrekker(s)	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 599.000		
Fase project	Verkenning		
Datum goedkeuring huidig PVA (SG/RG)	10 april 2021		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	<p>In de Realisatiestrategie NNN heeft de provincie besloten om NNN realisatie in de Vuntus pas op de langere termijn op te pakken (naar verwachting vanaf 2029). Als in de Vuntus partijen zich melden voor NNN-realisatie, kunnen zij zich in de loop van 2026 melden bij het aanjaagteam. Een optie voor NNN-realisatie is (mits wordt voldaan aan een voortoets op de natuurambities) dan een subsidie kwaliteitsimpuls (SKNL).</p> <p>In delen van de Vuntus wordt een eco- en hydrologisch onderzoek uitgevoerd. De resultaten worden in oktober verwacht.</p>		
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland, gemeente Wijdmeren, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Natuurmonumenten.		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: Recreatieve routes (1.1) en Fauna-passages (2.3).		

Resultaatbereik 2025

Beoogd resultaat

- In de voortgangsrapportage 2024 is aangegeven dat de provincie het gebiedsproces voor NNN realisatie in de Vuntus voorlopig on hold heeft gezet. Inmiddels is de verwachting dat dit in 2029 weer wordt opgestart.
- De tweede ecologische verbinding over het VONA-terrein wordt aangelegd.
- Het eco-hydrologisch onderzoek wordt gestart.

Bereikt resultaat

- De tweede ecologische verbinding over het VONA-terrein is aangelegd.
- Het eco-hydrologisch onderzoek is gestart.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting
Huidige fase		Verkenning		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 190.000	€ 599.000	
Herzien projectbudget			€ 573.149	Het projectbudget is verlaagd t.b.v. de dekking van de programmakosten.
Totaal besteed	T/m 2024	€ 156.807	€ 130.520	
	In 2025	€ 0	€ 0	
	Totaal	€ 156.807	€ 156.807	
Resterend budget		€ 33.192	€ 416.342	

Doorkijk 2026

Verwacht resultaat

- Het eco- en hydrologisch wordt afgerond.
- De provincie onderneemt voor NNN-realiserie geen actie. Als partijen zich melden, bekijkt de provincie (het aanjaagteam) welke mogelijkheden er zijn (SKNL aanvraag bijvoorbeeld).

Risico's scope, planning, financiën

- Verlies van momentum in het gebied door vertraging en het gebrek aan contact.

Project 2.1 Natuurontwikkeling (NNN) Het Hol

Projecttrekker(s)	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 900.000		
Fase project	Planuitwerking		
Datum goedkeuring huidig PVA (SG/RG)	31 maart 2018		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	<p>Op 5 april 2023 is de scope van het project bijgesteld. De uitvoering van het herstel- en inrichtingsplan is gesplitst in 2 onderdelen die volgtijdelijk worden uitgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fase 1 baggeren en aanpassing watersysteem • fase 2 de natuurinrichting <p>De uitvoering van fase 1 vindt plaats onder verantwoordelijkheid van Natuurmonumenten. Provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor fase 2.</p> <p>Fase 1: Het baggerwerk is in volle gang en verloopt goed. Echter, de vergunning die de aannemer heeft aangevraagd om de vrijkomende bagger naar een weilanddepot in Kortenhoef te transporteren heeft de gemeente Wijdmeren nog steeds niet verleend. Dat vormt een risico voor de planning en financiële dekking van het project. Dit is nu opgeschaald via de provincie. Als de vergunning binnenkort wordt verleend, kan het werk volgens planning in september 2027 worden afgerond.</p> <p>Fase 2: De voortgang heeft vertraging opgelopen, doordat de financiële dekking voor de grondverwerving ontbrak en het overleg met de gemeente over de benodigde omgevingsplanwijziging meer tijd vergde. Door die onduidelijkheid zijn er geen gesprekken met grondeigenaren gevoerd. Het jaar is afgesloten met duidelijkheid over de kaders.</p> <p>Het totale inrichtingsbudget is in 2023 vastgesteld op € 10.600.000. Dit bedrag wordt gedekt door een aantal subsidies, waaronder SPUK-gelden. Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht stelt voor fase 1 € 250.000,- beschikbaar.</p>		
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, gemeente Wijdmeren.		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: Verbeteren waterkwaliteit (2.3) en Bestrijding exoten (2.5.3).		

Resultaatbereik 2025

Beoogd resultaat

- Fase 1 is uitgevoerd: de baggerwerkzaamheden zijn uitgevoerd in de winters van 2024/2025, 2025/2026 en 2026/2027.
- Voorbereidingen voor de uitvoering fase 2 (natuurinrichting) hebben plaatsgevonden, inclusief het opstellen van het inrichtingsplan.

- Gesprekken over verwerving van percelen hebben geleid tot de eerste afspraken.
- Het omgevingsplan is aangepast.

Bereikt resultaat

- Fase 1: De baggerwerkzaamheden zijn in volle gang.
- Fase 2: Het voorontwerp inrichtings- en herstelplan is geactualiseerd.
- Fase 2: De financiële dekking voor de restant verwerving/zelfrealisatie is geregeld.
- Fase 2: GS heeft de intentie uitgesproken om het omgevingsplan te wijzigen via een projectbesluit en de gemeente om een reactie gevraagd.
- Fase 2: Grondeigenaren zijn in november geïnformeerd over de voortgang van het project.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting
Huidige fase		Vorbereiding		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 900.000	€ 900.000	
Herzien projectbudget				
Totaal besteed	T/m 2024	€ 373.487	€ 373.487	
2025		€ 42.216	€ 42.216	
Totaal		€ 415.703	€ 415.703	
Resterend budget		€ 484.297	€ 484.297	

Toelichting tabel: Totale budget project bedraagt €10.600.000. Een groot deel van het budget bestaat uit subsidies aan Natuurmonumenten en is al beschikt. Het deel projectvoorbereiding door de provincie is opgenomen in de tabel.

Doorkijk 2026

Verwacht resultaat

- Fase 1: de baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd in de winters van 2025/2026 en 2026/2027.
- Fase 2: Voorbereidingen voor de uitvoering van de natuurinrichting hebben plaatsgevonden: afspraken met Natuurmonumenten in een addendum op de SOK en uitwerking naar een definitief inrichtingsplan.
- Gesprekken over verwerving of zelfrealisatie van percelen hebben geleid tot de eerste afspraken.
- De projectbesluitprocedure loopt.

Risico's scope, planning, financiën

- Uitloop in tijd doordat de bagger in de tijdelijke depots meer tijd nodig heeft om in te drogen. Hierdoor kunnen de inrichtingsmaatregelen van fase 2 later dan gepland worden uitgevoerd.
- De vergunning om de vrijkomende bagger naar een weilanddepot in Kortenhoef te transporteren wordt niet/ te laat verleend. Dit kan financiële en juridische consequenties hebben voor het project.
- Vertraging in procedures voor fase 2 leidt tot vertraging in de uitvoering en meerkosten (indexatie).

Project 2.2a Ecologische verbindingen - N201

Projecttrekker(s)	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 2.071.000		
Fase project	Planuitwerking		
Datum goedkeuring huidig PVA (SG/RG)	Dit project is voor 2017 gestart en gefinancierd, dus zonder inmenging van de Stuurgroep OVP.		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	<p>In 2021 heeft herijking van het project (faunamaatregelen, vervanging bruggen, onderhoud, en overige maatregelen) plaatsgevonden om de scope en integraliteit van de maatregelen helder te krijgen. Dit is vastgelegd in een projectwijziging en vastgesteld in het opdrachtenloket.</p> <p>Voor de faunapassages bij de N201 is in maart een onderzoek naar K&L-ligging geïnitieerd, waarvan in augustus 2025 de gegevens ter beschikking zijn gekomen. Hieruit is de conclusie te trekken dat qua K&L-ligging er op drie plaatsen (relatief) eenvoudig faunapassages te realiseren zijn, op twee plaatsen zijn deze met enige aanpassingen te realiseren. Voor de andere locaties wordt dat alleen mogelijk als bepaalde nutsvoorzieningen worden omgelegd. Eind 2025 heeft de beoogde aannemer aan de provincie aangegeven dat realisatie niet (meer) in het regulier onderhoud (april 2026) kan worden ingepast. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om zoveel als mogelijk de faunapassages gerealiseerd te krijgen met als uiterste datum voor gereedmelding 31 december 2027.</p>		
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland, gemeente Wijdmeren, gemeente Hilversum, Regio Gooi en Vechtstreek, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, gebiedsaannemer, ingenieursbureau, particuliere grondeigenaren en ondernemers.		
Samenhang andere projecten	Het realiseren van de faunapassages valt onder een traject-benaderingsproject. Dit betekent dat de uitvoering van de faunapassages is gekoppeld aan onderhoudswerkzaamheden en het vervangen van twee bruggen aan de N201. Dit laatste is in 2025 uit het project gehaald en gaat als apart project naar INFRA. Dit moet nog worden geformaliseerd via een StatusRapport. Er bestaat samenhang met de infra- en natuurontwikkelingsprojecten in het gebied, waaronder Het Hol, aanpassingen Zuwe en de aansluiting met het Utrechts deel van de N201.		

Resultaatbereik 2025

Beoogd resultaat

- Het project wordt gesplitst in twee delen. Het betreft enerzijds het groot onderhoud en de faunapassages en anderzijds de vervanging van de twee vaste kunstwerken.
- Het groot onderhoud is uitgevoerd en de faunapassages m.u.v. de faunapassages in de twee vaste kunstwerken zijn gerealiseerd.

Bereikt resultaat

- Informatie van de ligging van kabels en leidingen naast de bestaande verharding is beschikbaar gekomen via het graven van proefsleuven aan weerszijden van de wegverharding (lokaal, op 10 beoogde locaties voor faunapassages) en de rapportage daarover.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting
Huidige fase		Planuitwerking	-	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 2.071.000	€ 2.071.000	
Herzien projectbudget				
Totaal besteed	T/m 2023	€ 343.006	€ 343.006	
	In 2024	€ 155.989	€ 155.989	
	Totaal	€ 498.995	€ 498.995	
Resterend budget		€ 1.572.005	€ 1.572.005	

Resultaatbereik 2026**Beoogd resultaat**

- Het groot onderhoud aan de verharding van N201 is (als onderdeel van het gebiedscontract) in april 2026 uitgevoerd.
- Het ontwerp voor de faunapassages is gereed.
- De vergunningaanvraag voor realisatie van de faunapassages is in procedure.

Project 2.2b Faunapassages

Projecttrekker(s)	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 1.800.000		
Fase project	Planuitwerking		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	Regiegroep: 10-02-2022 Stuurgroep: 30-03-2022		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	<p>Gezien een taakstellend budget voor dit project, blijven de financiën en ook de scope binnen de vastgestelde kaders. Zoals verwacht komen niet alle locaties tot uitvoering. De verwachting is dat de uitvoering van de faunapassages voor eind 2027 is afgerond.</p> <p>Omdat de locaties ook goed beheerd moeten worden, is het nodig beheerkosten aan de gemeente over te dragen (via een afkoopregeling). Er wordt gezocht naar financiering.</p>		
Betrokken partijen	Gemeente Wijdmeren, Regio Gooi & Vechtstreek, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Natuurmonumenten, provincie Noord-Holland en particuliere grondeigenaren.		
Samenhang andere projecten			

Resultaatbereik 2025

Beoogd resultaat

- Twee loopplanken (Kooibrug en Kattenbrug) zijn gerealiseerd.
- De benodigde conditionerende onderzoeken (waaronder proefsleuven kabels en leidingen) zijn uitgevoerd.
- De beheerafspraken/-overeenkomsten zijn gemaakt.
- De inkoop van het opstellen (ingenieursbureau) en vervolgens uitvoeren (door een aannemer of bouwteam) van het Definitief Ontwerp heeft plaatsgevonden.

Bereikt resultaat

- Twee loopplanken (Kooibrug en Kattenbrug) zijn gerealiseerd.
- De gesprekken met de gemeente over beheerafspraken zijn gestart.
- De inkoop van het opstellen van het Definitief Ontwerp heeft plaatsgevonden en het ingenieursbureau is bezig met de uitwerking.
- Er zijn gesprekken gevoerd met Waterschap AGV over een koppelkans tot de realisatie van een faunapassage aan de Hereweg.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting
Huidige fase		Realisatie		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 1.742.384	€ 1.800.000	
Herzien projectbudget			€ 1.742.384	Na herziening 2022.
Totaal besteed	T/m 2024	€ 98.427	€ 327.180	Realisatie Gele brug Ankeveen, verkrijgen Voorlopig Ontwerp en bewonersavond.
	In 2025	€ 27.137	€ 27.137	Aanleg loopplanken onder Kooibrug en Kattenbrug
	Totaal	€ 125.564	€ 347.180	
Resterend budget		€ 1.388.067	€ 1.388.067	

Doorkijk 2026

Verwacht resultaat

- De overige benodigde conditionerende onderzoeken (waaronder proefsleuven kabels en leidingen) zijn uitgevoerd.
- De definitieve ontwerpen voor Hereweg, Oud-Loosdrechtsedijk, Moleneind en Hollands End zijn verkregen.
- Passages Hereweg, Oud-Loosdrechtsedijk, Moleneind en Hollands end zijn gerealiseerd.
- De subsidie buiten uitvoering is geregeld.

Risico's scope, planning, financiën

- Het projectbudget is ontoereikend waardoor niet alle passages kunnen worden aangelegd en een lagere ecologische waarde wordt bereikt.
- De beheerkosten zijn niet gedekt in het project en er wordt geen financiering voor gevonden. Hierdoor worden het benodigde beheer en onderhoud niet uitgevoerd en kan geen beheerplan worden opgesteld.
- Aanwezige kabels en leidingen kunnen (financieel of technisch) niet worden verlegd en maken de aanleg van een faunapassage onder de weg onmogelijk. Dit levert een lagere ecologische waarde op.

Project 2.3 Verbeteren waterkwaliteit

Projecttrekker(s)	Waterschap Amstel, Gooi en Vecht		
Projectraming volgens UVP	€ 4.350.000		
Fase project	Planuitwerking en realisatie		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	12 december 2018		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Waterschap Amstel, Gooi en Vecht voert een samenhangend KRW-maatregelpakket uit om de waterkwaliteit duurzaam te verbeteren. Volgens de huidige planning wordt het merendeel van de belangrijkste projecten vóór eind 2027 gerealiseerd, met een beperkt aantal maatregelen dat doorloopt in de realisatie tot uiterlijk 2030 (bron: Jaarrapportage KRW maatregelen 2025).		
Betrokken partijen	Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, gemeente Wijdmeren, gemeente Hilversum, Natuur-monumenten en diverse bewonersverenigingen.		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: Aanpak zwevend slib: helder water en ontwikkeling waterplanten (1.7.2), Herstel legakkerlandschap (1.8), Natuurontwikkeling (2.1) en Bestrijden van exoten (2.6)		

Resultaatbereik 2025

Beoogd resultaat

- Er is besloten over een maatregel die de fosfaatbelasting vanuit het Hilversums Kanaal naar Kortenhoef vermindert.
- Designs voor de drie zuiveringsinstallaties zijn uitgewerkt.
- De werkzaamheden in Het Hol zijn gevorderd tot baggeren en het maken van een nieuwe waterroute.

Bereikt resultaat

- Er is een voorkeursmaatregel vastgesteld waarbij een deel van het Hilversums Kanaal wordt gebaggerd om de waterkwaliteit te verbeteren door de fosfaat houdende toplaag te verwijderen. Tegelijk is het beeld dat door kwel nog fosfaat kan blijven vrijkomen (o.a. uit de historische belasting vanuit de voormalige RWZI); deze bron wordt als eindig beschouwd. De maatregel vraagt om aanvullend onderzoek naar de haalbaarheid en de effecten.
- Het (bijna) definitieve ontwerp van de zuiveringsinstallatie bij de Spiegelplas is opgesteld. Dit ontwerp fungeert als blauwdruk voor de installaties bij Kortenhoef en de Weersloot, die in de volgende fase worden uitgewerkt.
- In het Hol zijn de baggerwerkzaamheden grotendeels uitgevoerd. De werkzaamheden aan de nieuwe waterroute worden in de vervolgfase afgerond.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting
Huidige fase				
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 0	€ 4.350.000	
Herzien projectbudget				
Totaal besteed	T/m 2024	€ 0	€ 0	De uitvoering van de KRW- maatregelen ligt bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Daarom blijven de financiën bij het waterschap en lopen ze niet via de gezamenlijke rekening bij het Groenfonds.
	In 2025	€ 0	€ 0	
	Totaal	€ 0	€ 0	
Resterend budget		-	€ 4.350.000	

Doorkijk 2026

Verwacht resultaat 2024

- Het haalbaarheidsonderzoek naar (de kwaliteits- en uitvoerbaarheidsaspecten van) baggeren in het Hilversums Kanaal is afgerond. Waar mogelijk worden voorbereidingen voor de uitvoering getroffen. De beoogde uitvoering is 2027.
- De definitieve ontwerpen voor de drie defosfaterings-/zuiveringsinstallaties (Spiegelplas, Kortenhoef en Weersloot) zijn gereed.
- In het Hol worden de baggerwerkzaamheden afgerond en wordt de nieuwe waterroute aangelegd. Het water wordt gerichter en slimmer het gebied in geleid en de kwaliteit water komt op de juiste plekken terecht.

Risico's scope, planning, financiën

De (tijdige) ingebruikname en het effectief functioneren van de drie defosfateringsinstallaties is afhankelijk van een voldoende zware stroomaansluiting. In 2025 zijn de aanvragen voor stroomaansluiting door de netbeheerder afgewezen. Dit vormt een risico dat de installaties na realisatie (nog) niet of slechts beperkt in bedrijf kunnen, waardoor effecten op waterkwaliteit later zichtbaar worden en extra doorlooptijd ontstaat. Dit kan leiden tot scope-aanpassingen (alternatieve energievoorziening/gefaseerde ingebruikname), planning vertraging en financiële meerkosten.

Project 2.4.3a Planuitwerking natuurmaatregelen voor moerasvogels

Projecttrekker(s)	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 2.600.000		
Fase project	Planuitwerking		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	28 juni 2023		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	<p>Op basis van uitvoerbaarheid, beheerbaarheid, risico's en de hoogste potentie voor moerasvogels zijn de gebieden Hollands Ankeveen, Kortenhoef West en de Loosdrechtse Plassen geselecteerd. De stuurgroep OVP heeft op 28 juni 2023 de keuze van maatregelen voor de moerasvogels voor deze drie deelgebieden bekrachtigd.</p> <p>De gebieden Hollands Ankeveen en Kortenhoef West zijn in juli 2024 overgedragen aan Natuurmonumenten (grondeigenaar). De provincie Noord-Holland blijft opdrachtgever voor de Loosdrechtse Plassen.</p> <p>De werkzaamheden in Hollands Ankeveen en Kortenhoef West zijn in opdracht van Natuurmonumenten in november 2024 gestart. De uitvoering duurt tot het voorjaar van 2026.</p> <p>De provincie Noord-Holland heeft het project in de Loosdrechtse Plassen opgeleverd op 20-04-2025 en het beheer en onderhoud overgedragen aan de gemeente Wijdmeren.</p>		
Betrokken partijen	Vereniging Natuurmonumenten, provincie Noord-Holland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en gemeente Wijdmeren.		
Samenhang andere projecten	Het baggeren van de Loosdrechtse Plassen (project 1.7), het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, project 2.1), het verbeteren van de waterkwaliteit (project 2.3), het voeren van populatiebeheer voor ganzen (project 2.5.1), het treffen van noodmaatregelen tegen ganzenvraat ten behoeve van grote karekiet (project 2.5.2), exotenbeheer.		

Resultaatbereik 2025

Beoogd resultaat (op 31 december 2025)

- De provincie Noord-Holland heeft het project in de Loosdrechtse Plassen opgeleverd op 20-04-2025 en het beheer en onderhoud overgedragen aan de gemeente Wijdmeren.
- De werkzaamheden in Hollands Ankeveen en Kortenhoef West zijn in opdracht van Natuurmonumenten in november 2024 gestart. De uitvoering duurt tot het voorjaar van 2026.

Bereikt resultaat

- De provincie Noord-Holland heeft het project in de Loosdrechtse Plassen opgeleverd op 20-04-2025 en het beheer en onderhoud overgedragen aan de gemeente Wijdmeren.
- De werkzaamheden in Hollands Ankeveen en Kortenhoef West zijn in opdracht van Natuurmonumenten in november 2024 gestart. De uitvoering duurt tot het voorjaar van 2026.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting
Huidige fase		Realisatie		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 1.769.089	€ 2.600.000	
Herzien projectbudget		€ 1.634.233	€ 2.284.024	Projectbudget is verlaagd i.v.m. dekking programmakosten, Quicksan Nieuwe Polderplas en een aanpassing in het statusrapport.
Totaal besteed	T/m 2024	€ 0	€ 649.790	
	In 2025	€ 36.229	€ 36.229	
	Totaal	€ 36.229	€ 686.019	
Resterend budget		€ 1.598.004	€ 1.598.004	

Doorkijk 2026

Verwacht resultaat (per 31 december 2026)

- De realisatieperiode van de gebieden Hollands Ankeveen en Kortenhoef West loopt van 2024 - 2026.
- Er worden geen werkzaamheden uitgevoerd in het broedseizoen van de moerasvogels.

Risico's scope, planning, financiën

- Door ongunstig weer loopt de aannemer uit de planning en kan deze de werkzaamheden pas afronden na het broedseizoen.
- De aannemer moet de werkzaamheden staken, uitstellen of mitigerende maatregelen moet nemen door het aantreffen van bijzondere flora en of fauna.
- Er vindt een (menselijk) ongeluk plaats tijdens de uitvoeringswerkzaamheden.
- De verwachting is dat in 2026 geen uitgaven worden gedaan vanuit UVP. Eerst wordt de € 2,9 miljoen (incl. BTW) vanuit de Regeling specifieke uitkering Uitvoeringsprogramma Natuur (SPUK) aangesproken. De realisatie dient uiterlijk 15 maart 2026 te worden afgerond.

Overige bijzonderheden

Met het overdragen van de verantwoordelijkheden en opdrachtgeverschap aan Natuurmonumenten voor Kortenhoef West en Hollands Ankeveen blijven de projectdoelstellingen of -resultaten overeind. We blijven binnen het beschikbaar gestelde budget. Er is zelfs nog budget uit het programma OVP over. Voor de € 1.6 miljoen die terugvalt naar het programma OVP kan een alternatieve besteding worden gezocht buiten het project. Een andere mogelijkheid is dat het resterende budget kan worden ingezet voor de nog niet gerealiseerde gebieden (of delen daarvan) project habitatherstel moerasvogels, zoals:

- het aanvullen van mogelijke tekorten in de te realiseren gebieden Hollands Ankeveen en Kortenhoef West wanneer blijkt dat het geraamde budget ontoereikend is;
- het herstel van de ondergedoken legakkers en het realiseren van de verlengde aanvoerroute in Hollands Ankeveen. Die zijn in het huidige project buiten de scope van huidige realisatiefase gehouden. Dit komt omdat de realisatiekosten hiervan niet binnen het huidige taakstellende budget gefinancierd kunnen worden.
- de in de eerdere planuitwerkingen van BWZ (in totaal 8 deelgebieden) de gebieden Stichts Ankeveen, Loenderveense Plassen en/of Stille Plas nader uit te werken en in te richten.

Het gelabelde budget OVP is in de begroting doorgeschoven naar 2025 en 2026. In 2027 moet het project habitatherstel moerasvogels zijn afgerond en totale budget zijn besteed.

Project 2.4.3b Quickscan Nieuwe Polderplas (Moeraseiland van baggerspecie)

Projecttrekker(s)	Gemeente Wijdmeren is bestuurlijk kartrekker. Het bagger-team van het OVP heeft een casus voor een onderwatereiland uitgevoerd.		
Projectraming volgens UVP	€ 0		
Fase project	Verkenning		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	17 december 2019		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	De plas heeft potentie om ingezet te worden voor recreatieve doelen, maar is volgend.		
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland (eigenaar Nieuwe Polderplas), gemeente Wijdmeren, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, bewoners.		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: Baggeren (1.), Integreren recreatie en natuur (3.3).		

Resultaatbereik 2025

Beoogd resultaat

- De Nieuwe Polderplas blijft beschikbaar om bij te dragen aan doelen uit het programma OVP. Ontwikkeling van deze plas is geen doel op zich.

Bereikt resultaat

- De Nieuwe Polderplas is een strategische locatie die op termijn kan worden gebruikt. In 2025 is de focus gelegd op de prioritaire opgaven uit de uitvoeringsregeling waarvan de Nieuwe Polderplas geen onderdeel uitmaakt. De Nieuwe Polderplas is als kans niet actief nader onderzocht.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting
Huidige fase		Verkenning		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 0	€ 0	
Herzien projectbudget		€ 62.000	€ 62.000	€ 31.000 budget uit project baggeren + € 31.000 budget uit project Maatregelen Moerasvogels.
Totaal besteed	T/m 2024	€ 23.800	€ 23.800	
	In 2025	€ 0	€ 0	
	Totaal	€ 23.800	€ 23.800	
Resterend budget		€ 38.200	€ 38.200	

Doorkijk 2026

Verwacht resultaat

- De Nieuwe Polderplas blijft als kans interessant om te gebruiken voor de opgaven. Als eigendom in de portefeuille van de provincie Noord-Holland blijft de Nieuwe Polderplas beschikbaar, ook voor de partners. Het doel is om de Nieuwe Polderplas in eigendom van provincie Noord-Holland te houden.

Risico's scope, planning, financiën

- Het ontbreekt binnen het programma OVP aan draagvlak voor (recreatieve of ecologische) ontwikkeling van de Nieuwe Polderplas.
- Er is nog geen financiering voor een initiatief. Binnen de bestaande projecten Baggeren en Maatregelen moerasvogels is onvoldoende resterend budget om een natuureiland te realiseren (studie 2022).

Project 2.5.2 (Nood)maatregelen ganzenvraat

Projecttrekker(s)	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 50.000		
Fase project	Afgesloten		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)			
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Het onderhoudscontract is per 31 december 2024 afgerond en afgesloten. De provincie Noord-Holland heeft het beheer en onderhoud (inclusief subsidie) overgedragen aan Natuurmonumenten.		
Betrokken partijen	Natuurmonumenten		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: Maatregelen voor moerasvogels (2.4).		

Eind 2024 heeft de provincie Noord-Holland het onderhoud aan Natuurmonumenten overgedragen. Vanaf 2025 voert Natuurmonumenten de maatregelen uit met subsidie van de provincie Noord-Holland.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting
Huidige fase				
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 50.000	€ 50.000	
Herzien projectbudget		€ 137.000	€ 137.000	Het budget is opgehoogd ten behoeve van monitoring en onderhoud van de rasters. Dit budget is afkomstig van 2.5.1 Populatiebeheer ganzen.
Totaal besteed	T/m 2023	€ 114.223	€ 114.223	
	In 2024	€ 24.263	€ 24.263	Kosten worden gedekt uit het budget van 2.5.1 Populatiebeheer ganzen.
	Totaal		€ 138.486	
Resterend budget		€ 0	€ 0	

Project 2.5.3 Bestrijding exoten / Overlastgevende waterplanten

Projecttrekker(s)	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 500.000		
Fase project	Vorbereiding en planuitwerking		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	N.v.t.		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	In 2024 is het project opnieuw opgestart. Op 17 december 2025 heeft de stuurgroep ingestemd met een werkwijze voor (maai) beheer, het betrekken van het Plassenschap Loosdrecht e.o. bij de uitvoering daarvan en het beschikbaar stellen van € 1,3 miljoen voor de aanschaf en exploitatie van maaimaterieel en € 112.677 voor assistentie vanuit OVP voor uitwerking van nog samen in te vullen randvoorwaarden (vaarwegen, specificaties materieel, inrichten kernteam, ecologisch werkprotocol).		
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland, provincie Utrecht, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, gemeente Wijdmeren, gemeente Stichtse Vecht, HISWA-Recron, het Watersportverbond, stichting Kievitsbuurten, Natuurmonumenten, Bewonersfederatie, Plassenschap Loosdrecht e.o.		
Samenhang andere projecten	Er bestaat samenhang met: Aanleg luwtestructuren (1.7.2).		

Resultaatbereik 2025

Beoogd resultaat

- Er vindt een herstart van dit project plaats op basis van een goedgekeurd plan van aanpak.
- De stuurgroep neemt een besluit over de investering in materieel voor het maaien en harken.
- Er wordt een overeenkomst met gebruikers gesloten over de inzet en het onderhoud van materieel.

Bereikt resultaat

- De projectgroep is van start gegaan en heeft een voorstel voorbereid voor de stuurgroep.
- De stuurgroep heeft een besluit genomen.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting
Huidige fase				
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 500.000	€ 500.000	
Herzien projectbudget		€ 1.800.000	€ 1.800.000	
Totaal besteed	T/m 2024	€ 387.323	€ 387.323	
	In 2025	-	-	
	Totaal	€ 1.412.677	€ 1.412.677	
Resterend budget				

Doorkijk 2026

Verwacht resultaat

- Het Kernteam waterplantenbeheer is ingericht.
- Het ecologisch werkprotocol is uitgewerkt.
- Er is ervaring opgedaan met maaibeheer zoals beoogd in havens, vaarwegen en open water.
- De constructie is uitgewerkt, waarbij derden het materieel onder verantwoordelijkheid, sturing en verzekering van het Plassenschap Loosdrecht e.o. kunnen gebruiken.
- Essentiele vaarwegen zijn in behandeling bij de provincie Noord-Holland om aan te wijzen als vaarweg.

Risico's scope, planning, financiën

- De vergunning voor beheer op open water wordt niet verleend omdat het beheer conflicteert met natuur- of KRW doelen.
- De opgave blijkt te groot als waterplanten zich ontwikkelen als gevolg van waterkwaliteitsverbetering.

7

Pijler 3

Moderniseren recreatiesector



Deze pijler kent sinds de aanvang van het programma vier projecten. Binnen deze projecten ging het voornamelijk om het uitvoeren van onderzoeken en verkenningen. Nadat deze hadden plaatsgevonden, bleek het resterende budget in pijler 3 ontoereikend om vervolgstappen van toegevoegde waarde te kunnen zetten. Daarom zijn deze projecten binnen pijler 3 afgerond en is hierover in de voortgangsrapportage van 2024 voor het laatst gerapporteerd.



8

Organisatiekosten



Projecttrekker(s)	Gemeente Wijdmeren, provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	<p>Er is geen raming opgenomen in het uitvoeringsprogramma.</p> <p>Communicatie OVP-breed Capaciteit totaal € 800.000</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 300.000 (eerder beschikbaar gesteld) • € 500.000 (herziening programma 2022) <p>Communicatiemiddelen totaal € 418.000</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 100.000 (eerder beschikbaar gesteld) • € 318.000 (herziening programma 2022) <p>Extra capaciteit gemeente Wijdmeren totaal € 380.000</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 380.000 (herziening programma 2022) <p>Bureaustkosten totaal € 587.000</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 180.000 (eerder beschikbaar gesteld) • € 407.000 (herziening programma 2022) 		
Fase project	Projectoverstijgend		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	<ul style="list-style-type: none"> • Stuurgroep-besluit communicatie en capaciteit: 20 november 2019 (notitie) en 30 juni 2021 (intakeformulier). • Stuurgroep-besluit middelen en capaciteit communicatie via voorstel herziening organisatie en inhoud gebiedsakkoord: 3 februari 2022. 		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Begin 2022 zijn voorstellen gedaan voor het structureel inregelen van de dekking van de bureaustkosten en programmacommunicatie (ten behoeve van zowel de capaciteit als de communicatiemiddelen). Hiervoor zijn middelen ter beschikking gesteld.		
Betrokken partijen	Partners binnen het programma OVP		
Samenhang andere projecten	<p>Bij de herziening van het programma is dekking verkregen voor de bureau- en communicatiekosten door van de projecten 3,5% af te romen.</p> <p>De eerdere dekking voor budget communicatie komt uit verschuivingen van budgetten voor de vervallen vaarverbindingen (1.2 en 1.3) en Natuurontwikkeling (2.1).</p> <p>De dekking voor de extra capaciteit Wijdmeren komt m.n. uit het budget voor recreatieve verbindingen (1.1) t.b.v. inhuur van een projectleider voor het project Horstermeer Zuid en uit verschuivingen van budgetten voor de vaarverbindingen (1.2 en 1.3), Natuurontwikkeling (2.1), Ontsluiting en toegankelijkheid (1.4) en Van dorpslint tot recreatieboulevard (1.5).</p>		

Resultaatbereik 2025

Beogd resultaat

Op gebied van communicatie en bureaunkosten:

- Er zijn wekelijks nieuwsberichten gepubliceerd op www.vechtplassten.nl.
- Er zijn 6 reguliere nieuwsbrieven verzonden.
- De jaarlijkse informatiemarkt is voor de vierde keer georganiseerd.
- Er hebben diverse bewonersbijeenkomsten plaatsgevonden waarbij het gesprek met aanwezigen is aangegaan over projecten.

Voor wat betreft capaciteit Wijdemeren: de capaciteit is ingezet conform afspraken (t.b.v. NNN, recreatie en Horstermeer Zuid).

Bereikt resultaat

- De jaarlijkse informatiemarkt heeft na interne overweging niet plaatsgevonden.
- Er zijn 82 nieuwsberichten geplaatst op www.vechtplassten.nl.
- Er zijn 5 nieuwsbrieven (aan 895 abonnees) verstuurd.
- Er heeft een feestelijke oplevering plaatsgevonden van het project Maatregelen moerasvogels Loosdrechtse Plassen met bestuurders en andere betrokkenen.
- Er heeft een feestelijk openingsmoment plaatsgevonden van de het project Herstel vaarverbinding De Heul met bestuurders, omwonenden en andere betrokkenen.

Projectcijfers per fase

		Totaal project	Toelichting
Huidige fase		Projectoverstijgend (geen fases)	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		Communicatie capaciteit: € 300.000 Communicatie middelen: € 100.000 Capaciteit Wijdemereren: € 380.000 Bureaunkosten: € 180.000	
Herzien projectbudget		Communicatie Capaciteit: € 800.000 Communicatie Middelen: € 418.000 Capaciteit Wijdemereren: € 380.000 Bureaunkosten: € 599.264	In februari 2022 heeft de stuurgroep besloten extra middelen beschikbaar te stellen. Dit betrof: - inhuur communicatie manager € 500.000. - communicatiemiddelen € 318.000 voor 6 jaar. - bureaunkosten € 407.000 voor 6 jaar. Van de € 407.000 was een deel niet gedekt, deze dekking is terug naar betreffende projecten.
Totaal besteed	T/m 2023	Communicatie capaciteit: € 395.893 Communicatie: € 72.691 Capaciteit Wijdemereren: € 349.556 <u>Bureaunkosten: € 278.794</u> Totaal: € 1.096.934	
	In 2025	Communicatie capaciteit: € 94.640 Communicatie: € 45.129 Capaciteit Wijdemereren: € 0 <u>Bureaunkosten: € 10.373</u> Totaal: € 140.142	Onder communicatie valt o.a. zaalhuur. Onder Bureaunkosten zijn de kosten voor de website opgenomen.
	Totaal	Communicatie capaciteit: € 490.533 Communicatie: € 117.820 Capaciteit Wijdemereren: € 349.556 <u>Bureaunkosten: € 289.167</u> Totaal: € 1.247.076	
Resterend budget		Communicatie capaciteit: € 309.467 Communicatie: € 300.180 Capaciteit Wijdemereren: € 30.444 <u>Bureaunkosten: € 270.097</u> Totaal: € 910.188	

Doorkijk 2026

De communicatiewerkgroep zet onder voorzitterschap van de communicatiemanager OVP de ingezette werkwijze voort met de jaarkalender als planningsinstrument.

- Wanneer projecten tot uitvoering komen of worden afgerond, benutten we deze als feestelijke communicatiemomenten met zowel bestuurders als de omwonenden en andere betrokken partijen.
- We organiseren een voorjaarsexcursie voor de regiegroep ipv een meerdaagse training Mutual Gains Approach.
- Naast de jaarlijkse voortgangsrapportage maken we een samenvatting met de belangrijkste cijfers en beknopte kwartaalberichten.
- We communiceren een stand van zaken van het programma in plaatselijke huis-aan-huis-bladen.
- De werkgroep Communicatie maakt een voorstel voor een passende afsluiting van het programma zowel voor bestuurders als bewoners in het Vechtplassengebied.

COLOFON

De voortgangsrapportage is een jaarlijks terugkerende uitgave verzorgd door het programmabureau Oostelijke Vechtplassen in nauwe samenwerking met de diverse projecttrekkers. De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen heeft dit rapport op 15 april 2026 vastgesteld.

Aanpak Oostelijke Vechtplassen

p/a secretariaat OVP
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

T: 023-5143098

E: secretariaat_OVP@noord-holland.nl

Partners:

provincie Noord-Holland | provincie Utrecht |
gemeente Wijdmeren | gemeente Stichtse Vecht |
gemeente Hilversum | Waternet | Waterschap Amstel,
Gooi en Vecht | Plassenschap Loosdrecht e.o. |
Regio Gooi en Vechtstreek | Natuurmonumenten |
LTO Noord | HISWA-Recron | Koninklijk Nederlands
Watersportverbond | Verenigde bedrijven Boomhoek |
Vechtplassencommissie | Platform Recreatie en Toerisme
Wijdmeren | Toeristische Kano Bond Nederland |
Vereniging Kievitsbuurten | ANWB | Bewonersfederatie OVP

Vormgeving:

Pier 19 Grafisch ontwerpers

Fotografie:

Foto pagina 17: Natuurmonumenten
Overige foto's: Programmabureau OVP
